برنامج دعم تدبير
المؤسسات التعليمية
بالمغرب
PAGESM

مشروع المؤسسة


بمقاربة

EPAR

مشروع المؤسسة


- مشروع المؤسسة يوحد رؤى و طاقات أعضائها من أجل تجويد مردوديتها كما وكيفا، عبر خطة متوافق عليها تنطلق من تشخيص تشاركي لوضعية المؤسسة، وترجيح للأولويات، ثم تمر لأجرأة العمليات التنفيذية وتقويم مرحلي و نهائي لمدى تحققها.
- لا يوجد نموذج لمشروع يطبق في كل المؤسسات؛ لكن هناك منهجية تستعين بها كل المؤسسات لبناء مشروعها الخاص حسب خصوصياتها.

مشـروع المؤسـسـة و مسـار التلميذ

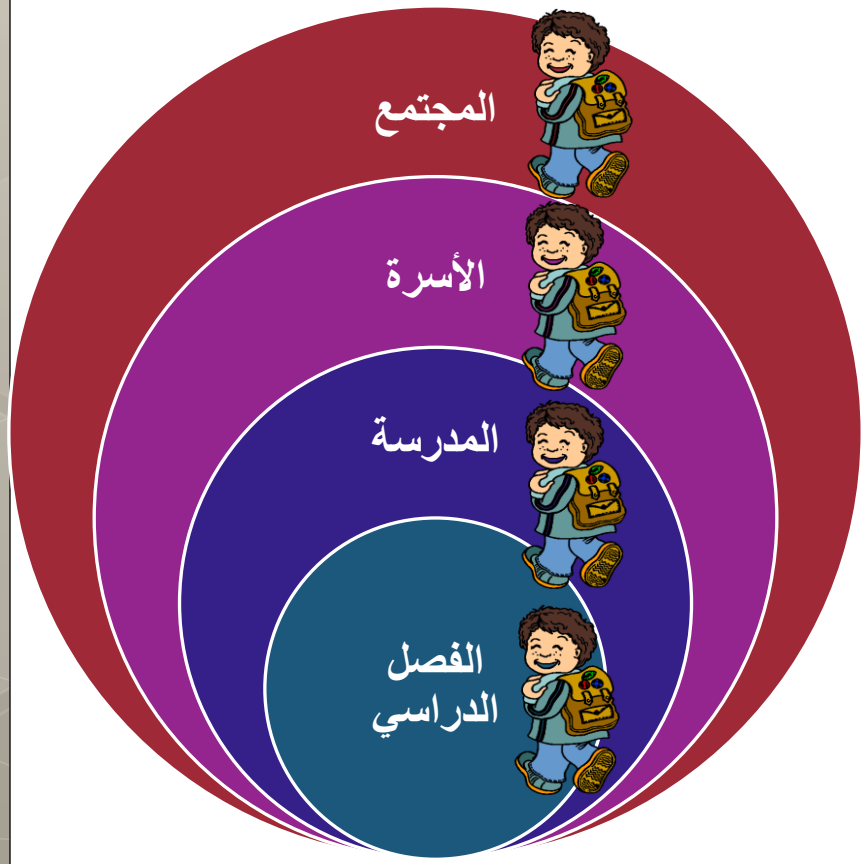


- إضافة إلى كونه متعلما في الفصل الدراسي، فهو أيضا تلميذ في مؤسسة تعليمية، و هو أيضا فرد في أسرة وعضو في مجتمع ؛
- ينبغي أن يأخذ مشروع المؤسسة بعين الاعتبار دوائر التأثير هذه، مع تركيز بؤري على الفصل الدراسي.

دورة حياة مشروع المؤسسة

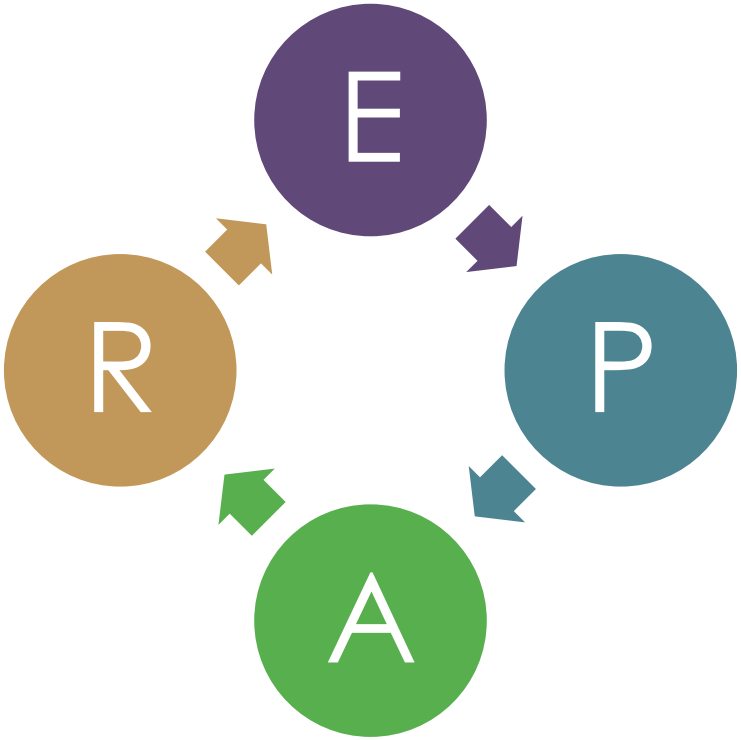


البساطة – البراجماتية – القرب من التعلمات



تشخيص الحالة الراهنة ETAT DES LIEUX

1. نقوم بإعداد لائحة بأهم العوائق التي تحول دون نجاح تلامذتنا:
   - بعد المؤسسة عن سكنى التلاميذ
   - الغياب المتكرر
   - صعوبات قرائية
   - عدم التحكم في الكفايات اللازمة
   - العنف المدرسي
   - ...






تشخيص الحالة الراهنة ETAT DES LIEUX


2. نقوم بوضع لائحة لنقط القوة التي نتوفر عليها في مؤسستنا: الموارد البشرية، البنية التحتية، الشركاء، التجارب، المعارف،...
   - 3 أساتذة لمادة... مستعدون للمشاركة؛
   - وجود شريك جمعوي؛
   - توفر قاعة متعددة الاستعمالات؛
   - ...





ETAT DES LIEUX تشخيص الحالة الراهنة

- لوضع اللائحتين هناك قاعدتان أساسيتان :
  1. إشراك الجميع؛
  2. اعتماد مصادر معلومات موثوقة.



تشخيص الحالة الراهنة ETAT DES LIEUX


- اعتماد مصادر معلومات موثوقة ومؤشرات إحصائية دقيقة و عدم الاكتفاء بالانطباعات و العموميات ؛


مثال

- تحليل المشكل للوصول للأسباب الحقيقية: شجرة الأسباب؛
- يمكن اعتماد عدة طرق للتشخيص :
  - اعتماد إحصائيات مضبوطة :منظومة مسار، دراسات ،...؛
  - التشخيص القصير المطبق DCA؛
  - شبكة جودة المدرسة GQE؛

ما العمل إذا كانت لائحة العوائق طويلة؟

يجب تحديد الأولويات

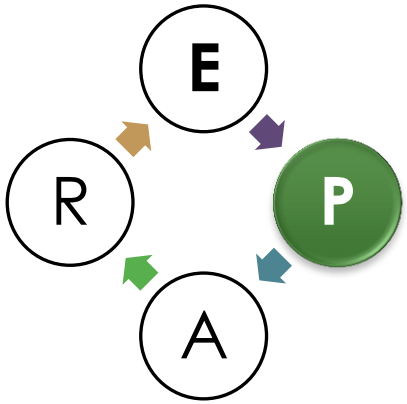




Prioriser تحديد الأولويات

كيف نحدد الأولويات ؟


من خلال الجواب على سؤالين :

1. ما مدى قرب أو بعد هذا العائق عن تعلمات التلاميذ ؟










تحديد الأولويات Prioriser

2. هل لدينا من نقط القوة ما يمكننا من تجاوز هذا العائق ؟







تحديد الأولويات Prioriser

- اختيار الأولويات يكون بالتوافق بين أعضاء فريق المشروع، ويمكن الاستعانة بتقنية المجموعة الاسمية TGN إذا تعذر التوافق:

	عضو 1	عضو 2	عضو 3	عضو 4	المجموع
العائق1:.....					
العائق2:.....					
العائق3:.....					
العائق4:.....					
العائق5:.....					
العائق6:.....					


بعد تحديد من 2 إلى 3 أولويات كحد أقصى، سنقوم بتحديد الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيقها:

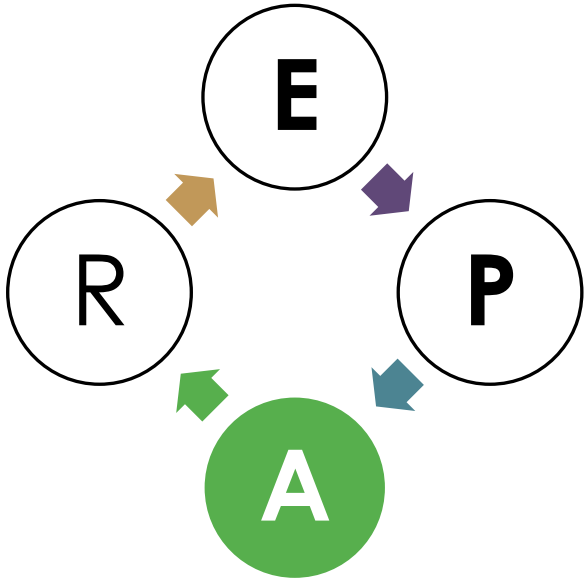

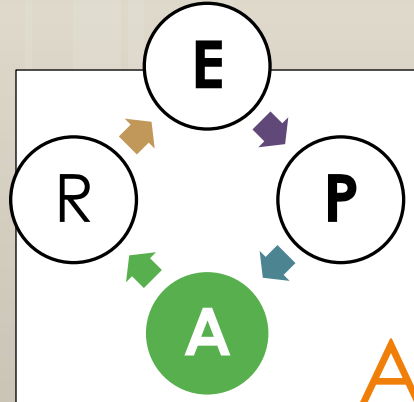

الأجرأة/الفعل ACTION

- نحدد بالنسبة لكل أولوية، من 2 إلى 3 إجراءات فعلية:
  - إجراء فعلي رئيسي : داخل الفصل الدراسي؛
  - إجراء فعلي 2 و 3 : خارج الفصل الدراسي,

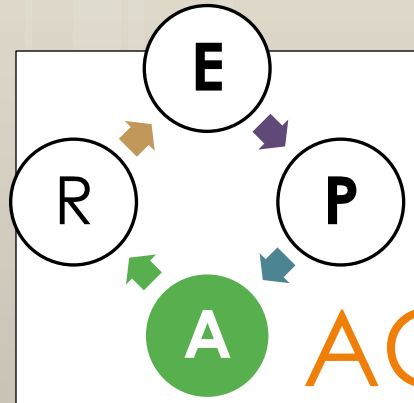


الأجرأة/الفعل ACTION

كيف نحدد الإجراءات الأكثر نجاعة :

عبر طرح سؤالين :

1. هل حددنا في نقط قوتنا دعامة/مرتكزا تمكننا من تنفيذ هذا الإجراء؟
2. ما مدى قرب أو بعد هذا الإجراء عن تعلمات التلاميذ ؟



أولوية 1


- إجراء 1 داخل الفصل
- إجراء 2
- إجراء 3


أولوية 2

- إجراء 1 داخل الفصل
- إجراء 2
- إجراء 3

أولوية 3


- إجراء 1 داخل الفصل
- إجراء 2
- إجراء 3





- تحديد الأولويات و أجرأة و تنفيذ العمليات المرتبطة بها ينبغي أن يتسم ب :
  - التواضع؛
  - الصرامة و الفعالية؛
  - الصبر .







الأجرأة/الفعل ACTION

مخطط العمل ⟵

العملية	توقيتها	مكانها	المكلف بإنجازها	مواردها البشرية	مواردها المادية	مؤشر إنجازها	المكلف بتتبعها	تدبير المخاطر
1								
2								
3								

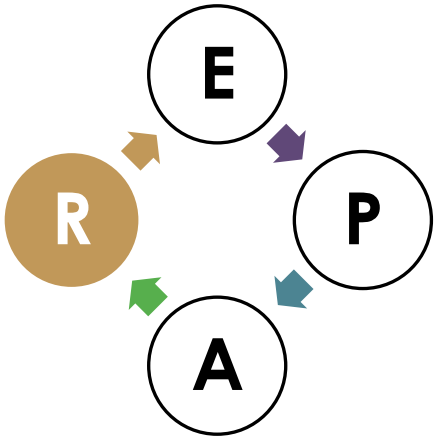

كلما كان مخطط العمل مفصلا و متضمنا للعناصر أعلاه، كلما كان تتبعها و تقويمها أكثر يسرا و دقة...

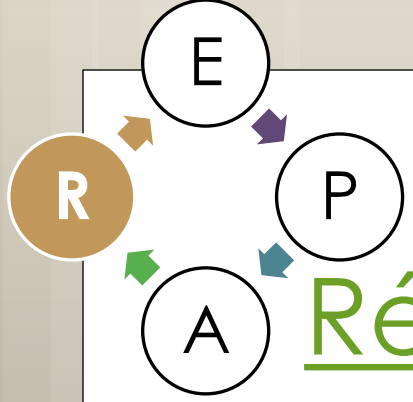

التتبع و التقويم Régulation


من خلال طرح سؤالين :

1. هل تم إنجاز العمليات المتفق عليها فعلا؟
2. إذا كان الجواب نعم، هل حققنا الهدف المحدد؟ هل وصلنا للنتيجة المتوخاة؟



- إذا كان الجواب نعم


3. المصادقة

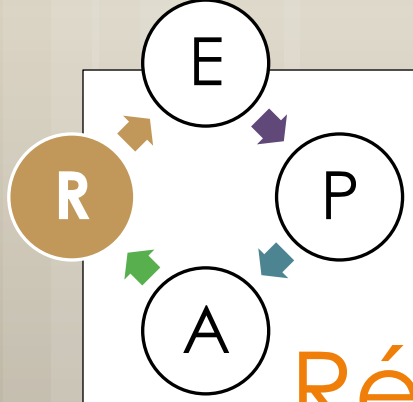

Régulation التتبع و التقويم

إذا كان الجواب لا :



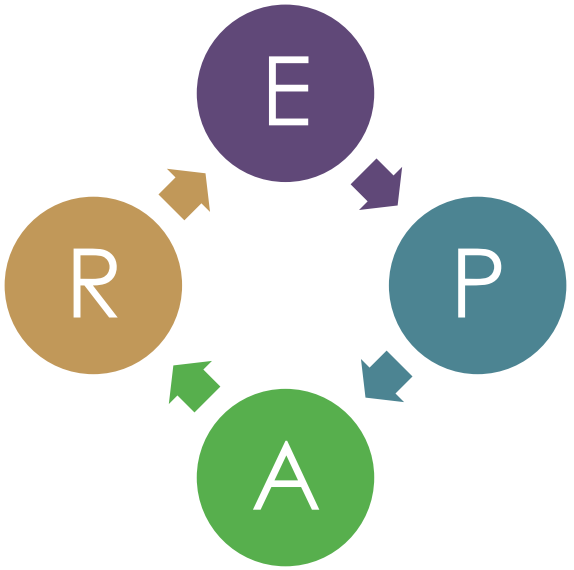

- مشروع المؤسسة، لا يعني:

- طبع النسخة النهائية للوثيقة، وإنهاء المجهود، والانتقال الى ملف آخر؛

- فخاخ محتملة!

! خلال مرحلة تشخيص وضعية المؤسسة:

- سيكون من الخطأ وضع تشخيص وفق منطق طبي، والبحث بأي ثمن عن تحديد الداء وكل المشاكل التي تعاني منها المؤسسة والتلاميذ.

! خلال مرحلة تحديد الأولويات:

- من الخطأ الاحتفاظ بكل الأولويات، ليظهر العمل شاملا.

! خلال مرحلة الأجرأة:

- من الخطأ إغفال أهمية تقوية كفايات المدرسين والمدرسات؛

- - من الخطأ تركيز المجهود والموارد بعيدا عن التعلمات والممارسات التربوية والحياة
- المدرسية .

استحضار الشروط الدنيا

- استحضار أهمية **الزمن والتواصل** لتيسير تداول وتوافق كل المتدخلين، وذلك من خلال مناخ للعمل يستوعب:
- المخاطرة؛
- تردد بعض الأعضاء؛
- الخطأ؛
- سيرورة التغيير؛
.....وحتى بعض أشكال الرفض والمقاومة.

الآثار المنتظرة

- على المدى القريب : مدرسون ومدرسات متحمسون اتجاه النشاط، ويتم الإصغاء لهم ؛
- على المدى المتوسط : ثقافة للتشاور تقلل من الاحساس بالعزلة لفائدة الاحساس بالفعالية المهنية؛
- على المدى البعيد : تلاميذ وتلميذات يتعلمون أكثر وأحسن.

إن المشروع، يعني :


- سيرورة تحول بطيئة ومتدرجة لثقافة المؤسسة.
- أداة للتعاضد وتنسيق الطاقات المبذولة يوميا داخل المؤسسة .
- بوصلة توجه الاختيارات المختلفة، الصغيرة منها والكبيرة.

ممارسات واعدة، تركيز كبير في اتجاه الهدف البعيد للمشروع:

تجويد التعلمات والارتقاء بالحياة المدرسية ونجاح كل التلاميذ والتلميذات؛

- جعل المشاريع التربوية للأقسام دعامات لبناء مشروع المؤسسة؛
- قيادة مفتوحة تستوعب الطرق والأساليب المختلفة، وأحيانا غير المتوقعة، وذلك للوصول إلى الهدف الرئيسي، وبعبارة أخرى، الحزم اتجاه الغايات، والمرونة اتجاه التدابير والإجراءات. مع الصبر والمثابرة والحكمة الكافية، وتفادي التسرع في اتخاذ علاج قد لا يكون مفيدا.

المراحل الثلاث للتشخيص القصير المطبق

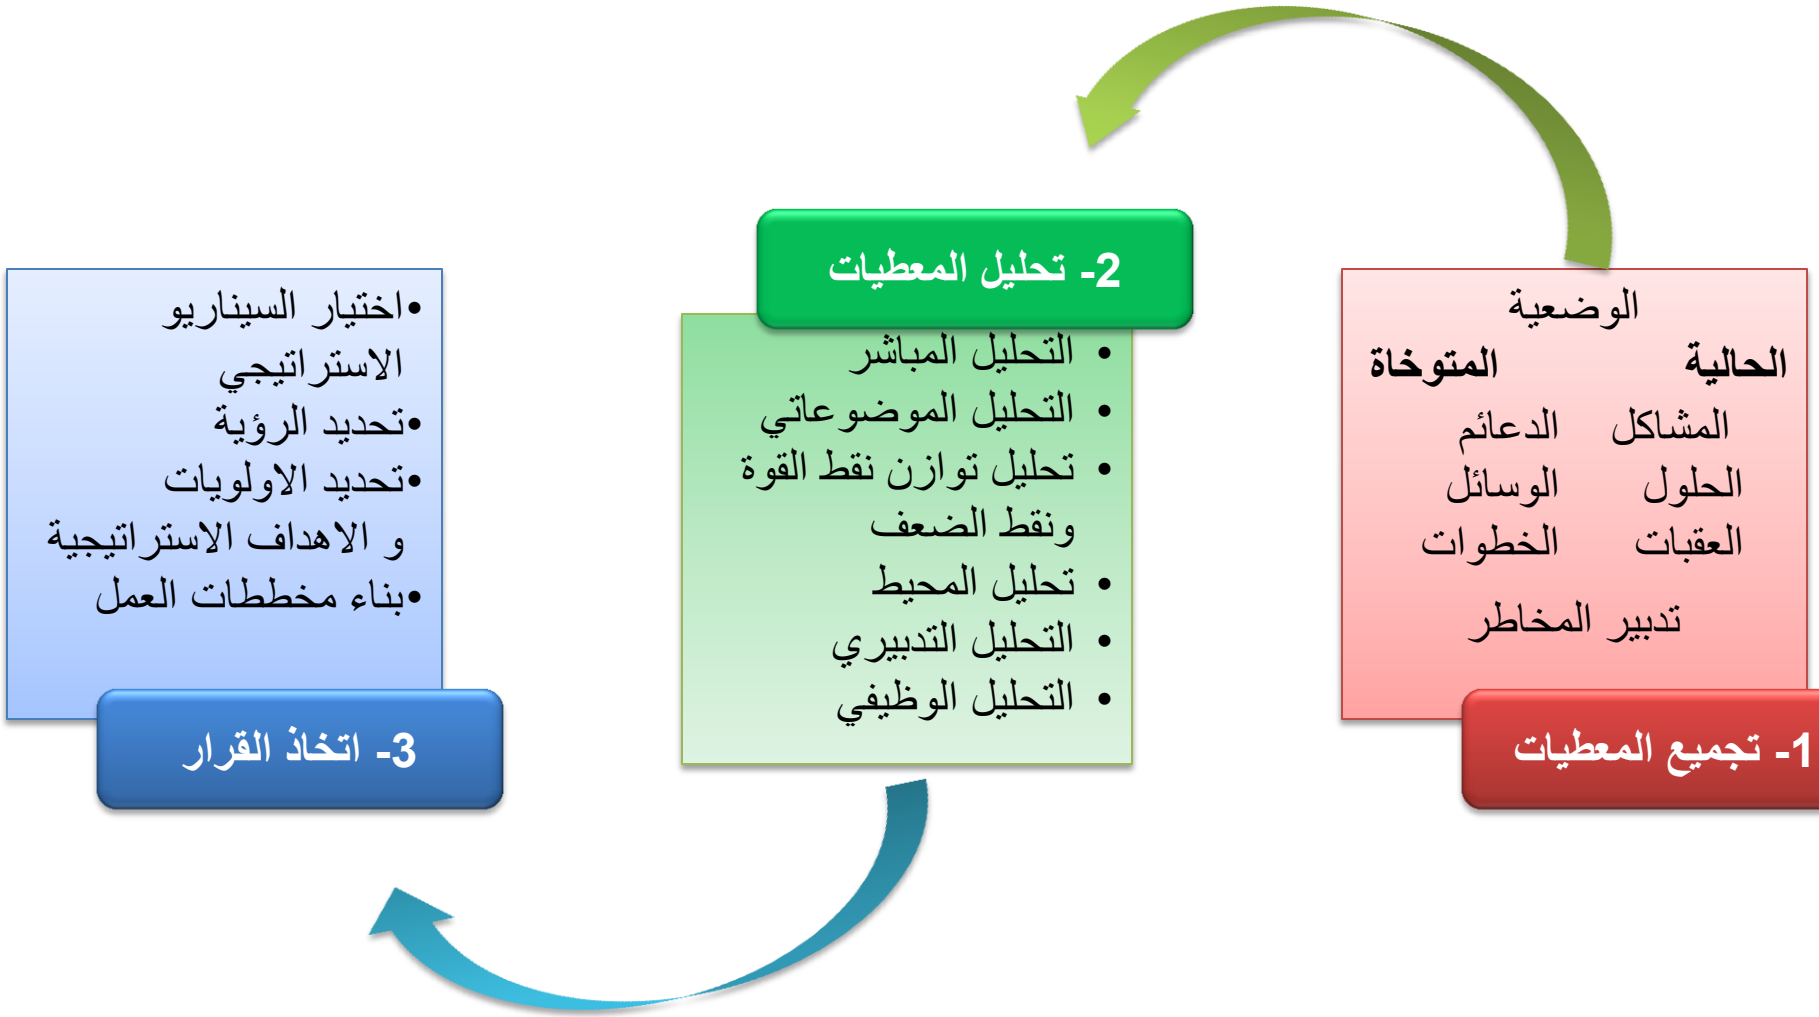

شكرا على تتبعكم





Arbre des causes

