

ተጽዕኖት ስርዓተ
ተሰባስቦት ስርዓተ ስርዓተ
ለ ስርዓተ ስርዓተ ስርዓተ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

مجزوءة مشروع المؤسسة المندمج 2- مطبوع المجزوءة

الوحدة المرئية لتكوين الأخص

الموسم التكويني 2022-2023

عدة تكوين - سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين - 2022 - 2023



الفهرس

4	تقديم.....
5	الكفاية المستهدفة.....
5	أهداف المجزوءة.....
5	محاوالمجزوءة.....
6	المحور الأول: مشروع المؤسسة المندمج (المفهوم والأسس النظرية والمبادئ الأساسية).....
6	أولاً: مفهوم "مشروع المؤسسة".....
8	ثانياً: أهمية وأهداف "مشروع المؤسسة المندمج".....
9	ثالثاً: الأسس النظرية لمشروع المؤسسة المندمج.....
14	رابعاً: المبادئ الأساسية لـ "مشروع المؤسسة" ومركزاته ومجالاته وخصائصه.....
18	خامساً: كرونولوجيا إرساء مشروع المؤسسة المندمج.....
25	ثانياً: الأطر المنطقية للمشاريع الاستراتيجية.....
30	المحور الثاني: مراحل إعداد مشروع المؤسسة المندمج.....
30	أولاً: تشكيل فريق فعال لقيادة مشروع المؤسسة.....
44	ثانياً: حكامه مشروع المؤسسة المندمج.....
46	إبرام اتفاقيات شراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل مشروع المؤسسة.....
46	ثانياً: مراحل المشروع حسب منهجية DEPART.....
66	المحور الثالث: دور الشراكة والتعاون والذكاء الجماعي في تفعيل مشروع المؤسسة المندمج.....
66	أولاً: في النشأة والمفهوم.....
67	ثانياً: صيغ الشراكة.....
68	ثالثاً: شركاء المؤسسة التعليمية.....
68	رابعاً: فوائد المسعى التشاركي.....
69	خامساً: القواعد الأساسية للشراكة.....
70	المحور الخامس: مسار إنجاز مشروع المؤسسة المندمج وتتبعه وتقويمه.....
70	أولاً: مسار مشروع المؤسسة.....
73	ثانياً: مفهوم التتبع والتقييم والتميز بينهما.....
74	ثالثاً: مؤشرات مرجعية لمشروع المؤسسة.....
75	رابعاً: أغراض تقييم مشروع المؤسسة.....
76	خامساً: معايير المتابعة والتقييم.....
79	سادساً: أدوات ومؤشرات المتابعة والتقييم.....
88	المحور السادس: مستلزمات نجاح مشروع المؤسسة.....
88	أولاً: التكوين وقيادة التغيير.....
89	ثانياً: المقاربة التشاركية.....
91	ثالثاً: أهمية التواصل ووسائله في المشروع.....
92	رابعاً: خطوط رئيسية ينبغي اتباعها في إحداث التغيير (مشروع المؤسسة).....
93	خامساً: جودة تدير اجتماعات تتبع سير الإنجاز.....
95	سادساً: نماذج ناجحة لمشاريع المؤسسة.....
96	قائمة بأهم المصطلحات.....
97	قائمة المصادر والمراجع.....

تقديم

يعتبر مشروع المؤسسة المندمج الآلية الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التربية الوطنية لتفعيل مشاريع الإصلاح داخل المؤسسة التعليمية، وذلك لكونه إطاراً منهجياً وآلية عملية ضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التربوية والتدبيرية والهادفة إلى تحسين جودة العملية التعليمية-التعلمية، وأجراً للإصلاحات التربوية داخل كل مؤسسة. وقد عملت الوزارة منذ التسعينيات على التبنى التدريجي لمفهوم مشروع المؤسسة المندمج، في إطار التوجهات الكبرى للوزارة الرامية إلى اعتماد اللامركزية والتركيز كخيار استراتيجي يجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية، ودعامة أساسية للرفق بالفرد والمجتمع، وقاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن أجل الرفق بالأداء التربوي والتدبري للمؤسسات التعليمية، من خلال تطوير مؤشرات الإنجاز الكمية والنوعية. اتضح جلياً الحاجة الماسة إلى إعطاء نفس جديد لمأسسة منهجية مشروع المؤسسة المندمج كآلية للتدبير وأداة للتعاقد لتفعيل المشاريع الاستراتيجية وفق مقتضيات القانون الإطار 51.17.

من هذا المنطلق، عملت الوزارة من خلال المذكرة 087.21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج، وفق منهجية DEPART الجديدة، باحترام مجموعة من التوجهات والضوابط المنهجية كالآتي:

- الانتقال من وثيقة المشروع الكلاسيكية المبنية على الإنشاء والاطناب في التأصيل النظري إلى وثيقة مشروع تقنية مضبوطة المراحل، تتضمن مؤشرات واضحة تضمن الانسجام والشمولية والنسقية.

- التركيز على المرحلة الأولى والأخيرة في إعداد المشروع، بحيث إن عدد من مشاريع المؤسسات التعليمية يتم بناؤها من دون تفعيل أجهزة التدبير والحكمة بالمؤسسة، أو تبنى على معطيات تشخيصية غير متناسبة مع وضعية المؤسسة، مما يجعل مخرجات المشروع غير متناسقة، ولا تدرس بشكل مرحلي انتقالي ضماناً لسيروية تنفيذ المشروع، مما يجعل المؤسسات تنتقل بعد 03 سنوات إلى مشروع آخر يختلف تماماً عما تم الاشتغال عليه سابقاً.

- أن تحرص فرق القيادة على إعداد بطائق تقنية لمختلف أنشطة مشروع المؤسسة المندمج كملحق إضافي، تتضمن مختلف معطيات تنزيلها وأجرائها بشكل يسمح بتتبع التنزيل لمختلف أنشطة المشروع.

وتستهدف هذه المجزوءة، تكوين أطر الإدارة التربوية المتدربة على الفهم السليم في أفق القيادة الفعالة لمشروع المؤسسة المندمج عبر مراحل إنجازها المختلفة، باعتباره آلية إستراتيجية للتجديد التربوي وتحسين جودة التعليمات داخل المؤسسة التعليمية وتمكينهم من ضبط الأسس والمرتكزات التشريعية والتنظيمية، واعتماد مختلف المرجعيات التربوية المؤطرة لمشروع المؤسسة المندمج وتوظيفها في الممارسات المهنية اليومية داخل المؤسسة التعليمية سواء كانوا رؤساء هذه المؤسسات أو أعضاء فريق قيادة مشروع المؤسسة المندمج التي ينتمون إليها.

الكفاية المستهدفة

في نهاية المجزوءة، يصبح المتدرب قادرا على تملك آليات إعداد وإنجاز وتتبع وتقويم مشروع المؤسسة المندمج، وتقديم مقترحات لتطويره وتعديله، وذلك بالاستناد إلى الأسس التشريعية والتنظيمية والتربوية المؤطرة له، والانفتاح على شركاء المؤسسة المحتملين، وباعتماد مقارنة الاشتغال بالفريق.

أهداف المجزوءة

- تملك مفهوم مشروع المؤسسة المندمج ومرجعياته التشريعية والتربوية والتنظيمية؛
- التعرف على سيرورة مشروع المؤسسة المندمج وأسس بنائه وفق الإطار المنطقي؛
- الالتزام بروح العمل بالفريق، وتنمية أساليب القيادة الفعالة لمشروع المؤسسة المندمج؛
- التمكن من مهارات صياغة مشروع المؤسسة المندمج ومسار إنجازهِ وتتبعهِ وتقويمهِ بمقاربة تشاركية؛
- التمكن من إعداد مشروع اتفاقية الشراكة والمساطر الواجب اتباعها لإبرامها؛
- تملك آليات تدبير الشراكة وتقويمها في ضوء حاجات المؤسسة وطبيعة الشركاء المحتملين.

محاوِر المجزوءة

- مشروع المؤسسة المندمج: الأسس النظرية والمرجعيات والأطر المنطقية؛
- مراحل إعداد مشروع المؤسسة المندمج وفق منهجية DEPART؛
- دور الشراكة والتعاون والذكاء الجماعي في تفعيل مشروع المؤسسة المندمج؛
- تنزيل مشروع المؤسسة المندمج، وتوثيق مساره.

المحور الأول: مشروع المؤسسة المندمج (المفهوم والأسس النظرية والمبادئ الأساسية)

أولاً: مفهوم "مشروع المؤسسة"

- مفهوم "مشروع المؤسسة" لغة:

يتشكل مفهوم "مشروع المؤسسة" من كلمتين، "مشروع" و"مؤسسة"، فأما كلمة "مشروع"، فلقد جاء في المعجم الغني¹: مَشْرُوعٌ (مَشْرُوعَةٌ) - [شرع]، (اسم مفعول مِنْ: شَرَعَ)، وهو باعتبار مجال اشتغالنا:

1- "عَمَلٌ مَشْرُوعٌ": عَمَلٌ مُسَوَّغٌ، أَيْ مَا سَوَّغَهُ الشَّرْعُ.

2- "اِسْتَخْدَمَ طَرِيقًا مَشْرُوعَةً": طَرِيقًا مَسْمُوحًا بِهَا.

3- "حَضَرَ مَشْرُوعًا جَدِيدًا": مَا يُحَضَّرُ فِي مَجَالٍ مِنَ الْمَجَالَاتِ وَيُقَدَّمُ فِي صُورَةٍ مَّا أَوْ خُطَّةٍ لِيُدرَسَ وَيُقَرَّرَ فِي أَفْقٍ تَنْفِيذِهِ. "مَشْرُوعٌ تِجَارِيٌّ" "مَشْرُوعٌ اقْتِصَادِيٌّ" "مَشْرُوعٌ ثَقَافِيٌّ".

وحسب المنجد في اللغة والأعلام²، لها ثلاثة معاني، ما سوغه الشرع، من الفعل شرع أي سن شريعة. والمشروع المسدد، من الفعل شرع بمعنى سدد وصوب، نقول شرعت الرماح أي سددتها وصوبتها فتسددت وتصوبت. والمشروع ما بدأت بعمله، من الفعل شرع أي بدأ. وهو عموماً ما يراد فعله، الجمع: مشاريع.

ومفهوم "المشروع" مستمد من كلمة « **projet** »، وهي كلمة لاتينية يوازيها في اللغة الإنجليزية « **purpose** » و« **project** » في اللغة الإنجليزية³.

Le terme " projet " provient du verbe latin projicere qui signifie " jeter en avant ".

Le projet nom masculin du verbe projeter.

- But que l'on se propose d'atteindre : Un projet chimérique.

Synonymes : dessein - idée - intention - plan - programme P

- Idée de quelque chose à faire, que l'on présente dans ses grandes lignes : Son projet a été accepté.

- Première ébauche, première rédaction destinée à être étudiée et corrigée : Un projet de roman.

Synonymes : esquisse - linéaments - schéma

- Tracé définitif, en plans, coupes et élévations, d'une construction à réaliser (machine, équipement, bâtiment, aménagement urbain, etc.). [Le tracé initial, à partir des études préliminaires, est l'avant-projet.]

- Étude de conception de quelque chose, en vue de sa fabrication.

1 - أبو العزم، عبد الغني، المعجم الغني، 1421هـ/2001م

2 - المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، الطبعة 27، 1986، ص. 382-383.

3 - <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/projet/64232>

ومصطلح المؤسسة¹، اسم، جمعها: مؤسسات، وهي صيغة المؤنث لمفعول أسس، والمؤسسة: منشأة تؤسس لغرض معين، أو لمنفعة عامة ولديها من الموارد ما تمارس فيه هذه المنفعة. (معجم المعاني الجامع، انطلاقاً من موقع المعاني).

- مفهوم "مشروع المؤسسة"² اصطلاحاً

يعرف البعض "مشروع المؤسسة" بكونه "سيرورة تهدف بطريقة تدريجية الملاءمة بين السلوكات اليومية داخل المؤسسة، وبين تصور أو تصورات لدى الفاعلين للنشاط التربوي"³.

والبعض الآخر يعرف مشروع المؤسسة، بأنه الوعي الذي يوحد العقول رغم تنوعها، في إطار خطة لتدخل المسؤولين في المجال التربوي، والأولياء، والمدرسين، بهدف استيعاب الغايات الجديدة للتربية، والأهداف الواجب بلوغها، وكذا الوسائل الواجب توفيرها في كل وضعية محددة"⁴.

والبعض الثالث يعرف المفهوم بأنه "تركيب لمختلف المناشط البيداغوجية والتربوية والثقافية داخل المؤسسة، يندرج في إطار توجه وطني، ولكن بتواجد قوي للخصوصية المحلية"⁵.

وهناك من يعرفه، بكونه "سفراً في المستقبل، انطلاقاً من تشخيص لوضعية محددة، ومن خلال تمثل الهدف الواجب بلوغه، وتصور المسافة بين وضعية الانطلاقة "أ" ووضعية الوصول "ب". أي أنه آلية للقيادة تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع، وتقتضي بالتالي تعديلاً لنمط تسيير المؤسسة"⁶.

يتضح مما سبق أن "مشروع المؤسسة" يروم ربح مجموعة من الرهانات التي تتضافر لإحداث دينامية التجديد التربوي المستمر وتحقيق الأهداف المرسومة وذلك على المستويات التالية:

بيداغوجيا: بمحورة العملية التعليمية والتعلمية حول المتعلم وتكييفها وفق حاجياته الأساسية في أفق تلبيتها.

تربويا: بتقوية روح المبادرة لدى المتعلم والاهتمام به داخل المؤسسة وخارجها وإشراك الآباء والأولياء في اتخاذ القرارات المتعلقة بتمدرس أبنائهم.

¹ - <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9/>

² - الطاهري، نور الدين، (1997): مشروع المؤسسة نحو استراتيجية للتغيير المخطط له في المؤسسات التعليمية بالمغرب (دراسة تدخلية استكشافية"، الدار البيضاء، دار الاعتصام- الأحباس، ص40.

³ - Claude paquette : « Éducation aux valeurs et projet éducatif », l'approche, Ed. Québec/Amérique, Tome 1, 4ème trimestre. 1991. p.40.

⁴ - Gloton : « Établissement scolaire, unité éducative », collection Orientations/E3, Ed. CASTERMAN, Paris, 1997, p. 46.

⁵ - Michel Mendès- Végua : « Projet d'établissement, Elaboration, Présentation, Validation », Ed. CRDPR, Bordeaux, 1991, p. 11.

⁶ - Groupe de recherche : « Pour changer le collège, une gestion participative », CDPR-LILLE, p. 17.

مؤسساتيا: بالتنسيق بين مجموع الفاعلين وتشجيع العمل الجماعي في إطار الفرق التربوية وتحسيس أعضائها بضرورة الالتزام بالتعاقد والذي سبق وأن ساهموا في تحديد وصياغة بنوده، مع الحرص كذلك على تحديد الحاجيات التكوينية لأعضاء الفرق التربوية وإدماجها في المشروع في أفق تلبيةها.

أما "مشروع المؤسسة المندمج" حسب المذكرة 087.21، فهو مشروع يهدف إلى تجويد التعليمات، وتحسين مؤشرات التمدرس من خلال التركيز على مجالات عمل، ستمكن من تحقيق ملائمة للبرامج التعليمية من خلال اعتماد منهجية جديدة، تركز على تعبئة المتدخلين قصد تشجيعهم على اعتماد ممارسات جديدة في مجال التدبير المندمج والمناهج التربوية المتمحورة حول التلميذ¹.

ثانيا: أهمية وأهداف "مشروع المؤسسة المندمج"

يكتسي مشروع المؤسسة المندمج أهمية بالغة بوصفه "يندرج في إطار التوجهات الكبرى للوزارة الرامية إلى اعتماد اللامركزية واللاتركيز كخيار استراتيجي يجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية والمنطلق والنهاية" من جهة، ومن جهة أخرى، خطة تربوية تضمن معالجة المواضيع المطروحة والمستعجلة والتي لها علاقة بمختلف مكونات المجتمع المدرسي، وتمكن من ترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية والمالية والتربوية، وتوضح الأهداف المنشودة والسبيل إلى تحقيقها، وتخلق تفاعلية إيجابية داخل فريق العمل بتوزيع المهام بينهم لترشيد استغلال الإمكانيات المتنوعة وتفادي تكرار الجهود.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع المؤسسة المندمج فيما يلي²:

- إرساء أسس الحكامة التربوية الجيدة، وسياسة القرب، والمقاربة التشاركية، والتدبير بالنتائج؛
- تكريس منهجية التدبير الجماعي للمؤسسة من خلال إشراك المدرس والمتعلم في بلورة رؤية جماعية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعلى رأسها جودة التعليمات من خلال التتبع الفردي للمتعلّقات والمتعلمين، ودعمهم المستمر، وتقوية كفايات هيئة التدريس؛
- تحديد المشكلات والحلول العملية الملائمة محليا لمعالجة التعثر والهدر المدرسين، وضعف النتائج، والتغيب، والسلوكات السلبية للمتعلّقات والمتعلمين، وصعوبات انفتاح المؤسسة على محيطها؛
- تشجيع ثقافة المبادرة، والابتكار، وتنمية المهارات الحياتية للمتعلّقات والمتعلمين؛

¹ - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مذكرة رقم 087.21 بتاريخ 06 أكتوبر 2021، في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج.

² - وزارة التربية الوطنية، (2014)، المذكرة 14/159 بتاريخ 25 نونبر 2014 في موضوع "أجراً الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة"، ص. 1.

- ضمان التعبئة القصوى لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والشركاء وضمان انخراطهم القوي في تحقيق أهداف المشروع؛

- تفعيل مقارنة التخطيط التصاعدي للمنظومة، من خلال استثمار أولويات ونتائج مشاريع المؤسسات في وضع المخططات الإقليمية والجهوية لتنمية التربية والتكوين.

ويركز بشكل أساسي حسب المذكرة 087.21 تجويد التعلّيمات، وتحسين مؤشرات التمدّرس؛ من خلال منهجية تركز على تعبئة المتدخلين قصد تشجيعهم على اعتماد ممارسات جديدة في مجال التدبير المندمج، والمناهج التربوية المتمحورة حول المتعلم(ة).

ثالثاً: الأسس النظرية لمشروع المؤسسة المندمج

❖ المشروع الشخصي للمتعلم¹

يمكن للمتعلمين ذوي اهتمامات خاصة أن يشتغلوا عليها في إطار مشاريع فردية، تحت إشراف أطر التوجيه التربوي، أو المدرسين، أو الإداريين، أو متدخلين آخرين، على أن يتمكنوا من تقديم نتائج أنشطتهم لزملائهم بالقسم أو المؤسسة².

ومن التعاريف الرسمية، ما ورد في المادة 7 من القرار الوزاري رقم 062.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي: "المشروع الشخصي للمتعلم هو "السيرورة التي ينخرط فيها المتعلم من أجل تحديد هدف مهني يطمح إلى تحقيقه، وتحديد المسارات الدراسية والتكوينية المؤدية إليه، وخطته الشخصية لبلوغه، والخيارات البديلة في حالة تعثره في الوصول إلى هذا المبتغى".

أما الباحث عبد العزيز سنهجي (2019) فقد استنتج تعريفاً للمشروع الشخصي للمتعلم، تركباً من تعريفات لبيداغوجيين ومهتمين بالموضوع من جوانب مختلفة؛ ف"المشروع الشخصي هو خطة عمل يعتمد عليها المتعلم لتحقيق أهداف وأغراض محددة عن طريق توقعها وتوفير الوسائل اللازمة لبلوغها. إنه تمثل استباقي تنبؤي لنتيجة مستقبلية، يستهدف منها تحقيق غاياته ومطامحه ورغباته وحاجياته³.

¹ - قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم م 62.19 صادر في 07 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي؛ والمذكرة الوزارية رقم 19 / 0734 بتاريخ 09 أكتوبر 2019 حول تفعيل العمل بالنصوص التنظيمية بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي؛ والمذكرة الوزارية 106 / 19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 المتعلقة بإرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية؛

² - وزارة التربية الوطنية، دليل الحياة المدرسية، دجنبر 2008، ص38

³ - عبد العزيز سنهجي، المشروع الشخصي للمتعلم في ضوء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، مطبعة شمس برينت، الرباط، شتنبر 2019، ط1، ص 34-35.

❖ مشروع القسم¹

يقوم مدرس أو مدرسو القسم، بتأطير المتعلمين، في إنجاز المشروع، بحيث يتمتع هؤلاء بحرية اختيار المشاريع وتخطيطها وإعدادها وتبعتها وتنفيذها، ويقتصر دور المدرسين على التوجيه والإرشاد، وتوفير الظروف المواتية لإنجاز المشروع الذي يتصف بالطابع التربوي والعملي ويركز على موضوع محدد في مجال من مجالات الأنشطة المندمجة.

ويمكن تعريف المشروع بأنه نشاط تعلّمي مطلوب من المتعلّم أو المتعلّمين، ويتطلّب إنجاز استثمار موارد مستفادة من مادة معرفيّة واحدة أو أكثر، وإدماجها في مشروع حقيقي ذي معنى بالنسبة إلى المتعلم. كما يمكن أن ينفذ بشكل فردي أو جماعي (فرق أو مجموعات)، وتنوّع المشاريع بشكل كبير، نذكر منها على سبيل المثال:

- إعداد ملفّ عن موضوع محدّد: مضارّ المخدّرات، التصحّر، تلوث المياه، جمع معلومات عن شخصيّة معيّنة، عادات وتقاليدها، ظاهرة محدّدة...
- تنفيذ مجسّسات: أشكال هندسيّة، معالم أثرية أو دينيّة...
- تنظيم وتنفيذ: رحلة، حملة نظافة، احتفال، جمع تبرّعات، تمثيليّة، معرض، حملة تشجير، حملة دعائيّة، ملصق إعلانيّ...
- إنتاج: مجلّة، فيلم مصوّر، بحث علمي، مقالة...
- إجراء: مقابلات، تجربة وكتابة تقرير عنها، دراسة ميدانية....

❖ المشروع التربوي²

المشروع التربوي سلوك استباقي يقوم على القدرة على تصور خطة عمل مستقبلية، وتخطيط مراحل إنجازها وفق أهداف محددة سلفا.

ويندرج تحت الصنف، المشروع الشخصي المؤطر للمدرس وأطر الإدارة التربوية وكذا أطر الدعم...

ويتكون المشروع التربوي³ من جملة المراحل والعناصر التي تؤلف مجتمعة فعلا تربويا مستقلا بذاته ينجزه المرّبي تحت إشراف توجيهي من المؤطرين حول موضوع تربوي محدد يستجيب لشروط الممارسة التربوية الهادفة ولحاجات أحد الأنساق أو المجالات التربوية، الذي يرصده الباحث/المدرس/المدير ويستعدّ للبحث فيه فهما وتحليلا وتطويرا أولا، ثم التدخل الميداني ثانيا، مستعينا بتكوينه النظري في علوم التربية والعلوم المتصلة بها (النظريات المفاهيم المقاربات...) (وبتكوينه التقني) التقنيات التنشيطية والتعبيرية مثل المسرح والسينما والأدب والفنون التشكيلية والألعاب والإعلامية...).

¹ - نفسه

² - مجلة دفاتر التربية والتكوين، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، العدد 11، ملف "الإدارة التربوية ومشروع المؤسسة"، يوليو 2014، ص 42.

³ - Wacquez (Jehan), Les fondamentaux le noyau dur du métier d'éducateur, www.educ.be/ (extrait)

وللمشروع التربوي خصوصيات نذكر منها¹:

- المشروع التربوي مقارنة دينامية

يشكل المشروع التربوي مقارنة دينامية بمعنى أنه في سيرورة دائمة، فالمدرسة ليس لها مشروع؛ بل هي نفسها في وضعية مشروع. لأن المشروع ليس شيئاً جامداً؛ وإنما هو يتطور ويتكيف باستمرار مع الحاجات والوضعية الجديدة.

- المشروع التربوي خاص بكل مدرسة

ينتمي المشروع إلى مدرسة معينة. إنه نتاج خاص بمحيط معين يلتصق بالواقع المميز لكل مدرسة. وهو يخضع بالطبع للمتطلبات الوزارية التي هي متطلبات عامة، لكن كل مدرسة تطبعه بطابعها الخاص وتعمل على تحقيقه.

- المشروع مقارنة قائمة على التفكير الجماعي

يسمح المشروع بإشراك جميع العاملين في تحديد القيم والمبادئ التي تؤطر النشاط التربوي. وتؤدي المدرسة رسالتها التعليمية والتربوية بواسطة المشروع الذي يأخذ بعين الاعتبار القوانين والتنظيمات الوزارية وكذا الواقع السوسيو اقتصادي والثقافي للمحيط. إن المشروع وسيلة ملموسة للاستجابة لحاجات التلاميذ وحاجات المجتمع الذي يعيشون فيه، فهو يأتي ليدقق القوانين والإجراءات الوزارية ليجعلها ملائمة للمعطيات الخاصة بكل محيط. يكون الهدف معروفاً لدى الجميع لكن وسائل تحقيقه تختلف باختلاف حاجات التلاميذ وأولويات المدرسة.

- المشروع التربوي شامل لجميع عناصر خطة العمل

يتضمن المشروع التربوي جميع عناصر خطة عمل تسمح بتحقيق التوجيهات المرسومة باتفاق مع جميع الفاعلين في المحيط. فإدارة المدرسة تقوم بتدبير المشروع، وهي المسؤولة بهذه الصفة عن التدبير التربوي والإداري للمدرسة. إنها تخطط وتنفذ وتشرف وتقوم المشروع بين الحين والآخر وتصوب اتجاه سير العمل.

ونشير في نهاية الأمر إلى أن مفهوم المشروع التربوي يتضمن في جوهره مبدأ الاستمرارية ومبدأ التطور عبر الزمن. وبهذا المعنى تكون المدرسة في مشروع أي أنها في حركة مستمرة، هي تنظر إلى نفسها في المستقبل وتعطي صورة شيء يتكيف باستمرار مع الواقع.

¹ - Ministère de l'Éducation Nationale (1997) Le projet d'établissement. Projet SN/BAJ-97.

❖ مشروع المؤسسة¹

إذ تعتبره إطاراً منهجياً يوجه جميع الفاعلين التربويين والشركاء، والآلية العملية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التديرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم لجميع المتعلمين والمتعلّقات وأجراً السياسات التربوية داخل كل مؤسسة تعليمية مراعية خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها².

يعتبر مشروع المؤسسة إطاراً منهجياً وآلية عملية ضرورية لتنزيل وأجراً البرامج والمشاريع التربوية داخل كل مؤسسة تعليمية، وتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التديرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم لفائدة التلميذات والتلاميذ، مع مراعاة الخصوصيات والرهانات المحلية³.

"إن مشروع المؤسسة يعني برنامجاً إرادياً وخطة تطوعية مؤلفة من مجموعة من الأعمال المنسجمة التي تهدف إلى الحصول على أفضل النتائج في المؤسسات التعليمية، والرفع من مستوى التحصيل بها، والسمو بجودة علاقتها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"⁴

ينبغي المشروع على قيام المؤسسة التربوية "بدور فعال في إغناء البحث الميداني والمساهمة في تنمية التجديد التربوي على الصعيد المحلي... في إطار مشروع تقوم المؤسسة التربوية بضبط معالمه واستراتيجية تنفيذه وأساليب تقويمه -كيفية فردية أو في إطار شراكة بين مجموعة مؤسسات تربوية- وتحدد له وسائل الإنجاز والدعم وأنواع الخبرات والكفايات العلمية، والمستلزمات الفنية والمادية التي يتطلبها تنفيذه، على أن تكون الأهداف التي يسعى لتحقيقها لا تتعارض مع الغايات المرسومة للنظام التربوي"⁵

وهو حسب (الفارابي ورفاقه، 1996، ص 20). "خطة أو برنامج متوسط المدى يتألف من أعمال وأنشطة قصدية ذات طبيعة تربوية وبيداغوجية، يشارك في بلورتها وإعدادها وإنجازها وتقويمها مجموعة من الفاعلين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية، وفاعلين لهم اهتمام بالتربية، تربطهم بالمؤسسة علاقة شراكة. ويتوخى مشروع المؤسسة المندمج بالأساس الرفع من إنتاجية المؤسسة، وتحسين شروط العمل داخلها، والرفع من مردوديتها التعليمية، ودمجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

"إن مشروع المؤسسة (ساسي ورفيقتاه، 1995، ص 169) يشكل عملاً متكاملًا ومنسجمًا يمس ويهم جميع الأنشطة الداخلية والخارجية للمؤسسة. وهو أيضاً رهان محلي منطلق من واقع يتسم بالوحدة والحركية ويهدف إلى تحسين ذلك الواقع بالتدرج."

مشروع المؤسسة منظور شمولي لرسالة المؤسسة في التربية والتكوين، ينبثق من المدرسة ومحيطها، ويتيح توافق المعنيين به حول توجهات وقيم وأولويات تؤسس للعمل الجماعي. وهو عبارة عن خطة تربوية منسجمة

¹ - وزارة التربية الوطنية، دليل مساطر إنجاز مشروع المؤسسة، مشروع دعم التعليم الأساسي A. P. E F، نيكول بودلي، CASSIOPE تكوين - تنمية. يونيو 2005.

² - وزارة التربية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة في الدليل المرجعي ماي 2011.

³ - وزارة التربية الوطنية، المذكرة 14/159 بتاريخ 25 نونبر 2014 في موضوع "أجراً الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة"، ص 1.

⁴ - وزارة التربية الوطنية، 1997، تكوين المديرين: كراسة التكوين الذاتي. ص 47

⁵ - وزارة التربية الوطنية، 1994، المذكرة رقم 73.

ومتكاملة، تنطلق من تشخيص الوضعية الحالية والوضعية المنشودة لتحسين التربية والتكوين بالمؤسسة، وتتألف هذه الخطة من أهداف وأعمال وأنشطة وموارد ووسائل تترابط فيما بينها لتحقيق الأهداف المبتغاة. يمكن تعريف مشروع المؤسسة المندمج بكونه مجموعة من العمليات المرتبطة والمتناسقة والمتكاملة، تتمحور حول هدف أو عدة أهداف يراد بها تحسين فعالية المؤسسة لجعل نتائجها متلائمة مع الأهداف الوطنية والجهوية. ويتم تحديد هذه العمليات بتشاور وتنسيق تأمين بين مختلف الفاعلين بالمؤسسة، وبين مختلف الفاعلين بالمؤسسة، وبين هذه الأخيرة ومحيطها. وتقتضي هذه العمليات عملا جماعيا وفق برنامج وجدولة زمنية محددة وتتبعها مستمرا، كما تخضع نتائجها للتقويم.

رابعاً: المبادئ الأساسية لـ "مشروع المؤسسة" ومركزاته ومجالاته وخصائصه

✓ مقتضيات المذكرة 087.21 المتعلقة بصياغة مشروع المؤسسة المندمج

- تركيز المشروع PEI على تحسين جودة التعلّمات، والارتقاء بأنشطة الحياة المدرسية؛
- اعتماد منهجية DEPART؛ وذلك ضماناً للتنزيل السليم للمشروع، وتحقيق الفعالية والنجاعة في التنزيل؛
- تنزيل المشروع PEI عبر برنامج عمل، ممتد على ثلاث سنوات، يتضمن مختلف العمليات التي تهدف إلى تجويد التعلّمات؛
- استهداف المداخل الرئيسة للجودة (الحياة المدرسية، الدعم المدرسي، التوجيه المهني والمدرسي، الدعم التربوي الاجتماعي والنفسي، التجهيزات البيداغوجية).

✓ مبادئ مشروع المؤسسة¹

- يقوم مشروع المؤسسة المندمج على المبادئ والمرتكزات التالية:
- حاجات المؤسسة هي منطلق أي تخطيط تربوي؛
- مشروع المؤسسة المندمج هي الآلية التي تجسد توجهات الوزارة، ومن جهة أخرى المرتكز الأساسي الذي يساهم في تحديد استراتيجيتها المستقبلية؛
- كل مؤسسة لها خصوصيات ينبغي أن تنعكس على مشروع المؤسسة؛
- مهما اختلفت الوسائل والأهداف فإن الغاية المشتركة لجميع مشاريع المؤسسة هي التحسين المستمر لجودة التعلّمات؛
- مشروع المؤسسة المندمج آلية للتدبير الشامل والمندمج للمؤسسة التعليمية، تجعل المتعلم المحور الأساس لجميع العمليات؛
- مشروع المؤسسة المندمج التزام مشترك بين المؤسسة التعليمية الملتزمة بتحقيق الأهداف وبين النيابة التي تلزم بتوفير الشروط الضرورية ومواكبتها لتجاوز الصعوبات؛
- مشروع المؤسسة المندمج استشراف المستقبل القريب، يقدم حلولاً للإشكالات القائمة على رؤية مستقبلية (3 سنوات على الأقل).

✓ منطلقات ومرجعيات بلورة مشروع المؤسسة المندمج

- اعتماد مقارنة مدمجة تستحضر أهداف مشاريع تنفيذ القانون الإطار 51.17؛

¹ - وزارة التربية الوطنية، الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، ملخص تركيبي، ماي 2011، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، جميعاً من أجل مدرسة النجاح 2009-2012، ص 6.

- اعتماد مقارنة تشاركية؛ من خلال إشراك كافة المتدخلين في مختلف عمليات إعداد وتنفيذ وتقويم المشروع؛
- اعتماد منهجية DEPART لدى إعداد المشروع؛
- الاستناد إلى القانون الإطار 51.17؛
- علاوة على الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030؛
- بالإضافة إلى مشروع الوثيقة المرجعية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17؛
- ثم المذكرة الوزارية رقم 159.14، الصادرة في 25 نونبر 2014، بشأن أجراء الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة؛
- وحافطة مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛
- والمذكرة الوزارية رقم 087.21، الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2021، في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج.

✓ النصوص التشريعية والتنظيمية لمشروع المؤسسة المندمج

- المرسوم رقم 2.20.475، الصادر في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليوز 2021) بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين؛
- المذكرة الوزارية رقم 078.21 بخصوص وضع برنامج العمل التربوي لإنجاح الموسم الدراسي 2021-2022؛
- المذكرة رقم 117.21، بتاريخ 29 شتنبر 2021، في شأن مستجدات النظم المعلوماتية الداعمة لمختلف العمليات الإدارية بمقرر السنة الدراسية 2021-2022.
- المذكرة رقم 084.21، بتاريخ 30 شتنبر 2021، في شأن إدماج أنشطة الحياة المدرسية في الزمن المدرسي؛
- المذكرة رقم 083.21 بتاريخ 30 شتنبر 2021 في شأن إرساء المجالس التلاميذية؛
- المذكرة رقم 015.22، بتاريخ 09 مارس 2022، في شأن تأطير دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة؛

✓ مرتكزات "مشروع المؤسسة"¹

يرتكز مشروع المؤسسة المندمج على عدة مرتكزات:

¹ - وزارة التربية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، الدليل المرجعي، ماي 2011، ص، 5 و 6.

- الشمولية: المشروع خطة شمولية جامعة لكل الأعمال التي تبرمجها المؤسسة وتنجزها بتعاون مع شركائها؛
- التكامل والانسجام: فهو يستحضر التمفصلات بين مشاريع الإصلاح إضافة إلى إمكانية التدخل لكل الفاعلين؛
- الوظيفية: اعتماد أنشطة ملائمة وقابلة للإنجاز وقادرة على تحسين المؤشرات؛
- الانفتاح: مد جسور التعاون بين العاملين داخل المؤسسة وبين المؤسسة ومؤسسات الحوض المدرسي أو المنطقة التربوية؛
- التشارك: تجاوز التدبير الفردي للمشروع؛ فالمشروع الموفق يعتمد المقاربة التشاركية والحوار المفتوح عبر كافة المراحل؛
- الدينامية: المشروع الموفق يتصف بخصائص تدعم إقبال المتعلمين والأساتذة والشركاء على الانخراط فيه، وتجعلهم حريصين على إنجاحه؛
- التوثيق وإعداد تقارير وبطاقات تقنية حول مختلف مراحل المشروع بهدف تقاسم التجارب واستثمارها.

✓ مجالات مشروع المؤسسة¹

إذا رجعنا إلى مجموع الأدبيات والوثائق، نجد أن مشروع المؤسسة المندمج يتناول عادة مجالات تديرية وبيداغوجية وتربوية متنوعة في إطار خطة متناسقة تمنح الانسجام لمكونات المشروع، وتجعلها مترابطة في خدمة أهداف المشروع. ومن أهم هذه المجالات:

- الدعم البيداغوجي للمتعلمين المحتاجين للدعم؛
- الأنشطة المدرسية الموازية وأنشطة التفتح؛
- الرفع من جودة التربية والتكوين بإحداث أو تطوير المكتبات المدرسية لاستثمارها في التعليم والتثقيف؛
- تحسين مرافق المؤسسة وتجهيزها بالوسائل والمعدات لتوفير الظروف المواتية للتعليم والتعلم والتكوين؛
- انفتاح المؤسسة على محيطها عن طريق تبادل الخدمات أو اتفاقات للشراكة؛
- دعم إشعاع المؤسسة باستضافة العروض الثقافية والفنية والعلمية وتقديم خدمات للسكان؛
- التكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو لشركائها.

وتقدم مذكرات التجديد التربوي، ومرسوم 17 يوليو 2002، والميثاق الوطني مقتضيات ترسي الإطار المؤسسي للمشروع، نقتصر منها على مقتطفات توجيهية لمشروع المؤسسة المندمج وللقسم من المنهاج المحلي الذي تعده المدرسة للدعم البيداغوجي أو لأنشطة مدرسية موازية وأنشطة للتفتح، انطلاقاً من الميثاق:

¹ - وزارة التربية الوطنية (2004)، مجزوءة تدير مشروع المؤسسة، دليل المدير(ة)، ص 29.

- انفتاح المدرسة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة ... مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضاءها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي" (الفقرة ب من المادة 9)
- تعزيز كل تكوين مدرسي أكاديمي أو نظري بجانب عملي معزز تتحدد سبله كما يلي: تدعيم الأشغال اليدوية والأنشطة التطبيقية في جميع مستويات التعليم...، وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على عالم الشغل والثقافة والفن والرياضة والبحث العلمي والتقني (المادة 40).
- تعاون مؤسسات التربية والتكوين مع المؤسسات العمومية والخاصة التي بإمكانها الإسهام في تدعيم الجانب التطبيقي للتعليم، وتنظيم أنشطة تربوية وتكوينية (كتجريب منتجات، أو خدمات، أو تجهيزات، أو طرائق تكنولوجية، أو إبداع وعرض أعمال مسرحية، أو موسيقية، أو تشكيلية، أو غير ذلك) (المادة 48).

4. خصائص المشروع الجيد¹

- < التعبير عن الحاجات والخصوصيات المحلية للمؤسسة ومحيطها: المشروع ينبغي على منظور شامل لرسالة المؤسسة وتشخيص وضعيتها الحالية والوضعية التي تنشأ الوصول إليها، انطلاقاً من حاجات وخصوصيات كل من المتعلمين والمؤسسة والشركاء.
- < تفعيل التدبير المحلي للتربية والتكوين: المشروع يحول المدرسة من مجرد وسيط للتنفيذ إلى مؤسسة مبادرة تساهم في التجديد والتغيير والإصلاح في إطار من التوافق والتكامل بين الوطني والجهوي والمحلي.
- < الانسجام بين مختلف الأنشطة والممارسات التربوية للمؤسسة: المشروع خطة رابطة تحقق الانسجام بين الأعمال والأنشطة التي تنجزها المؤسسة.
- < الاستمرارية: المشروع خطة مستمرة تتضمن مراحل وأعمالاً وأنشطة متوالية تستند إلى التخطيط والبرمجة والتنظيم، وليس نشاطاً ظرفياً أو موسمياً يظهر أو يختفي حسب الظروف والمناسبات.
- < الشمولية: المشروع خطة شمولية جامعة لكل الأعمال التي تبرمجها المؤسسة وتنجزها بالتعاون مع شركائها.
- < القيادة الفعالة: المشروع موفق يتطلب مديراً مدبراً يقدم القدوة الحسنة للمساهمين والمعنيين في الاقتناع بالمشروع، والانخراط في أعماله، والتواصل، والتنشيط، والتنظيم، والتتبع، والتفويض.
- < تقوية الشعور بالانتماء إلى المؤسسة: المشروع ينبغي روح الفريق والانتماء إلى المؤسسة لدى كافة المساهمين والمعنيين بالمشروع من متعلمين ومدير وأساتذة وآباء وشركاء، ويعزز انخراطهم في أعماله.
- < تفعيل المقاربة التشاركية: المشروع موفق يعتمد المقاربة التشاركية والحوار المفتوح عبر كافة المراحل.
- < تفعيل مبدأ التراضي: المشروع يفعل مبادئ التراضي والتوافق، وأساليب الاستشارة، والإقناع، والاقتناع.

¹ - الطاهري، 1997، والدريج 1999، وObin et Cros، 1998. - بتصرف

- « القدرة على استقطاب العاملين في المؤسسة والشركاء: المشروع موفق يتصف بخصائص تدعم إقبال المتعلمين والأساتذة والشركاء على الانخراط فيه، وتجعلهم حريصين على إنجاحه.
- « التدبير بالأهداف والنتائج: المشروع يتيح للمؤسسة الانتقال من التدبير بالمساطر والإجراءات الشكلية إلى العمل بالمقاربات الحديثة في التدبير عن طريق التدبير بالمشاريع الذي يتطلب التدبير بالأهداف أو النتائج القابلة للقياس والتقييم وتحديد مدى الفعالية.
- « الواقعية: المشروع الناجح يجمع بين الطموح والواقعية، ويراعي الأولويات والموارد البشرية والمادية والمالية للمؤسسة ولشركائها المنخرطين معها.

خامسا: كرونولوجيا إرساء مشروع المؤسسة المندمج

يندرج العمل بمشروع المؤسسة المندمج في إطار تفعيل الوزارة لمبدأي اللامركزية واللامركز، من خلال إرساء نموذج جديد لتدبير المؤسسات التعليمية. وقد مر العمل بمشروع المؤسسة المندمج منذ اعتماده في المنظومة التربوية بمجموعة من المراحل، عكست تطور المفهوم كما عكست متطلبات التنزيل ومحاولة التأقلم مع البيئة الميدانية المدرسية المغربية ويمكن تقسم تلك المراحل إلى:

المرحلة الأولى:

مرحلة التجريب وتمتد من 1994 إلى 2007. شكلت سنة 1994 بداية تنزيل فكرة مشروع المؤسسة، وذلك من خلال المذكرة الوزارية رقم 73 الصادرة بتاريخ 12 أبريل 1994، ثم المذكرة الوزارية رقم 27 بتاريخ 24 فبراير 1995. ليتم بعد ذلك تكريس هذا الطرح في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ثم المذكرة رقم 76 بتاريخ 09 يونيو 2005 في شأن مشاريع المؤسسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المرحلة الثانية:

مرحلة التعميم والتوطيد التدريجي بالمؤسسات والتي امتدت من 2008 إلى 2010. شكل خلال هذه المرحلة مشروع المؤسسة المندمج وعاء وأداة أساسية لتفعيل وتنزيل مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي بالمؤسسات التعليمية، وهو ما يتضح من خلال إدراج عدد من البنود ومجموعة من المشاريع والإصلاحات، وإصدار مجموعة من المذكرات منها المذكرة الوزارية رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 حول إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح (لتأمين تمويل مشروع المؤسسة المندمج من خلال منحة الأكاديمية لجمعية مدرسة النجاح). والمذكرة الوزارية رقم 121 بتاريخ 31 غشت 2009 حول مشروع المؤسسة. وابتداء من 2010/2011 تم اعتبار مشروع المؤسسة المندمج آلية رئيسية لتدبير وتنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي باعتماد تقنية (Diagnostique Court Appliqué DCA) التشخيص القصير المطبق، التي صممها المعهد الفرنكفوني للدراسات والتحليل النظري IFEAS ببلجيكا. وهذه الأداة توفر نموذجا شاملا وإجرائيا يتيح القيام بعملية

التخطيط الاستراتيجي في وقت قصير وبشكل عملي بناء على تشخيص دقيق لنقاط القوة ونقاط الضعف في المؤسسة. لكن اتضحت صعوبات جمة خلال تنزيلها.

المرحلة الثالثة:

مرحلة التحسين والتطوير وقد تم ذلك عبر استراتيجية وطنية وعدة متكاملة منها المذكرة 36 بتاريخ 21 مارس 2011 والمذكرة الوزارية رقم 125 بتاريخ فاتح شتنبر 2011 حول الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة المندمج في موضوع الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة المندمج (في إطار مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية المغربية (PAGESM) وهي من بين أهم المراحل. ومن بين أهم ما تحقق خلالها هو وضع آليات وتدابير مساعدة، وتقوية قدرات مختلف الفاعلين.

• المرحلة الراهنة:

2.1- قراءة تركيبية لأهم الوثائق الرسمية الراهنة الخاصة بمشروع المؤسسة

لن نجعل هنا من المرجعيات الرسمية الراهنة لمشروع المؤسسة المندمج ومحتوياتها موضوعا للشرح والتبليغ، وإنما سنجعلها وثائق للعمل والفحص والاستثمار في مواقف وأنشطة تطبيقية تستحضر تجارب الأطر الإدارية المتدربة وخبراتهم في مجال مشروع المؤسسة، نقتصر منها على مقتطفات توجيهية لمشروع. وسنتطرق في هذا الباب إلى ما ورد في القانون الإطار 51.17، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والمذكرة 14/159 حول أجراة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة.

❖ مشروع المؤسسة المندمج في القانون الإطار:

خُصصت المادة الثانية من القانون الإطار 51.17 لشرح بعض المصطلحات وإعطائها مدلولاً خاصاً. من المصطلحات العشر التي يقدم القانون الإطار تعريفاً خاصاً لها، مصطلح مشروع المؤسسة، وهو مصطلح يدل على الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التربوية والتدبيرية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجراة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها. كما تبرز أهمية تبني مشروع المؤسسة المندمج من خلال دعوة المادة 40، من الباب السابع من القانون الإطار المتعلق بمبادئ وقواعد حكمة منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، السلطات العمومية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، باعتماد مشروع المؤسسة المندمج أساساً لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع.

يمكن تقسيم ما ورد في القانون الإطار بخصوص مشروع المؤسسة المندمج إلى ثلاث أبعاد أساسية:

- البعد المنهجي: أي تبني منهجية العمل بالمشروع واعتبارها آلية للتدبير الناجع للمؤسسة، وأداة لأجراة السياسات التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم. وذلك عبر استثمار كل ما راكمته المنظومة في هذا المجال

منذ صدور أول المذكرات في هذا الشأن (المذكرة 73 بتاريخ 12 أبريل 1994 ثم المذكرة 27 بتاريخ 24 فبراير 1995). بعد إجراء تقييم شامل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة المندمج على كل مستويات المنظومة التربوية، خلصت الوزارة الوصية إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

- ضرورة نشر الوعي بثقافة المشروع لدى مختلف الفاعلين التربويين والشركاء، ودورها في تنزيل وأجراة البرامج والمشاريع التربوية الوطنية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم؛
- التقليل من الخطوات اللازمة لإعداد مشروع المؤسسة المندمج وتبسيطها ثم التركيز على الظروف التي من شأنها أن تعزز انخراط الأساتذة؛
- إنشاء فضاء للتقاسم والتعاون بين مديري المؤسسات التعليمية (جماعات الممارسات المهنية) ...

وعلى إثر نشر القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ودخوله حيز التنفيذ (الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 09 غشت 2019) اتخذت الوزارة التدابير الضرورية لتفعيل أحكام هذا القانون عبر منهجية تركز على استثمار التراكم الإيجابي الذي عرفته المنظومة في مجال العمل بمقاربة المشروع كما تم تصريف هذه المنهجية من خلال تحيين الإطار المنطقي الخاص بكل مشروع من مشاريع تفعيل القانون الإطار. ومن أهداف مشروع المؤسسة المندمج على المستوى المنهجي تنظيم عمل المؤسسة من خلال خطة عمل تنبني على مؤشرات، وتدابير للإنجاز، والتتبع، والتقييم. والتعرف على الواقع التربوي للمؤسسة التعليمية من خلال تشخيص منهجي وإشراك مختلف الأطراف بهدف تحسين الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة وترصيد الممارسات الجيدة.

إن تبني منهجية المشروع تقوم بالأساس على الإيمان بفكرة المشروع كنمط اشتغال على المستويين الفردي والجماعي.

مجال الحكامة: تدل الحكامة في معناها العام على حسن التدبير كما تحيل على اللاتمرکز في اتخاذ القرارات، وعلى حكم القانون والشفافية ومبادئ الشراكة. نقصد هنا حكمة مشروع المؤسسة المندمج وعلاقته بحكمة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي يجب أن تتسم بتحفيز أكبر وبالتشجيع على المبادرة وهذا ما تدعو إليه المادة 40 من القانون الإطار 51.17، أي ضرورة اتخاذ السلطات العمومية التدابير اللازمة لإرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم باعتماد مشروع المؤسسة المندمج أساسا لتحقيق الاستقلالية؛ وذلك في انسجام تام مع توجهات الدولة، التي تدعو إلى ترسيخ التدبير الديمقراطي للمرفق العمومي على قاعدة اللامركزية واللاترکز.


لقد اختارت مجموعة من الدول مدخل إصلاح تدبير المؤسسات التعليمية عن طريق تمثيع المؤسسة، في شخص مديرها بصلاحيات في اتخاذ القرارات الإدارية والتربوية، فأصبحت المؤسسة التعليمية شبه مستقلة في تدبير شؤونها. حتى أنه في بعض التجارب التربوية يرقى مدير المؤسسة إلى تمثيل الدولة. ويحظى بمكانة رمزية مهمة في المجتمع. في هذه التجارب تتعاقد السلطات التربوية ومدير المؤسسة على مشروع تربوي يكون محك

النجاح في المهمة أو الفشل فيها.¹ إن إعادة النظر في وضعية المؤسسة التعليمية في نظامنا التعليمي وتحديث الإدارة التربوية والارتقاء بمكانة المؤسسة التعليمية ومأسسة العمل بالمشروع التربوي تعد فعلا مداخلنا منسجما مع الرؤية الجديدة لإصلاح منظومة التربية والتعليم.

إن لكل مؤسسة واقعها وتحدياتها، قوتها وحاجياتها، أولوياتها ومشاكلها؛ ويقتضي مشروع المؤسسة المندمج تعاقدًا يربط المؤسسة بباقي مكونات المنظومة وهذا ما استدعى منح المؤسسة نوعا من الاستقلالية وتوفير الوسائل المادية والبشرية. مع تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين في مشروع المؤسسة، وتحقيق مشروع مؤسسة مندمج ومنفتح على محيط المؤسسة عبر إشراك المؤسسات الاجتماعية من أسر وجمعيات مدنية ثقافية وتنموية وحقوقية ومؤسسات إنتاجية في بلورة المشروع. فالمشروع يحول المدرسة من مجرد وسيط للتنفيذ إلى مؤسسة مُبادرة تساهم في التجديد والتغيير والإصلاح في إطار من التوافق والتكامل بين الوطني والجهوي والمحلي، في سبيل إرساء الحكامة التربوية الجيدة المنشودة.

- مجالات الخدمات والأوراش المستهدفة: ونقصد بها مضمون وأنشطة ومختلف الخدمات التي يجب أن يقدمها مشروع المؤسسة المندمج بالإضافة إلى الجانب الأساسي المتعلق بالتعليمات. فمدلول مشروع المؤسسة، حسب ما ورد في القانون الإطار، يحيل إلى الآلية العملية الضرورية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم لجميع المتعلمين، هكذا تم تحديد مجال التدخل الأساسي اعتمادا على المعيار الأول المتعلق بالبعد التربوي والتعليمات خاصة. بالإضافة إلى تنمية المشاريع التربوية الموجهة للتلاميذ في إطار مشروع المؤسسة المندمج والمتعلقة بأنشطة بيئية أو ثقافية أو أنشطة الاكتشاف والبحث والإعلام. بالإضافة إلى ذلك تم اعتبار مشروع المؤسسة المندمج آلية جامعة وإطار منهجي في التدبير وأداة لأجراة المشاريع والسياسات التربوية وأوراش الإصلاح المفتوحة داخل المؤسسة مع مراعات الخصوصيات المحلية. ومن تلك الأوراش التي يمكن إدراجها في مشروع المؤسسة المندمج ورش التربية الدامجة وورش التعليم الأولي وورش الدعم الاجتماعي وورش الارتقاء باللغات وورش التوجيه المدرسي وورش حفز التفوق والنبوغ وورش الارتقاء بالرياضة المدرسية وورش إحداث المسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي وإرساء المسالك الدولية بالتعليم الإعدادي وورش التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية وجعله وظيفة منتظمة وورش تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة العمومية. كل ذلك بعد دراسة سبل إدماج كل ورش من الأوراش السالفة في مشروع المؤسسة. ومن شأن ذلك المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية مع مراعاة الفروق بين المتعلمين وواقع المدرسة والمحيط عبر التعبير عن الإرادة التربوية المحلية في الاستجابة لحاجات المتعلمين وشركاء المدرسة.

¹ - عبد الإله زيداني وآخرون، وجهة نظر الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب حول الإدارة التربوية ومشروع المؤسسة، دفاتر التربية والتكوين، منشورات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، العدد 11، سنة 2014، ص 127.

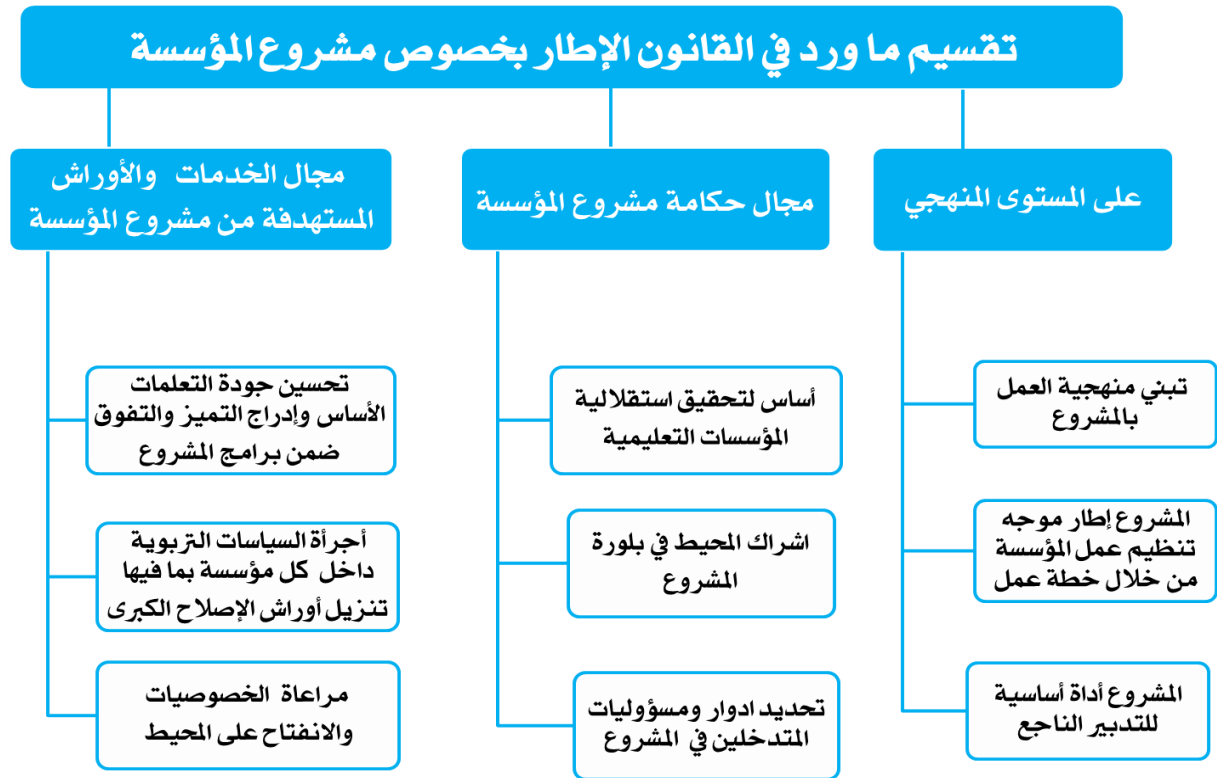

❖ مشروع المؤسسة المندمج في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030

أكدت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 على الدور المحوري لمشروع المؤسسة المندمج وعلى ضرورة توسيعه مفهوما ومنهجيا وممارسة إلى أقصى حد يمكن من استيعاب ضرورات الإصلاح ومتطلباته¹. وذلك عبر توفير قدرات تديرية ناجعة قادرة على تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج في إطار استقلالية مؤسسات التربية والتكوين، تفعيلا لمبدأ اللاتمرکز واللامركزية، ضمن توجهات الجهوية المتقدمة². ولحكمة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين، دعت الرؤية الاستراتيجية إلى مأسسة مشروع المؤسسة، مع تحديد دور كل طرف واستكمال اللامركزية واللاتمرکز من خلال إرساء استقلالية المؤسسة بوصفها الخلية الأساسية للمدرسة، وذلك باعتماد مشروع المؤسسة المندمج أساسا لتنميتها المستمرة وتديرها الناجع³.

وفيما يخص الشأن البيداغوجي فإن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 اعتبرت مؤسسة التربية والتكوين نواة أساسية في الفعل التربوي، ذات مشروع متكامل منفتح على المحيط ومتفاعل معه وهو أساس لتطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار⁴. ويعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين

¹ - المجلس الأعلى للتربية والتكوين، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، الرافعة 22، ص 66.

² - نفسه، الرافعة 23، ص 70.

³ - نفسه، الرافعة 15، ص 46.

⁴ - نفسه، الرافعة 12، ص 34.

التأثير: جعل الغاية المشتركة لجميع مشاريع المؤسسات هي التحسين المستمر لجودة التعليمات، ولكي يكون لمشروع المؤسسة المندمج نتائج ملموسة، لا بد وأن ترتبط كل إجراءاته بشكل مباشر بتعليمات التلاميذ.

وفي الشق الخاص بالتدبير، أتت المذكرة 14/159 بتوجيهات استراتيجية جديدة لإرساء بنيات الحكامة المرتبطة بتدبير مشروع المؤسسة، والتي ستضطلع بمسؤوليات الإشراف والتنفيذ والتقويم على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني. كما حددت المذكرة آلية تتبع وتقويم مشروع المؤسسات على كل مستويات المنظومة، عبر رصد تطور مجموعة من المؤشرات المرجعية، واعتمادها مؤشرات مستهدفة أثناء انجاز المشاريع ليسهل قياس تطورها. وقد أرفقت المذكرة بعدة مهمة لمشروع المؤسسة المندمج تتكون من:

- دليل منهجي لتدبير وقيادة مشروع المؤسسة؛
- دليل المساطر الإدارية لمشروع المؤسسة؛
- دليل المساطر المالية لجمعية دعم مدرسة النجاح؛
- دليل إرساء جماعات الممارسات المهنية؛
- مطوية تعريفية لخدمة المواكبة الميدانية.
- المذكرة 087.21 بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في شأن تعميم مشروع المؤسسة المندمج.

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة بتاريخ 06 أكتوبر 2021 تحت رقم 087/21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج، وتدعوا فيها السيدات مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى الإسراع بإعداد مشاريع مؤسساتهم التعليمية وإرسالها من أجل إخضاعها للمصادقة من طرف لجنة القيادة الإقليمية قبل منتصف أكتوبر مع تحديد أهم العناصر التي يجب التركيز عليها في صياغة هذه المشاريع:

- تركيز المشروع على تحسين جودة التعليمات لجميع المتعلمين والمتعلمات والارتقاء بأنشطة الحياة المدرسية.

- اعتماد منهجية DEPART وذلك ضمانا للتنزيل السليم للمشروع وتحقيق الفعالية والنجاعة في تنزيله.
- تنزيل المشروع عبر برنامج عمل لثلاث سنوات يتضمن مختلف العمليات التي تروم تجويد التعليمات
- استهداف ما أسمته المذكرة المداخل الرئيسية للجودة (الحياة المدرسية-الدعم المدرسي-التوجيه المهني والمدرسي-الدعم التربوي والاجتماعي والنفسي-التجهيزات البيداغوجية) كمجالات رئيسية للمشروع.

2- المذكورة 47*20 مرجع سابق، ص 4 و المرفق رقم 3. كما يمكن الاطلاع على مصفوفة وثيقة الإطار المنطقي بالنسبة لكل مشروع الصادرة عن الاجتماع الثالث للكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتبني ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 15 يناير 2021.

ب) عناصر الأجراء

الهدف الخاص 1: تعميم تعليم أولي منصف ودامج

الرقم	النتائج	التدابير	العمليات	الجدولة الزمنية التوقعية
1	تشجيع الطلب على التعليم الأولي	تسجيل الأطفال بالتعليم الأولي	القيام بحملات تحسيسية بأهمية التعليم الأولي.	2019-2025
			تسجيل الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بمنظومة مسار.	
		إحصاء أطفال التعليم الأولي	وضع واعتماد تسميات وتصنيف موحد لأنواع التعليم الأولي.	2021-2020
			القيام بإحصاء سنوي لأطفال التعليم الأولي حسب كل نوع وحسب كل متدخل.	2019-2025
		دمج الأطفال في وضعية خاصة في التعليم الأولي	إعداد دلائل لإدماج أطفال في وضعية خاصة بالتعليم الأولي.	2020-2022

ج) خارطة المخاطر وإجراءات التخفيف منها

الخطر	احتمال حدوث الخطر (قوي / متوسط / ضعيف)	تأثيره على المشروع (قوي / متوسط / ضعيف)	إجراءات التخفيف من حدوث الخطر أو من تأثيره
نقص في تعبئة الموارد المالية لتزويل المشروع	متوسط	قوي	- مراجعة وتيرة تعميم التعليم الأولي مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المرصودة من ميزانية الدولة وتلك المتاحة من الشراكات المفضلة
صعوبة تعبئة مربيات ومربين مؤهلين ومتوفرين على الشروط القانونية وعدم استقرارهم	قوي	قوي	- وضع تصور واضح للمسار المهني لمهنة مربيات ومربي التعليم الأولي - وضع إطار قانوني لمهنة مربيات ومربي التعليم الأولي - وضع نظام المصادقة على المكتسبات المهنية
عدم انخراط الشركاء وعدم الوفاء بالتزاماتهم	قوي	قوي	- تعبئة موارد إضافية لتعويض النقص الناتج عن عدم وفاء الشركاء
صعوبة استقطاب الفتيات في الوسط القروي	متوسط	قوي	- تكثيف الحملات التحسيسية وخلق نظام للدعم الاجتماعي لهذه الفئة
تقديم تعليم أولي لا يتوفر على الجودة المطلوبة	قوي	قوي	- تكثيف التأطير والمراقبة - تقوية دورات التكوين المستمر للرفع من قدرات المربيات والمربين. - وضع نظام لتقييم الجودة

(د) مؤشرات التتبع

مؤشرات التتبع	النتائج	رت
نسبة التمددس بالتعليم الأولي 4-5 سنوات بكل أنواعه عدد الأطفال في وضعيات خاصة مسجلين بالتعليم الأولي	تشجيع الطلب على التعليم الأولي	1
عدد أقسام التعليم الأولي بكل أنواعه (العمومي، الخصوصي، التقليدي) عدد الحجرات الإضافية المحدثه (من ميزانية الأكاديمية ومن طرف الشركاء)	توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي	2
عدد المربيات والمربين بأقسام التعليم الأولي بكل أنواعه عدد المربيات والمربين المستفيدين من دورات التكوين عدد مراكز الموارد المفتحة	الرفع من القدرات المهنية للموارد البشرية	3
حصة التعليم الأولي التقليدي من مجموع الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي	تأهيل التعليم الأولي التقليدي	4
عدد بنيات التعليم الأولي التي خضعت لتقييم جودتها	تقييم جودة التعليم الأولي	5
عدد البرامج الجهوية لتعميم وتطوير التعليم الأولي المحينة والمصادق عليها عدد التقارير المنجزة والمصادق عليها	الرفع من نجاعة تدبير البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي	6
عدد الموارد البشرية المشرفة على تدبير مجال التعليم الأولي (مركزيا، جهويا، إقليميا)	تعزيز وتقوية القدرات التديرية للبنيات العاملة في مجال التعليم الأولي مركزيا و جهويا وإقليميا	7
عدد الشراكات المبرمة في مجال التعليم الأولي (مركزيا، جهويا، إقليميا)	تقوية الشراكات في مجال التعليم الأولي	8
عدد النصوص القانونية والتنظيمية المنجزة	وضع وتعديل النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعليم الأولي	9

1. مفهوم الإطار المنطقي لمشروع المؤسسة المندمج ومكوناته.

الهدف من هذا المحور هو التعرف على أسلوب إطار العمل المنطقي في تخطيط مشاريع المؤسسة من خلال الوقوف على مفهوم ونشأة الإطار المنطقي (le cadre logique) وتحديد خصائصه ونموذج لتطبيقه¹.

1.1- تعريف الإطار المنطقي:

يُعرّف الإطار المنطقي بأنه أداة التحليل المنطقي والتفكير المنظم من أجل تخطيط المشاريع وإنشاء التسلسل الهرمي المنطقي من الأهداف والوسائل، التي سيتم من خلالها تحقيق الأهداف، وتحديد النتائج المنتظرة وتحديد ماهية المخرجات ورصدها وتقييمها من خلال مؤشرات محددة سلفا. فمصفوفة الإطار المنطقي عبارة عن ملخص للمشروع في شكل موحد، ورصد للمشاريع واستعراض لها أثناء التنفيذ.

تعاريف النموذج (الإطار) المنطقي: يوجد العديد من التعريفات للإطار أو النموذج المنطقي، من أبرزها²: «تمثيل تخطيطي مبسط للتسلسل المنطقي والعلاقات السببية بين النتائج والتغييرات التي يرغب البرنامج

¹-يمكن الرجوع إلى المرجعين التاليين :

* François Giovalucchi, Jean-Pierre Olivier de Sardan, Armand Colin « Revue Tiers Monde » planification, gestion et politique dans l'aide au développement : le cadre logique, outil et miroir des développeurs (Article disponible en ligne à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-2-page-383.htm>)

* السيد علي السيد جمعة، استخدام أسلوب إطار العمل المنطقي في تخطيط المشاريع التربوية، ضمن دراسات تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية جامعة الزقازيق، العدد 99، 2018، ص 1-66.

² - البنك الدولي، دليل المتابعة والتقييم المستجيب للنوع الاجتماعي، الجندر، ص 20-22.

إنجازها والأنشطة التي يتم التخطيط لعملها والمصادر التي يجب أن تمتلكها إدارة البرنامج». «طريقة منظمة وبصرية لتقديم وعرض الآلية التي توضح فهمنا للعلاقات بين الموارد المتوافرة لتشغيل البرنامج وتنفيذه، والأنشطة التي تم التخطيط لعملها، والتغيرات والنتائج التي يتوخى البرنامج إنجازها. «نموذج مبسط يعكس تصورنا لكيفية مساهمة الأنشطة في سلسلة المخرجات المطلوبة وفي النتائج النهائية؛ الأمر الذي يساعد في عملية التخطيط والتنفيذ وفي المتابعة والتقييم (للمشروع، أو البرنامج، أو الاستراتيجية»

1.2- مكونات النموذج المنطقي¹:

تتألف معظم أنواع الأطر المنطقية من المكونات التالية:

- المصادر/ الموارد/ المدخلات :ويقصد بها الموارد البشرية، المالية، المؤسسية،
- الموارد المجتمعية، التي نحتاج لتوظيفها واستثمارها في البرنامج، كي يكون قادرا على إنجاز الأنشطة المخطط لها وتحقيق أهداف البرنامج.
- الأنشطة : وهي عبارة عن مختلف الفعاليات والعمليات والإجراءات والجهود القصدية التي يتم بذلها باستخدام الموارد المتوافرة؛ لإحداث التغيرات المطلوبة وتحقيق أهداف البرنامج.
- المخرجات : وتشير إلى المعطيات التي ترتبط مباشرة بأنشطة البرنامج، والتي تبرهن بدورها على تنفيذ البرنامج، ويتم قياسها عادة عن طريق وحدات كمية تتصل بطبيعة النشاط الذي تم تنفيذه، مثل : عدد الصفوف التعليمية التي تم تعريضها لبرنامج معين؛ عدد الاجتماعات التي تم عقدها؛ عدد الكتيبات التي تم توزيعها؛ عدد الإعلانات التي تم نشرها في التلفاز أو الصحف؛ عدد الأشخاص الذين استفادوا من البرنامج؛ عدد الذين حضروا الاجتماعات؛ عدد الذين تسلموا النشرات والمواد المكتوبة...الخ
- النتائج : وتشير إلى التغيرات المحددة التي نجمت عن تطبيق البرنامج على المدى القصير والمتوسط والبعيد في معارف المشاركين في البرنامج وسلوكهم ومهاراتهم وأوضاعهم، على سبيل المثال : التغيرات في المعرفة والإدراك، أو السلوك، أو الشعور أو الحالة. وفي الغالب، فإن البرنامج يبرز سلسلة النتائج بحيث تكون مترابطة معا ضمن تسلسل منطقي عبر الزمن، بحيث أن النتائج قصيرة الأمد تقود إلى النتائج متوسطة المدى، والتي تقود بدورها إلى النتائج طويلة الأمد.
- الآثار بعيدة المدى : وتشير إلى التغيرات المخطط وغير المخطط لها، التي تظهر على المستوى المؤسسي والمجتمعي كنتيجة لتطبيق البرنامج بعد سنوات عديدة.
- الافتراضات والقيم والمعتقدات الضمنية التي تؤثر على تصميم البرنامج وتنفيذه.

1.3- أنواع النموذج المنطقي²:

النموذج المنطقي البسيط: يصف المدخلات، العمليات، النتائج قصيرة المدى وطويلة المدى.

¹ -نفسه

² -المرجع السابق.

النموذج المنطقي المعقد: يتضمن سلسلة من المخرجات ومجموعة من المسارات السببية، وعناصر من التغذية الراجعة، وتأثيرات العوامل الأخرى والسياق، والنتائج غير المخطط لها.

1.3.1- نشأة الإطار المنطقي:

تم تطوير ما يسمى بالإطار المنطقي عام 1969 لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وأصبح الإطار المنطقي بعد ذلك مستعمل من طرف كل وكالات ومؤسسات التنمية العالمية لبلورة ورصد وتقييم مشاريع التنمية. وأضحى المرجعية الرئيسية في معظم مهام وأعمال البنك الدولي والأداة المعيارية المطلوبة لإعداد المشاريع الخاصة بالبنك. ومن ثم يتضح أن أسلوب الإطار المنطقي نشأ في المجال الاقتصادي؛ وخاصة في مجال التنمية، إذ إن جل الهيئات المانحة اشتربت استخدام هذا الأسلوب لتخطيط المشاريع التي تمويلها وتنفذها. بمرور الوقت أصبح أداة إلزامية للاستفادة من تمويلات مشاريع التنمية، فالجهات المانحة والشركاء من دول الجنوب والمنظمات غير الحكومية يجب أن تقدم المشاريع على شكل إطار منطقي يبرز الهدف النهائي والأهداف الخاصة أو المرحلية ثم وسائل وشروط الإنجاز ومؤشرات تحقيق النتائج المنتظرة من المشروع، هكذا أصبح الإطار المنطقي أحد الأساليب الرئيسية للثقافة المهنية العالمية لوكالات ومؤسسات التنمية. وقد تم نقل أسلوب الإطار المنطقي إلى الحقل التربوي وتبنيه كوسيلة ناجعة لتخطيط المشاريع التربوية.

1.3.2- نموذج مصفوفة الإطار المنطقي لمشروع المؤسسة:

تتكون مصفوفة الإطار المنطقي من أعمدة وأسطر والتي تلخص العناصر الرئيسية للمشروع. وقد اقترحت وثيقة صادرة عن مديرية الحياة المدرسية بتعاون تقني ياباني¹ مصفوفة يمكن اعتماد مكوناتها لبناء إطار منطقي لمشروع المؤسسة:

المنظور المحلي	الأولويات	الأهداف	الإجراءات	المتدخلون	النتائج المنتظرة	المؤشرات	التكلفة	سنة الإنجاز
								1 2 3

وبما أن الأصل في التخطيط هو التحديد الدقيق للأهداف ووضوحها، نشير هنا إلى إمكانية إضافة أعمدة أخرى إلى المصفوفة أعلاه، خصوصاً إذا تمت بلورة أهداف خاصة أو أهداف إجرائية لمزيد من التفصيل والتدقيق.

¹ - مديرية الحياة المدرسية، تفعيل مشروع المؤسسة دليل عملي من أجل الارتقاء بالتربية عبر تحقيق الإنصاف والجودة. الرباط. 2018، ص 16.

المحور الثاني: مراحل إعداد مشروع المؤسسة المندمج

أولاً: تشكيل فريق فعال لقيادة مشروع المؤسسة

1. القيادة التربوية

لتقديم لمحة عامة عن نظريات القيادة في التعليم، لا بد من تقديم تعريف للقيادة أولاً. إلا أن تعريفها بشكل لا لبس فيه ليس بالأمر السهل حيث لا يوجد تعريف متفق عليه متاح في الأدبيات. تتطرق جل الأبحاث التي أجريت حول القيادة إلى تعريفها بطرق مختلفة. الافتراض الذي تشترك فيه معظم هذه التعريفات هو أن القيادة هي "عملية التأثير التي يمارس فيها **الفرد** تأثيراً مقصوداً على الآخرين لهيكله الأنشطة والعلاقات في مجموعة أو منظمة (يوكل، 2002)". يؤكد بوش وجلوfer (2003) على أن استخدام الفرد يجب أن يُنظر إليه من منظور أوسع. في التعليم، إذ يمكن أن تمارس القيادة من قبل الفرق وكذلك الأفراد (Bush & Glover، 2003).

ما يظهر في التعريفات المختلفة للقيادة في التعليم هو التركيز بشكل خاص على العملية الأساسية وأهداف التعليم والتعلم ونتائج المتعلمين (f.iBush & Glover، 2003؛ Devos & Bouckennooghe، 2009؛ Grissom، 2011) على الرغم من أن دراسات القيادة في التعليم غالباً ما يتم انتقادها لتركيزها فقط على النتائج المعرفية للمتعلمين (Devos & Bouckennooghe، 2009). يقترح بوش وجلوfer تعريفاً للقيادة المدرسية وتلخيصها فيما يلي: يمكن فهم القيادة على أنها سيرورة تأثير تستند إلى قيم ومعتقدات واضحة؛ تسعى إلى تشكيل "**رؤية**" للمدرسة. لكسب التزام المتدخلين والشركاء بتحقيق مستقبل أفضل للمدرسة متعلميها. (Bush & Glover، 2003)، بالإضافة إلى ذلك، اقترح (Bush and Glover (2003) ثلاثة أبعاد للقيادة:

- القيادة هي عملية تأثير لهيكل وتنظيم العمليات في المؤسسة.

- ترتبط القيادة بالقيم التنظيمية وإلزام الأفراد بهذه القيم

- الرؤية هي سمة أساسية للقيادة الفعالة.

1.1- بعض نظريات القيادة التربوية

القيادة التعليمية وقيادة الموقفية وقيادة التغيير والقيادة الموزعة أو التشاركية. تعتبر القيادة التربوية، التي تركز على أثر التعليم والتعلم، واعتبرت لفترة طويلة عنصراً مهماً في المدارس الفعالة (Grobler، 2013؛ Hallinger، 2005؛ Robinson، Lloyd، & Rowe، 2008).

نشأ مفهوم القيادة التعليمية من الدراسات العلمية المنجزة حول فعالية المدرسة في السبعينيات والثمانينيات (هالينجر، 2005). إذ تهتم القيادة التعليمية أساساً بتحسين التعليم والتعلم وتركز أساساً على سلوك المعلمين أثناء مشاركتهم في أنشطة تؤثر بشكل مباشر على تحصيل المتعلمين (Hallinger، 2003). توجد

عدة تصورات للقيادة التعليمية، ولكن التصور الأكثر شيوعاً هو تصور (Hallinger، 2003) الذي يتناول مفهوم القيادة التعليمية عبر ثلاثة أبعاد:

- تحديد رسالة المدرسة،
- إدارة البرنامج التعليمي،
- تطوير المناخ المدرسي للتعليم.

حدد هالينجر (2003) هذه الأبعاد في عشر وظائف قيادية تعليمية: كترجمة رسالة المدرسة إلى أهداف والتواصل حولها وتبليغها (Hallinger، 2003). و فيما يخص إدارة البرنامج التعليمي فيتم التأكيد على وظائف تنسيق المناهج والإشراف على المتعلمات وتقييمها (Hallinger، 2003). أما فيما يخص تطوير مناخ التعلم المدرسي، فيتم تحديده في الوظائف التالية: الحرص على زمن التعلم، وتقديم الحوافز للمعلمين، وتوفير الحوافز للتعلم، وتعزيز التطوير المهني والحفاظ على وضوح عالٍ (Hallinger، 2003).

يتم تعريف تتمحور القيادة التعليمية حول مدير المدرسة (Aas & Brandmo، 2016، Nedelcu، 2013). يمكن وصفه بأنه نهج رأسي من أعلى إلى أسفل لقيادة المدرسة لأنه يركز بشكل أساسي على المدير ومهامه في التنسيق والإشراف على التعلم (Aas & Brandmo، 2016). يذكر (Nedelcu، 2013) أن Hallinger يرى القادة التربويون هم مديراء براكماتيون، يركزون بشدة على المناهج الدراسية ولا يخشون العمل مع المعلمين لتحسين التدريس والتعلم. ينتقد بعض العلماء القيادة التعليمية على أنها أبوية وتعتمد على أتباع مطيعين (Marks & Printy، 2003). على الرغم من أن القيادة التعليمية جذبت الكثير من الاهتمام، فقد نشأت نظريات أخرى وتلاشت القيادة التربوية بشكل أكبر. ويعزي ليشوود (1992) هذا التلاشي للتركيز الضيق الأصلي على الممارسات في الفصل الدراسي. ومع ذلك، تستعيد القيادة التعليمية في الوقت الحاضر المزيد من الاهتمام. تظل القيادة التعليمية مهمة لأنها تركز على العملية الأساسية للمدارس: جودة التدريس والتعلم. تركز القيادة التعليمية المعاصرة على التأثير في عمليات التدريس والتعلم، ولكنها تدرك أيضاً أن القيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التنظيمية للتعليم والتعلم (Piot، 2015).

ركزت الدراسات التي أجريت بالمدارس في السبعينيات والثمانينيات على المدارس الابتدائية الحضرية في ظروف صعبة. مما دفع بالتساءل عما إذا كانت نتائج هذه الدراسات يمكن تعميمها على مجموعة أكبر من المدارس (Rowan، Dwyer، Bossert، & Lee، 1982). يعترف هذا النقد ضمناً بأن سياق المدرسة يمثل عاملاً مهماً في القيادة المدرسية وفعالية المدرسة (Bossert et al.، 1982) ويتوافق مع نظريات القيادة الظرفية التي ظهرت في السبعينيات.

تنص نظرية "القيادة الظرفية" على أنه يجب معاملة الموظفين وفقاً لديناميكية خاصة بالموقف وأن القادة يجب أن يكونوا على دراية بالفرص المتاحة لتطوير كفايات الموظفين (Thompson & Glasø، 2015). تركز

نظريات القيادة التعليمية أساساً على سلوك وموقف الموظف وعلى خصائص المؤسسة على سبيل المثال خصائص الموظفين وهيكل المهام والتسلسل الهرمي وعلاقات القوة.

منذ السبعينيات، أصبح الاعتقاد بأن نتائج القيادة تتأثر بالسياق مقبولا وعلى الرغم من ذلك، أقر باس وريجيو (2006) بأن العوامل الظرفية يمكن أن تؤثر على فعالية القادة. بعد فترة من تراجع الاهتمام بالقيادة الظرفية، عادت العلاقة بين سياق المدرسة والقيادة مرة أخرى (هالينجر ، 2011)

نشأ مفهوم قيادة التغيير في الثمانينيات وهو يؤكد على أن القادة يجب أن يحفزوا أتباعهم للعمل من أجل تحقيق أهداف وأيضاً تحقيق ذواتهم (Sun & Leithwood ، 2012). يهدف إلى تعزيز بناء القدرات ومستويات أعلى من الالتزام لأجل تحقيق أهداف المؤسسة، مما يؤدي إلى زيادة الجهد والإنتاجية (باس وأفولي، 1994). قام (1992) Leithwood بتكييف النموذج العام لقيادة التغيير إلى نموذج خاص بالمؤسسات التربوية. يتكون هذا النموذج من سبع مكونات:

- الدعم المتفرد، soutien individualisé
- الأهداف المشتركة،
- الرؤية،
- التحفيز الفكري،
- بناء ثقافة المؤسسة
- المكافآت
- التوقعات العالية والنمذجة.

بعد ذلك، طور (1999) Leithwood and Jantzi نموذجاً أكثر شمولاً لقيادة التغيير التربوية بناءً على ستة أبعاد للقيادة وأربعة أبعاد للتدبير إذ تشمل أبعاد القيادة:

- بناء رؤية المدرسة وأهدافها،
- وتوفير التحفيز الفكري،
- وتقديم الدعم الفردي،

• تجسد القيادة الممارسات الجيدة وتكون رمزا للقيم، و تبين عن التوقعات العالية للأداء وتطور الهياكل اللازمة لتعزيز المشاركة في قرارات المدرسة (ليثوود وجانتزي ، 1999).

تشمل أبعاد الإدارة:

- تدبير الموارد البشرية،
- دعم التعلم،
- مراقبة الأنشطة المدرسية (Leithwood & Jantzi ، 1999).

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد ماركس وبرينتي (2003) على قادة التغيير يحفزون المعلمين والمتعلمين من خلال زيادة وعيهم بأهداف المؤسسة.

تتناقض القيادة التغيير مع القيادة التعليمية لكونها نموذج قيادة تشاركية وتهدف إلى إحداث تغيير من خلال الإجراءات التصاعدية (Aas & Brandmo، 2016). في حين تركز القيادة التعليمية على كيفية الإدارة والتحكم الموظفين في اتجاه الأهداف المحددة، وبالتالي تتميز القيادة التعليمية بأنها نهج من الأعلى إلى أسفل (Aas & Brandmo)،

في أواخر الثمانينيات، تطور اتجاه جديد في نماذج القيادة. ظهرت نماذج القيادة الموجهة نحو التعاون والتعلم التنظيمي، مثل القيادة الموزعة أو القيادة التشاركية وقيادة الفريق والقيادة الديمقراطية (Hallinger، 2003). يشير ظهور هذه النماذج إلى عدم الرضا عن القيادة التعليمية التي تركز بشكل أساسي على قوة وسلطة المدير وتشير إلى أن المعلمين مجرد أتباع مطيعين (Nedelcu، 2013). تدرك القيادة التشاركية أنه يمكن توزيع القيادة على جميع أعضاء المدرسة.

لا يوجد تعريف متفق عليه للقيادة التشاركية (Harris، 2013). إلا أن Spillane (2006) ينص على أن القيادة التشاركية تمتد على عدد من الأفراد ويتم إنجاز المهام من خلال تفاعل قادة متعددين. يفترض هاريس ودي فلامينيس (2016) أن القيادة التشاركية تأخذ في الاعتبار القيادة من قبل الفرق والمجموعات، والتي يتم تقاسمها داخل المؤسسات وفيما بينها وعبرها،

تؤكد القيادة التشاركية على التفاعلات بدلاً من الإجراءات وتنص على أن القيادة لا تقتصر على أولئك الذين يشغلون منصباً قيادياً رسمياً في الجزء العلوي من المؤسسة (Harris & De Flaminis، 2016). لذلك يتشارك العديد من الأفراد في مسؤوليات القيادة لتوجيه وإكمال مهام القيادة التي تختلف في الحجم والتعقيد والنطاق (Harris & De Flaminis، 2016). هذا يعني أنه يمكن لأفراد مختلفين أن يكونوا مسؤولين في أوقات مختلفة اعتماداً على التحدي المحدد والسياق المحدد (Gronn، 2002). اقترح روبنسون (2008) أن طبيعة القيادة التشاركية تشمل مفهومين رئيسيين:

- القيادة التشاركية كتوزيع المهام

- القيادة التشاركية كتوزيع عمليات التأثير.

تسلط القيادة التشاركية الضوء على فوائد التعاون والغرض المشترك والملكية المشتركة، ولكن يعتمد الكثير من تأثيرها على كيفية توزيع القيادة والنوايا من وراءها (هاريس، 2013). يؤكد ماسكال وليثوود وشتراوس وساكنس (2008) على استجابة القيادة الموزعة لسياقها.

1.2- النظريات الحديثة للقيادة التربوية

في ظل المهام المتعددة والضغط المتزايد على مديري المؤسسات التعليمية أصبح لزاماً تجاوز المنظور الضيق لنظرية واحدة للقيادة للإشارة إلى أن القيادة هي تشاركية وموزعة ويمكن اعتبارها نشاطاً جماعياً (ليثوود

وآخرون، 2008). يؤكد (Piot 2015) أن النظرية الخاصة بالقيادة التربوية وسبل تطبيقها لا زال غامضا، وبالتالي ينصح بدمج النظريات الأخرى ذات الصلة ويوضح ماركس وبرنتي (2003) أنه عندما يتم دمج القيادة التعليمية والقيادة التحويلية والقيادة التشاركية، يكون التأثير على أداء المؤسسة ونتائج المتعلمين إيجابيا. روبنسون وآخرون (2008) لاحظ أن القيادة التربوية الناجحة تتعايش مع التركيز على القيادة التعليمية، لأن التدريس كعملية محددة يفتقر إلى نظريات القيادة العامة مثل القيادة التحويلية (روبنسون وآخرون، 2008). وبالتالي، فمن الأجدى توسيع نطاق القيادة التعليمية مع نظريات أخرى من أجل الحصول على رؤية أعمق في تأثير القيادة المدرسية على تحصيل الطلاب.

2. القيادة التعاونية وتغيير المؤسسة

2.1- القيادة التعاونية⁴³

لا يحدث التغيير بمجرد تدخل قيادي (كاريسمائي) أو سلطوي لقائد المؤسسة، بل سيتحقق بالتدريج في إطار عملية استكشاف ومساءلة جماعية، وبناء أساليب جديدة للتفكير والعمل بما فيها تفويض السلطة أو تقاسمها. ولا يكفي القائد المغير بجعل مختلف الفاعلين يطبقون منظوره وبالتالي يبقون مجرد منفذين لتعليماته، بل يسعى إلى أن يتمكنوا من ثقافة جديدة تعيد تنظيم علاقات السلطة بين القمة والقاعدة. إنه يشحن كل الفاعلين بالطاقة اللازمة للتدبير الذاتي للتغيير، بحيث يصبح لهم دور فعال في عمليات القرار والإنجاز. إن مقارنة القدرة على التدبير الذاتي للتغيير تمثل نقيض الأسلوب البيروقراطي الذي يتميز بالتراتبية وأحادية المنظور إلى الأشياء، فهي تعتمد التشاور والمشاركة والانفتاح والمرونة في التعامل، وتؤكد في المقام الأول على استيعاب عملية التغيير وتملكها من لدن الفاعلين الرئيسيين الذي هم رجال التعليم. لا يكفي أن يتحرك بعض المدرسين المناضلين أو تتحرك مدرسة أو مدرستان رائدتان أو مجموعة عمل مكلفة من طرف النظام التعليمي، ليصبح التغيير أكثر فاعلية. ولا يكفي أن تحدد السلطة تصورا للتغيير وتبني استراتيجيات لضمان جودة التعلم أو أنظمة متطورة للتقويم، فالقيادة ليس بإمكانها وحدها تغيير النظام رغما عن أنفه. إن المدرسين بحاجة إلى الحفز والاهتمام لكي ينخرطوا في عملية التغيير، ولا بد أن تتوافر لديهم إرادة التغيير، ولن تنمو هذه الإدارة إلا إذا ازدادت سلطتهم داخل المؤسسة، ورغبوا في استعمالها. فلا بد أن يحسوا بأن لهم "سلطة مهنية".

2.2- خصائص المدير القائد للتغيير: يتميز المدير القائد للتغيير وفق دراسة ميدانية بما يأتي:

- شخص غير راض عن وضعية المؤسسة
- يثبت سلطته من خلال انخراطه في التجديد
- يؤول القواعد الإدارية تأويلا منفتحا
- يستثمر مرجعيات نظرية عند الحاجة
- يرى في التغيير عملية هدم خلاق
- شخص يستشرف المشكلات قبل حدوثها
- يتخذ موقفا إراديا أمام الأحداث
- يملك رؤيا خلافة
- يرى التغيير كحبكة (مسرحية)
- يستعمل تفكيرا نظاميا (نسقيا مترابطا)

⁴³ 205-202. Tilman, F. et N. Ouali (2001). Piloter un établissement scolaire. Bruxelles : Deboeck Université, pp 202

3. تشكيل فريق فعال لقيادة مشروع المؤسسة⁴⁴

3.1- مفهوم الفريق

الفريق جماعة من الأشخاص المتعاونين فيما بينهم بكيفية تساعدتهم على إنجاز أعمال مشتركة تخدم الهدف العام الذي يسعون إليه. ويشكل الإحساس بروح الفريق عروة وثقى تقوي الارتباط بين الأعضاء، وترسخ انخراطهم في العمل لتحقيق الأهداف المشتركة. ويحتاج الفريق إلى كافة أعضائه لإنجاز العمل على الوجه المطلوب، لذا يتطلب المشروع إنماء كفايات كل عضو والاستفادة من خبراته. ولا يكون الفريق جيدا لتشكيله من أفراد متميزين، وإنما يصبح جيدا حينما يعمل بكيفية جيدة.

3.2- أهمية الفريق

- تفوق منجزات الفريق منجزات أعضائه منفردين، فهو يتيح لأعضائه إنماء القدرة على الإنجاز، لأنه يحقق منجزات أهم من منجزات أعضائه منفردين، سواء من حيث الكم أم الجودة.
- يعد العمل في فريق الوسيلة الوحيدة لإنجاز مشاريع على مستوى المؤسسة التعليمية، لأن المشروع يستلزم تضافر جهود فريق متكامل من المؤسسة وشركائها.
- ينمي العمل في فريق الروح الجماعية في المؤسسة، لأن الفريق الفعال يخلق مناخا ودبا يشجع على تبني اتجاهات إيجابية نحو العمل والمؤسسة والعاملين فيها.
- يتيح العمل في فريق تبادل التجارب وتحقيق الاستفادة المتبادلة وإنماء الكفايات المهنية.

ما ينبغي فعله لتشكيل فريق فعال (الضوابط: قواعد، مبادئ، مواقف، تصرفات)	ما ينبغي تجنبه لتشكيل فريق فعال (الضوابط: قواعد، مبادئ، مواقف، سلوكيات)
تشكيل فريق العمل	
.....-	-
توزيع المهام	
.....-	-
تعزز انخراط الأعضاء في المشروع	
.....-	-
منهجية اشتغال الفريق	
.....-	-
أدور القيادة التربوية	
.....-	-

3.3- L'efficacité de l'équipe


Aborder le sujet team building sans avoir clarifié la notion d'équipe et les éléments qui influencent son fonctionnement à notre sens serait peut fructueux. C'est pourquoi nous allons nous attarder un peu pour la tirer aux claires avant d'enchaîner sur la notion team building :

⁴⁴ - Giles, C. (1997) School development planning Exeter : Northcote House

Bien que toutes les équipes soient des groupes, tous les groupes ne peuvent pas être considérés comme des équipes. Pour qu'un groupe se qualifie en tant qu'équipe, ses membres doivent s'appuyer les uns sur les autres et partager un objectif commun. Une équipe est définie comme un ensemble distinct de deux personnes ou plus qui interagissent de manière dynamique, interdépendante et adaptative vers un but /objectif / mission commune, et qui ont chacune des rôles ou fonctions spécifiques à remplir (Salas, Dickinson, Converse et Tannenbaum,). Ainsi, un groupe de personnes assistant à une réunion ne serait pas nécessairement considéré comme une équipe.

Une certaine forme de dépendance à la tâche existe entre les membres de l'équipe. En outre, cette définition reconnaît qu'une équipe n'est pas une entité statique mais que ses membres interagissent de manière dynamique et adaptative pour atteindre ses objectifs. Les équipes évoluent avec le temps (Gersick, 1988 ; Glickman et autres, 1987 ; Morgan, Glickman, Woodard, Blaiwes et Salas, 1986).

Les rôles et les normes évoluent, les membres de l'équipe développent de nouvelles compétences et attitudes, les tâches sont modifiées, les schémas de communication se développent, les objectifs sont révisés, le personnel peut changer et des progrès sont réalisés, si le climat dans lequel fonctionne cette équipe le permet. Le changement est inévitable. Ce qui oblige les leaders à penser à la cohésion et la performance de cette équipe Pourquoi certaines équipes fonctionnent-elles bien et d'autres mal ? Pourquoi une équipe particulière se comporte-t-elle bien pendant un certain temps, puis présente-t-elle des baisses de performance ?

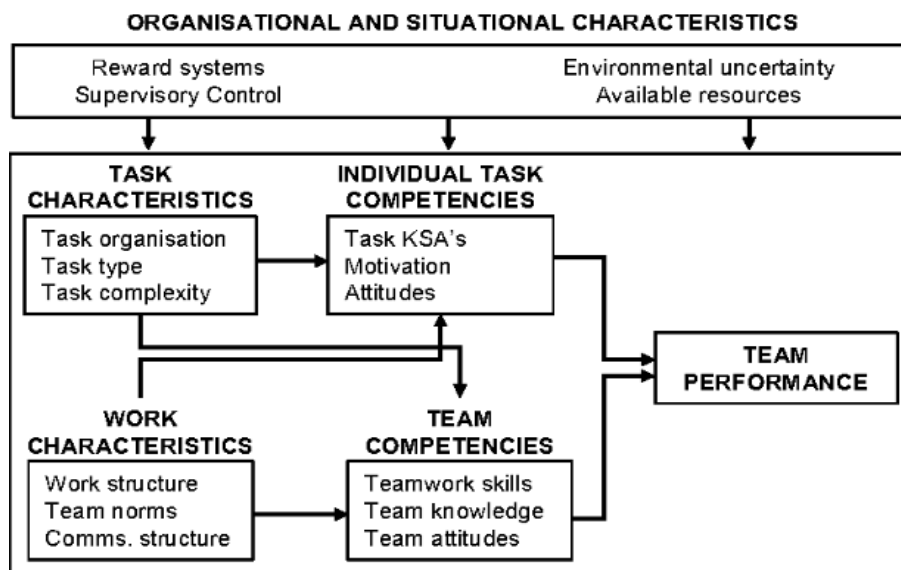

La figure 1 illustre les principales catégories des variables de l'efficacité de l'équipe :

- 1- Les caractéristiques de la tâche, (task)
- 2- La structure de travail, (work)
- 3- Les caractéristiques individuelles
- 4- Les caractéristiques de l'équipe,
- 5- Les processus d'équipe,
- 6- Les interventions d'équipe,
- 7- Les changements d'équipe,
- 8- Les performances de l'équipe et les changements individuels.

Les variables spécifiques sont notées sous forme de puces dans chaque case. Ces variables sont censées être représentatives des catégories plus larges et ne constituent pas une liste exhaustive.

Les intrants d'une équipe comprennent les caractéristiques individuelles et d'équipe (y compris ses ressources matérielles et financières), les caractéristiques de la ou des tâches sur lesquelles l'équipe travaille et la manière dont le travail est structuré. Les débits sont la manière dont l'équipe interagit sur une période donnée. Ce sont les processus par lesquels l'équipe communique, coordonne, prend des décisions et convertit ses entrées en sorties.

Les principaux résultats sont la qualité et la quantité des produits fabriqués et des services fournis, tels que reflétés dans les performances de l'équipe.

D'autres résultats sont des changements dans l'équipe (par exemple, de nouvelles normes) et des changements dans des individus (par exemple, des compétences améliorées), qui peuvent à leur tour influencer les performances.

Les interventions, telles que la formation et le team-building, peuvent être ciblées pour améliorer les processus d'équipe, améliorer les caractéristiques individuelles ou d'équipe, ou modifier la structure de travail ou la tâche.

Toutes ces variables doivent être prises en compte dans l'environnement organisationnel existant et en développement. Chaque élément majeur du modèle est traité plus en détail ci-dessous.

3.3.1- Contexte organisationnel et situationnel

Les équipes de travail opèrent dans un contexte environnemental particulier (Hackman, 1983 ; Nieva et al., 1978). Bien que les groupes soient souvent considérés comme la variable de contexte pour les comportements individuels, l'environnement organisationnel devrait également être considéré comme la variable de contexte pour le comportement du groupe (Gladstein, 1984). Par exemple, le système de récompense de l'organisation (Hackman, 1983 ; Steiner, 1972) est une variable organisationnelle susceptible d'influer sur le comportement d'une équipe. L'existence et la nature des récompenses de groupe et individuelles peuvent influencer sur le niveau de coopération ou de compétition entre les membres de l'équipe, ce qui peut à son tour affecter l'efficacité de l'équipe (Lawler, 1981 ; Pritchard, Jones, Roth, Stuebing et Ekeberg, 1988)).

- La nature des relations intergroupes ou latérales au sein de l'entreprise peut également influencer sur l'efficacité des équipes (Brett et Rognes, 1986).

- La coopération entre les départements, les fonctions et les équipes peut être, nécessaire pour la performance de l'équipe réussie.

- Les relations inter unités ne sont qu'un indice de la culture organisationnelle.

Une culture organisationnelle favorable a été associée aux équipes les plus performantes (Sundstrom, Perkins, Futrell et Hoffman, 1990).

3.3.2- Caractéristiques de la tâche :

Il a été démontré que la complexité des tâches était liée à la performance des tâches (Herold, 1978) et des recherches méta-analyse sur la performance des équipes a révélé que la difficulté des tâches explique une variation importante de la performance des équipes (Xmnenbaum et al., 1990). L'organisation et le type de la tâche peuvent également influencer sur l'efficacité de l'équipe (McGrath, 1984 ; Kabanoff & O'Brien, 1979).

En résumé, il convient de rappeler que toutes les équipes ne se ressemblent pas ; les variations de tâches différencient les équipes et influencent les performances.

3.3.3- Structure de travail

Une équipe peut aborder une tâche donnée de plusieurs manières. Il peut y avoir des différences dans la manière dont le travail est attribué aux membres de l'équipe, par exemple si chaque membre de l'équipe assume un seul rôle comme il peut l'échanger en cas de besoin. Un autre élément de la structure de travail est la structure de communication formelle du groupe. La nature de la structure de communication, c'est-à-dire qui est autorisé ou tenu de parler avec qui, peut également influencer sur la manière dont le travail est effectué (Naylor et Dickinson, 1969). En outre, les équipes établissent des normes concernant la manière dont le travail doit être effectué. Les normes de l'équipe peuvent avoir une forte influence sur les processus de l'équipe et la performance ultérieure (Hackman, 1987). Comme le modèle le suggère, la nature de la tâche et la composition des membres individuels de l'équipe vont influencer la manière dont une équipe (ou son chef) structure son travail.

3.3.4- Caractéristiques individuelles

Les membres individuels de l'équipe apportent également diverses personnalités et modèles mentaux à l'équipe. Des variables de personnalité, telles que la sociabilité, l'ajustement et la vraisemblance peuvent être liées aux performances de l'équipe (Driskell, Hogan et Salas, 1987). Driskell et al soutiennent que différentes tâches devraient être mieux exécutées par des équipes composées d'individus présentant certains traits de personnalité. Les modèles mentaux, ou les représentations symboliques que les individus ont de plusieurs concepts, peuvent également affecter les performances de l'équipe (Cannon-Bowers, Salas et Converse, 1990).

Les modèles mentaux des membres de l'équipe des tâches et des opérations de leur équipe pourraient déterminer le comportement individuel et l'efficacité de l'équipe.

3.3.5- Caractéristiques d'une équipe

Plusieurs caractéristiques de l'équipe peuvent être importantes pour comprendre son efficacité. La composition d'une équipe, y compris son homogénéité, s'est avérée être liée à la performance de l'équipe (Gunderson & Ryman, 1967). Une caractéristique essentielle de l'équipe est la cohésion de l'équipe. La cohésion d'équipe reflète le sentiment d'appartenance et le sens de l'esprit d'équipe d'une équipe. L'importance de la cohésion d'équipe a été discutée dans la littérature de psychologie clinique (voir Kellerman, 1981) et des travaux empiriques ont montré sa relation avec la performance de l'équipe (Dailey, 1980 ; Ilnnenbaum et al., 1990).

3.3.6- Processus d'équipe

Les processus d'équipe sont les actions intragroupe et intergroupe qui transforment les ressources en un produit (Gladstein, 1984). Il fait référence à la manière dont les membres de l'équipe interagissent, y compris la manière dont ils communiquent, prennent des décisions, résolvent des conflits, résolvent des problèmes et coordonnent leurs actions.

Il a été démontré que les processus de communication étaient liés aux performances des équipes (Tushman, 1979 ; Katz, 1982), tout comme les processus

3.4- Team building

3.4.1- L'historique du team building

L'histoire du team building étant intimement liée aux premières études de psychosociologie des organisations ainsi que les études sur les T-group (Dyer, 2013) qui nous mène à l'école des relations humaines.

Composés d'une dizaine d'individus étrangers les uns aux autres, les T-group étaient dirigés par un formateur, dont la tâche principale était de permettre aux membres du groupe d'explorer la vie de groupe (Campbell et Dunnette, 1968). Cela

devenait possible en leur fournissant de la rétroaction sur leurs propres comportements, en leur demandant de répondre de manière ouverte et honnête en encourageant les membres du groupe à accepter la responsabilité de leurs comportements ainsi qu'en comptant sur leur engagement dans des relations fondées sur l'égalité plutôt que la hiérarchie ou le statut (Campbell et Dunnette, 1968). La rencontre de ces conditions a amené plusieurs personnes à estimer que le T-group pourrait devenir le véhicule qui aiderait à changer la nature des organisations autoritaires et contribuerait à libérer le potentiel humain qui avait été négligé jusqu'alors (Dyer, 2013).

Cependant, des études ont démontré que les formations T-group n'avaient pratiquement aucune incidence, causant même parfois un effet négatif sur la performance organisationnelle de l'équipe (Dyer, 2013). L'expérience des T-group a permis aux participants de devenir plus ouverts et honnêtes, mais a parfois engendré des affrontements dysfonctionnels, ce qui n'améliorait en rien la résolution de problèmes de performance spécifiques de l'équipe (Campbell et Dunnette, 1968). Ainsi, pendant que les praticiens développaient leur expertise, recourant aux méthodes de T-group dans les unités, des transformations se produisant au cœur de l'organisation les ont amenés à reconsidérer leurs approches (Dyer, 2013). Le besoin premier n'était plus d'amener les gens à communiquer et à donner du feedback afin d'améliorer les relations de travail, il fallait dorénavant aider les équipes de travail à se développer, visant ainsi une meilleure collaboration et productivité au sein des groupes (Klein et coll., 2009).

C'est dans ce contexte que s'est opérée une transformation majeure, celle de la naissance du concept du team building en organisation, qui met l'accent sur l'atteinte des objectifs dans les équipes de travail (Dyer, 2007). Initialement conçu comme une intervention destinée à améliorer les relations interpersonnelles et les interactions sociales.

Le team building a évolué vers une intervention de groupe conçue pour améliorer l'efficacité, le fonctionnement et les performances de l'équipe (Klein et coll., 2009 ; Payne, 2001 ; Schein 1969, 1999). Désormais, la plupart des intervenants et gestionnaires font en sorte que l'équipe se développe sur deux niveaux, soit sur le plan des relations humaines, mais également sur celui des résultats (Mucchielli, 2002). La méthodologie de travail s'est ainsi lentement déplacée du T-group non structuré à un processus d'intervention défini de team building (Dyer, 2013).

3.4.2- Définitions du team building

L'étiquette Team Building est un terme anglophone couramment employé dans le vocabulaire de l'organisation et s'applique à plusieurs types d'interventions. Les principaux synonymes français sont constitution, cohésion, dynamisation, mobilisation ou consolidation d'équipe (Cauvin, 2007) et englobent plusieurs notions et théories sous-jacentes à cette pratique (Moral et Giffard, 2010).

Cependant, aucun équivalent français satisfaisant ne remplace l'appellation " Team building" qui signifie littéralement « Construction d'équipe ».

Le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française (OQLF), définit l'expression team building comme : « un ensemble d'actions stratégiques qui visent à améliorer le fonctionnement et la cohésion d'une équipe, à préciser les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe et à accroître le potentiel de chacun afin d'atteindre un meilleur niveau de performance » (Office de la langue française, 2000). Selon Labelle (2001), consolider une équipe de travail consisterait à rallier les membres d'un groupe autour d'objectifs communs, dans un climat qui favorise la communication, le dynamisme et le plaisir au travail.

Une première série de définitions du team building a été répertoriée dans le domaine de la gestion et du développement organisationnel des groupes et des équipes de travail en lien avec la performance (Armstrong et Piotrowski, 2004 ; Hardy et Crace, 1997). Les recherches tendent à démontrer un fort lien entre le team building et la performance des équipes.

Brawley et Paskevich (1997) définissent le team building comme une méthode qui aide le groupe à améliorer les conditions de travail et à satisfaire les besoins de ses membres, ce qui permettra d'accroître l'efficacité de celui-ci.

Lorsque le team building fonctionne, la synergie d'équipe est renforcée et permet ainsi d'améliorer la performance de l'équipe (Bloom et coll. 2010).

Une seconde série de définitions souligne l'importance de la notion de cohésion dans le phénomène du team building, fruit des recherches sur les T-group et les relations humaines au travail (Campbell et Dunnette, 1968. Ainsi, Schein (1969) est un des premiers auteurs à tenter une définition du team building. Selon lui, il s'agirait d'une catégorie d'interventions formelles et informelles dans les équipes de travail qui mettent l'accent sur l'amélioration des relations interpersonnelles, la clarification des rôles ainsi que la résolution de problèmes qui affectent le fonctionnement de l'équipe. Le TEAM BUILDING apporterait des résultats, car il aide les individus et les groupes à examiner, diagnostiquer et agir sur leurs comportements, ce qui engendrera un changement dans les relations interpersonnelles entre les membres du groupe (Schein, 1969, 1999).

L'expression team building semble être employée en référence à des activités ludiques alors que la notion de consolidation d'équipe ferait plutôt référence au domaine de l'intervention organisationnelle. Nous avons choisi de garder l'appellation team building pour les deux notions bien que la littérature francophone ait plutôt recours au terme consolidation d'équipe est ceux pour ne pas traiter l'une sans l'autre et aussi ne pas se disperser dans les appellations Le team building, désigne alors des interventions conçues pour améliorer l'efficacité d'un groupe de travail (Woodman & Sherwood, 1980). La plupart des interventions visant à renforcer l'esprit d'équipe sont basées sur un modèle de recherche-action de collecte de données, de retour d'informations et de planification d'actions (Beckhard, 1969 ; Beer, 1976). Bien qu'il existe diverses approches pour le team building, la plupart se concentrent sur l'amélioration des activités ou des processus de l'équipe. Les processus de groupe peuvent être améliorés en supprimant les obstacles, en clarifiant les rôles, en améliorant les relations interpersonnelles, en établissant des objectifs convenus ou en utilisant d'autres stratégies d'intervention ciblées. Le team building repose sur l'hypothèse que la participation active d'une équipe à la planification de son changement a plus de chances d'entraîner des conséquences favorables que quand on le lui impose et que la partie la plus proche de la situation peut résoudre ses propres problèmes si elle dispose d'une structure et d'un processus appropriés.

En général, le team building trouve ses valeurs dans les philosophies humanistes du management.

Bien que les interventions du team building partagent une similitude conceptuelle, elles peuvent varier en ce qui concerne leur objectif ainsi :

- Du point de vue du management des organisations, le "team building" met plus l'accent sur le développement des ressources humaines que sur la planification. Il a pour objectif de construire une équipe harmonieuse et d'étudier l'évolution du développement de l'équipe. Il tend à améliorer les capacités opératoires des membres de l'équipe.

- Dans le domaine de la production le terme "team building" est considéré comme un mode d'organisation utilisé souvent au niveau organisationnel, en particulier dans l'allocation des ressources humaines dans les cellules manufacturières. Ces équipes de production sont constituées en fonction d'un grand nombre d'objectifs de performance en production (quantité de produit, coût lié aux opérateurs, niveau de compétence, taux d'engagement, etc.).

Dans les projets de conception Le terme "team building" correspond au processus de construction d'une équipe multifonctionnelle ayant pour mission de réaliser une tâche de conception de produit en tenant compte des compétences des membres de l'équipe et des différents aspects du projet (produit, processus, acteur)

3.5- خصائص الفريق الفعال وسلوكاته.

3.5.1- يتقاسم أهدافا واضحة ويتبنى غايات مشتركة:

- يتفق على أولويات المشروع والأعمال التي ستنجز؛
- يتفق على نطاق الاختلاف المسموح به داخل الفريق؛
- يوضح أدوار كل عضو في الفريق؛
- يناقش القيم والاتجاهات ويرسم فلسفة الفريق بالتوافق.

3.5.2- يعمل وفق مسطرة وإجراءات واضحة:

- لتنظيم الاجتماعات؛
- اتخاذ القرارات؛
- تفويض المسؤوليات والمهام.

3.5.3- يضمن تتبعاً منتظماً لتقدم أعماله:

- يراجع الأهداف
- يقوم مدى ملاءمة عمليات التتبع من لدن الفريق
- لا يقضي وقتاً طويلاً في مناقشة ما فات.

3.5.4- يحظى بقائد(ة) مناسب للفريق الفعال:

- قائد(ة) حاضر وبابه مفتوح؛
- قائد(ة) يحسن استعمال مواطن القوة لدى كل عضو في الفريق؛
- قائد(ة) يعطى القدوة الحسنة للأعضاء في فلسفة العمل ضمن فريق.

3.5.5- يملك قنوات مفتوحة للتواصل:

- تواصل مفتوح بين أعضاء الفريق، ولا يقتصر على تواصل كل عضو مع المدير(ة) فقط؛
- تواصل يعترف بالفضل لكل مساهم في العمل؛
- تواصل يحظى بتغذية راجعة إيجابية أو سلبية ولا يبقى صرخة في واد مقفر؛
- تواصل يعتمد الانفتاح والإنصات لحجج وآراء كل عضو؛
- تواصل منفتح على تقبل الآراء والنصائح الوجيهة من أشخاص غير منتمين للفريق.

3.5.6- يعمل في مناخ تسوده الثقة والدعم المتبادلين:

- يتبادل الأعضاء الدعم والمساعدة؛
- يقتضي الأعضاء وقتاً كافياً في العمل المشترك للاشتغال بفعالية؛

- يتيح مناخ العمل استثمار كفايات كل عضو؛
- يتقبل الأعضاء اختلاف الآراء ويحترمون وجهة نظر كل عضو؛
- ينمي الفريق علاقات إيجابية مع المجالس والفرق الأخرى العاملة بالمؤسسة.

3.5.7- يعترف بأن الصراع أمر طبيعي في طريق العمل البناء

- يناقش الفريق نقاط الاختلاف بكيفية طبيعية حين ظهورها مباشرة؛
- ينظر الفريق للصراع بوصفه تأكيداً لحضور شخصية كل عضو في الفريق؛
- تتقبل الفريق اتجاهات ومشاعر كل عضو ويناقشها في إطار من الاحترام المتبادل؛
- يشجع الفريق أعضائه على إبداء الرأي؛
- ينظر الفريق إلى اختلاف وجهات النظر باعتبارها مسألة طبيعية يعالجها بكيفية بناءة.

3.5.8- يعتني بالنمو الشخصي والمهني لأعضائه:

- يستعرض الفريق منجزاته بكيفية منتظمة بمشاركة كافة أعضائه؛
- ينتهز المدير(ة) الفرص المناسبة لتعزيز النمو المهني لكل عضو؛
- ينتهز كل عضو الفرص المناسبة لتعزيز النمو المهني لرفاقه؛
- ينتهز الفريق الفرص المناسبة لتعزيز النمو المهني لقائده (ته).

3.6- علاقة رئيس المشروع بأعضاء فريق القيادة والعمل⁴⁵

- ينبغي للفريق أن يحترم القائد ويشعر بالارتياح معك. كما ينبغي للعاملين أن يشعروا بالفرح حين حضوره إلى مقر عمله.
- ينبغي ألا يتعامل أبداً معهم كأنهم ملك له؛ كما أنه لا يمكنه إرغامهم على العمل متأخرين أو في عطلة نهاية الأسبوع، فهم أيضاً لهم حياتهم الخاصة.
- ينبغي التصرف معهم كأشخاص؛ أخذاً بعين الاعتبار الفروق الفردية بينهم: منهم المبدعون، ومنهم المرتاحون إلى العمل بالأرقام، ومنهم من يفضل العمل الفردي، ومنهم من يفضل العمل في جماعة.
- يشجع دائماً روح الفريق وروح التعاون؛ ويجعل أعضاء الفريق يعملون جماعة، ويخاطبهم كجماعة، ويبحث لهم عن تكوين في مختلف المهام حتى ينمي المرونة في العمل، ويثير لديهم الاهتمام والانخراط.
- ينبغي ألا يفضل أعضاء على آخرين؛ وألا يترك علاقات الصداقة تؤثر في علاقات العمل، إذا لم يقدّم زميل أو صديق أو شريك في الرياضة مثلاً بعمله على الوجه المطلوب، يعامله كما يعامل الأعضاء الآخرين.
- يجرب مساعدته هل بإمكانهم تحمل مسؤوليات أكبر عن طريق تفويض تدبير أعمال.

⁴⁵ - Coleman, R. et G. Barrie (1998). 525 conseils pour devenir un meilleur manager. Paris : Éditions de Vecchi., pp. 21

- يستعمل المحفزات لجعل الفريق متماسكا، ويكافئ كل عضو ساهم في العمل.
- يستعمل الأسلوب المباشر في مخاطبة الفريق.
- يحترم كل عضو في الفريق كيف ما كان شأنه ووظيفته؛ ولا يستعمل الأسلوب الأبوي مع الأعضاء.
- الاعتراف والثناء لكن دون الإغراق في الشكر والتعظيم.
- في حال نزاع: يجمع الأشخاص المعنيين ويزيل ما في الصدور من دواعي العداوة والبغضاء.
- لا ينسى أن قيمته ترجع إلى قيمة فريقه، فلا يخذله، ولا يكن مزاجيا أو حقودا.
- الاقتصار على العدد الضروري من الأعضاء، فكل عضو ينبغي أن يتطلب منه عمله كل وقته.

4. اتخاذ القرار بالتوافق⁴⁶

4.1- مفهوم اتخاذ القرار بالتوافق

اتخاذ القرار بالتوافق هو طريقة تمكن فريقا أو مجموعة من الوصول بفضل تعاونها إلى قرار مقبول من طرف الجميع. ويعتبر أنجع تقنية للدفع بأكثر عدد ممكن من الأشخاص للمشاركة في مسلسل اتخاذ القرار والانخراط في تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المجموعة.

2. عناصر مسهلة للوصول للتوافق:

- تنظيم الاجتماعات على شكل لقاءات بين أصدقاء وليس كمنافسات بين مجموعات متعارضة؛
- تجنب السلوك السلطوي الذي يتميز بالدفاع عن الرأي الشخصي بأي ثمن، وهو السلوك الذي غالبا ما يفضي إلى النزاع. وعلى الأعضاء أن يقدموا أطروحتهم بوضوح، وأن ينصتوا لوجهات نظر الآخرين مع دراستها بتمعن؛
- عدم تغيير أعضاء المجموعة رأيهم لمجرد تفادي المناقشة أو النزاع، وعليهم ألا يقبلوا أي قرار إلا إذا اقتنعوا بجدواه؛
- اتخاذ أعضاء المجموعة سلوكا إيجابيا نحو بعضهم البعض، لأنهم يستفيدون جميعا من القرار التوافقي؛
- مساهمة كافة الأعضاء في المناقشة وتشجيع كل واحد على المساهمة؛
- لجوء المنشط من حين لآخر إلى تحليل التوجه العام للمناقشة، لتوضيح الآراء المعبر عنها وكذا أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها؛
- دعوة شخص متخصص لمناقشة القرار المؤقت عند الحاجة، أو ترك الحسم في القرار النهائي إلى اجتماع آخر للتتبع؛


⁴⁶ - Lewis, J. R. (1989). L'école prix d'excellence. Bruxelles : Debout Université, pp 91 – 92 (extrait traduit)

- التذكر دائما بأن التوافق لا يعني أن القرار المتخذ يجب أن يحظى برضى الجميع. ومع ذلك على المنشط ألا يسبب إحراجا لأي فرد من المجموعة، وأن يكون هذا القرار أحسن حل ممكن في ضوء إكراهات الظروف والسياق والوقت.

ثانيا: حكمة مشروع المؤسسة المندمج

- البنيات المتدخلة في إرساء وقيادة وتبعية مشروع المؤسسة⁴⁷

إن النجاح في إرساء مشروع المؤسسة المندمج يقتضي التنسيق الفاعل بين مختلف البنيات محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وتوضيح العلاقات بين مختلف البنيات.

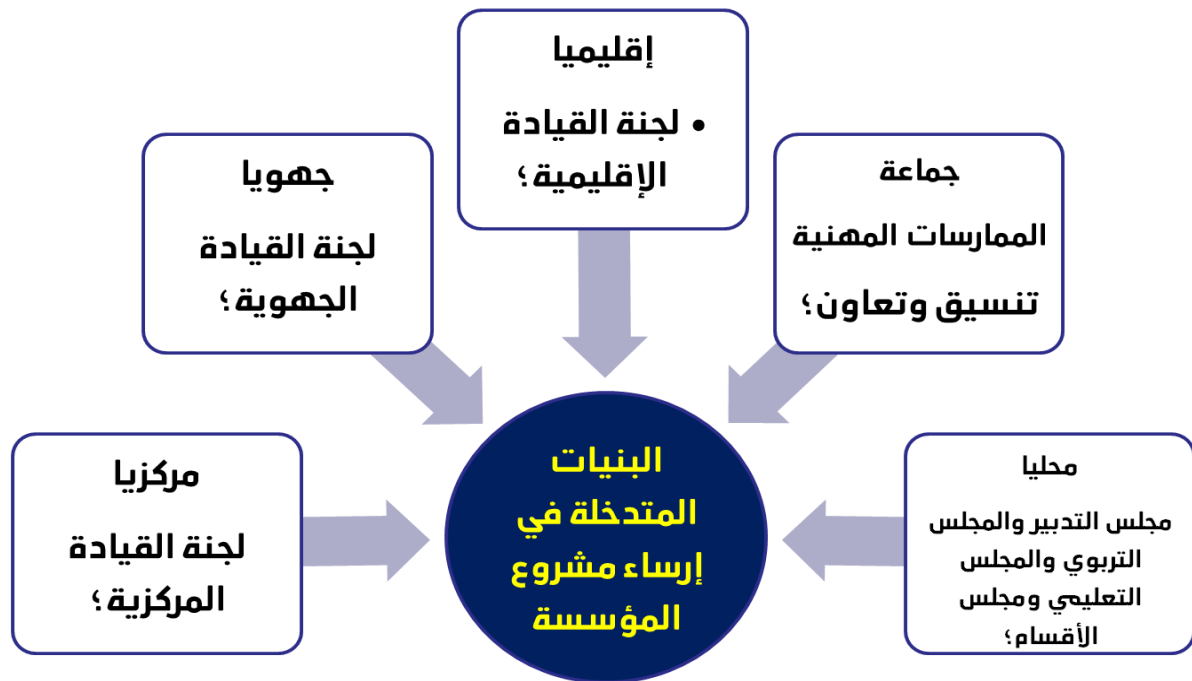

○ - على المستوى المركزي:

تقوم لجنة القيادة المركزية بتدبير عملية بلورة الاستراتيجية الوطنية لتنمية مشاريع المؤسسات ومواكبة تنفيذها على الصعيد الجهوي وتقويم المخططات الجهوية، في حين تقوم مديرية الحياة المدرسية بإدارة عملية تنفيذ هذه الاستراتيجية وتلقي الاقتراحات الجهوية لتطويرها؛

⁴⁷ - المراسلة الوزارية رقم 14-159 المؤرخة في 25 نونبر 2014 بشأن أجراء الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة ومرفقاتها

○ - على المستوى الجهوي

تقوم لجنة القيادة الجهوية بتدبير عملية بلورة المخطط الجهوي لتنمية قطاع التربية والتكوين ومواكبة تنفيذه وتقويم المخططات الإقليمية، في حين تقوم مصالح الأكاديمية بإدارة عملية تنفيذ هذا المخطط بارتباط مع مشاريع المؤسسات؛

○ - على المستوى الإقليمي

تقوم لجنة القيادة الإقليمية بتدبير عملية بلورة المخطط الإقليمي لتنمية قطاع التربية والتكوين ومواكبة تنفيذه وتقويم مشاريع المنطقة التربوية، في حين تقوم مصالح النيابة بإدارة عملية تنفيذ هذا المخطط بارتباط مع مشاريع المؤسسات؛

○ - على جماعة الممارسات المهنية

تشكل جماعة الممارسات المهنية فضاء للحوار والتقاسم في إطار عمل تشاركي يسعى لترصيد الممارسات الجيدة والبحث عن حلول للمشكلات المطروحة في الممارسة المهنية، كما تعتبر الجماعة وعاء التكوين المستمر لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية في إطار نظرية التعلم الاجتماعية. تعلم يبني بواسطة المشاركة والتفاعل الإيجابي ووفق سيرورة توطد الإحساس بالانتماء للقيادة رؤساء المؤسسات التعليمية وتسهم في تنمية كفاياتهم المهنية؛

○ - على المستوى المحلي

يقوم مجلس التدبير بدوره التدبري من خلال الإشراف على بلورة مشروع المؤسسة المندمج ومواكبة تنفيذه، ويقوم رئيس المؤسسة بإدارة عملية تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج.

5. آليات التدبير المالي لمشروع المؤسسة⁴⁸

اعتبار مشروع المؤسسة المندمج، الآلية الأساسية لتدبير الشأن التربوي ليس في المؤسسة فقط، بل في باقي مستويات المنظومة التربوية؛

مقاربة تمويل مشروع المؤسسة المندمج من خلال تدبير مالي شمولي ومندمج ينطلق من الحاجيات الحقيقية للمؤسسة التعليمية ويجعل منها النواة الأساسية لبناء ميزانية قطاع التربية والتكوين؛

أغلب ما سيصرف على المؤسسة التعليمية سيتم من خلال مشروع المؤسسة المندمج الذي سيمثل الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة لكل مؤسسة تعليمية.

6. التعبئة والتواصل وتبادل الخبرات⁴⁹

وضع مخطط تواصل وإخباري موجه لكل الفاعلين الداخليين والخارجيين على جميع المستويات حسب الأهداف المسطرة لكل مستوى؛

⁴⁸ - وزارة التربية الوطنية، دليل مساطر التدبير الإداري لمشروع المؤسسة (2014)، ودليل قيادة مشروع المؤسسة (2014)،

⁴⁹ - نفسه

ترصيد التجارب الناجحة وتوثيقها من خلال وضع بنك للمعطيات؛
تبادل الخبرات من خلال تنظيم لقاءات وفضاءات للتقاسم والتعريف بالمشاريع الناجحة ومكافأة المؤسسات المتميزة؛
إشراك مختلف الفعاليات في بلورة مشروع المؤسسة المندمج وهو ما يتيح استعمال الدليل الإجرائي؛
إبرام اتفاقيات شراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل مشروع المؤسسة.

ثانيا: مراحل المشروع حسب منهجية DEPART

تتلخص منهجية مشروع المؤسسة المندمج في الخطوات التالية:⁵⁰

1.1. منهجية DEPART

هي منهجية عمل في إعداد المشاريع المدرسية، تم اعتمادها في مشروع ثانوية التحدي، بشراكة بين وزارة التربية الوطنية ووكالة تحدي الألفية. وتتكون من ست مراحل متناسقة ومتراصة، لا تختلف كثيرا عن منهجية EPAR السابقة. ويتم اعتماد المنهجية وأجرائها وفق المراحل الآتية:

أ) الانطلاق Démarrage

تستهدف هذه المرحلة أجراة مختلف الآليات التديبرية والحكاما بالمؤسسة، والتي تتم عادة نهاية وبداية كل موسم دراسي وتهتم مجموعة من الاجراءات والمحطات التقويمية و التحضيرية والتي وجب ادراجها في مشروع المؤسسة على اعتبار أن مشروع المؤسسة اليوم – في توجهات الوزارة – يشكل آلية وحيدة وملزمة لتدبير وحكاما المؤسسات التعليمية، والآلية العملية الضرورية لمختلف العمليات التديبرية والتربوية والتي تشكل معطياتها انطلاقة لمشروع المؤسسة المندمج.

ويمكن عرض هذه المعطيات في جداول تفصيلية تتضمن بطاقات تقنية مجالس المؤسسة ومختلف أجهزتها التديبرية تتضمن تواريخ تجديدها وكل المعطيات التي يمكن أن تساهم في التحضير للإعداد للمشروع كما تشكل هذه المرحلة فرصة لعرض أليات بناء مشروع المؤسسة المندمج وتتجلى في اللقاءات التحضيرية التقويمية لنهاية الموسم الدراسي لمشروع المؤسسة؛ ومحطات تقويم النتائج الدراسية وأهم اللقاءات الإعدادية و الاستكمالية لبناء المشروع خلال الموسم الدراسي الجاري ؛ كما يجب أن تتضمن هذه المرحلة تحديد لجنة قيادة المشروع : أي الفريق القيادي الذي سيشرف على اعداد وتنزيل المشروع، بتحديد مسؤوليته ومهامه في

⁵⁰ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووكالة تحدي الألفية بالمغرب، حقيبة مشروع المؤسسة المندمج-2-الدليل العملي 2022.

المشروع خلال الموسم الدراسي ، مع الإشارة أن عملية تجديده يجب أن يتم بداية كل موسم دراسي وذلك في إطار المسؤولية والمحاسبة.

ب) التشخيص Etat des lieux

التشخيص عملية تشترك في إنجازها مختلف الأطراف المعنية بالمؤسسة، كفاعلين مباشرين أو غير مباشرين؛ من خلال الوقوف على وضعية المؤسسة راهنا، وتصورها مستقبلا، وصياغة رؤية مشتركة. ويمكن استخدام أسلوب المجموعات البؤرية الخاصة بكل طرف معني بالمشروع، أو تنظيم لقاءات تواصلية مباشرة، أو مقابلات خاصة... ويعدّ التشخيص كذلك بمثابة توصيف وتحليل لوضعية المؤسسة؛ من خلال تجميع المعطيات الكمية والنوعية ذات الصلة بالتعلّيمات، والبنية المادية والتربوية، والحياة المدرسية، والمحيط الاجتماعي للمؤسسة، وغيرها من مكونات المؤسسة؛ بهدف تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف، ورصد الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، واستثمار ذلك كله في بلورة مشروع يروم الارتقاء بجودة المؤسسة، وجودة التعلّيمات.

في هذه المرحلة يتعين على فريق القيادة الساهر على اعداد المشروع التركيز على مجموعة من المعطيات التي تهم بالخصوص وضعية المؤسسة – دون الاطناب في العرض – والاقتصار فقط على المعطيات التي تخدم الاشكالية التي سيتم معالجتها في إطار المندمج للمؤسسة ، ويستحسن عرض هذه المعطيات على شكل جداول و مبيانات رقمية تتضمن تقديم تشخيص حول الوضعية الراهنة للمؤسسة ومنها : البطائق التقنية (بطاقة تعريف المؤسسة/ البنية التحتية/ وضعية الموارد البشرية/ البنية التربوية/ مؤشرات التمدرس/ والنتائج الدراسية في المحققة في المواسم الدراسية السابقة.

كما يجب أن تتضمن هذه المحطة نتائج التشخيص التشاركي الذي تم التوصل اليها من خلال استثمار النتائج أو اللقاءات التشاورية والتقييمية بعرض مختلف الاكراهات و الصعوبات التي تعترض تجويد التعلّمات بالمؤسسة (نقط الضعف) وتحديد المتحكم فيه وغير المتحكم، إلى جانب تحديد نقط القوة الداخلية والخارجية للمؤسسة والتي يمكن ان تساهم في تحقيق وتنزيل المشروع المندمج.

ت) الأولويات Priorités

تتكون محطة الأولويات من لحظتين مهمّتين:

- **اللحظة الأولى:** التوافق على الرؤية المحلية في إطار رؤية استراتيجية، يتوافق عليها المجتمع المدرسي الموسع؛ لتحديد مواصفات المؤسسة والتعلم المنشودين على المديّين المتوسط والبعيد، في انسجام مع مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، وتوجهات منظومة التربية والتكوين. وهي تشكل منطلقا لمشروع المؤسسة، وتعبّر عن إرادة محلية للانخراط فيه بالجواب عن السؤالين الآتين:

ما مواصفات مدرسة الجودة التي نريدها أن تتحقق في مؤسستنا؟

ما مواصفات التعلّم الجيد الذي نريد أن يتحقق في مؤسستنا؟

- **اللحظة الثانية:** تحديد أولويات منبثقة عن الرؤية المحلية، ونتائج تشخيص وضعية المؤسسة. وتتميز تلك الأولويات بكونها:

- تستجيب للحاجات المحلية في انسجام مع القانون الإطار 51.17، وتوجهات المنظومة؛
- قابلة للتنفيذ الفعلي على مستوى المؤسسة؛
- ليست من نطاق تدخل المصالح الإقليمية أو الجهوية أو المركزية؛
- مقبولة من لدن جميع المعنيين بالمشروع، ومثيرة للاهتمام والرغبة في العمل على تحقيقها؛
- معززة لتحسين جودة خدمات المؤسسة، وجودة التعلّقات.

ث) العمليات Actions

خلال المرحلة الرابعة، ينصب الاهتمام على الجوانب العملية المرتبطة بأجراً الأولويات، وكيفية ترجمتها إلى عمليات قابلة للتنفيذ. وهكذا، تكون أول خطوة هي وضع خطة عمل سنوية لمشروع المؤسسة المندمج في انسجام مع الرؤية المحلية والأولويات والخطة المصادق عليها، كما يتم الانتقال إلى تنفيذها عملياً. تستهدف هذه المرحلة بشكل أساسي أجراً عملية لآليات تنزيل التدابير التي تم وضعها لتحقيق أولويات المشروع، ومن أهم محطات هذه المرحلة:

- تحديد الهدف العام للمشروع وغالباً ما يستمد من رؤية المؤسسة ومن الأولويات المحددة.
- تحديد الأهداف الإجرائية الدقيقة والقابلة للقياس تتضمن النسبة المتوقعة/المستهدف/المعيار/المدة الزمنية؛
- تحديد النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع بالاستناد إلى النتيجة المرجعية موضوع التشخيص، والمدة الزمنية لتحقيقها وتتضمن مؤشرات، واضحة، وقابلة للقياس، والتحقق.
- مخطط عمل تنفيذ المشروع أو ما يصطلح عليه بالآطار المنطقي للمشروع ويتضمن أجراً عملية لتنفيذ التدابير التي تم اقتراحها في المرحلة السابقة، ويمكن تنزيهه على شكل جدول أفقي يتضمن معطيات على التوالي: التدابير/الأنشطة/المتدخلون/المستهدفون/فضاء الانجاز وتاريخه/الوسائل المعتمدة/مؤشرات التتبع/التكلفة المالية.
- جدول توزيع الميزانية التقديرية للمشروع حسب السنوات.

ج) الضبط والتعديل Régulation

ككل المشاريع، قد يعرف تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج تطورات وتقلبات متنوعة على مستوى عند الأجرة؛ الأمر الذي يستدعي توفر لجنة القيادة على وسيلة موضوعية تمكّنها من إجراء التعديلات والتقويمات اللازمة عندما يتطلب الأمر ذلك.

عملياً، فإنّ الوقت العادي والمناسب لإدخال تعديلات على مشروع المؤسسة هو مناسبة وضع المخطط السنوي. لكن، في حالات معينة، يكون مجلس المؤسسة مضطراً للتدخل؛ تفادياً للوقوع في بعض الصعوبات، أو لتدارك وضع ما.

خلال هذه المرحلة يتم اقتراح مجموعة من آليات التتبع والضبط لتعديل وتصحيح مسار المشروع ضماناً لتحقيق أهداف المشروع المندمج وتحقيق امتدادات له في الواقع المدرسي من خلال مقارنة ما تحقق بعد تنفيذ أنشطة المشروع والمؤشرات الواردة في الإطار المنطقي، إلى جانب نتائج التشخيص الميداني المرتبطة بجودة الأنشطة التربوية التي تم تنفيذها، واستثمار مختلف الاحصائيات وخلصات تقارير الاجتماعات وخلصات تقارير اللقاءات التقييمية واستثمار نتائج المراقبة المستمرة.

ولضمان تتبع واضح لنتائج الأنشطة ومدى ملائمتها مع التدابير المقترحة يستحسن تتبع هذه العملية في إطار جداول يمكن من خلالها رصد وتتبع تنفيذ المشروع منذ انطلاقة من خلال تحديد النتيجة المحققة على صعيد كل تدبير، ومقارنته بالنتيجة المنتظرة، وتحديد الاكراهات والعراقيل التي حالت دون تحقيق النتيجة واقتراح تدابير جديدة للتصحيح والتطوير، ويتم هذا في نهاية كل موسم دراسي توفيراً لمعطيات المرحلة السادسة.

ح) المرحلة الانتقالية Transition

على رأس كل ثلاث سنوات، تكون المؤسسة مُطالبّة بإعداد مشروع جديد، برؤية جديدة، وأولويات جديدة، وأهداف جديدة كذلك. ولكي تكون المؤسسة ضمن "المنظمات المتعلمة"، التي تجعل ذكاء ماضيها في خدمة حاضرها ومستقبلها، لا بد من جعل فترة التفكير في المشروع الجديد لحظة للتداول في نتائج وخلصات الحصيلة الإجمالية للمشروع المنتهي.

تتم هذه المرحلة بشكل أساسي تجميع و توطيد المعطيات المحصلة من تنفيذ المشروع بشكل مرحلي (في نهاية موسم دراسي) أو نهائي (في نهاية المشروع) ، وذلك بقصد تحيين وضعية المؤسسة ، فمختلف المؤشرات التي سيتم الوقوف عليها ستشكل لوحة قيادة يمكن استثمارها في تطوير خطة العمل الموسم الدراسي الموالي من خلال تعديل خطة تنفيذ المشروع.

ومن المؤشرات التي يتم استحضارها في هذه المرحلة، مؤشرات تحسن التمدرس بالمؤسسة خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع نموذجاً (نسب النجاح حسب كل مستوى دراسي..)، مؤشرات تحسين جودة التعليمات (نسب التلاميذ الحاصلين على معدل ≤ 10 في المواد العلمية في الامتحان الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي).

أو على مستوى الارتقاء بتنشيط الحياة المدرسية (عدد الأنشطة النشيطة والفاعلة/ عدد التلاميذ المستفيدين بشكل فعلي من أنشطة النوادي...)

هذه المؤشرات تشكل بوصلة لتتبع مسار تنزيل أنشطة المشروع المخطط لها، وغالبا ما تمتد نهاية السنة الدراسية إلى انطلاق الموسم المدرسي الفترة الزمنية لتحليل هذه المؤشرات باعتبارها محطة انتقالية بين موسم دراسي وآخر مما يشكل فرصة لاستمرارية ونسقية المشروع.

وختاما، فإن اعداد مشروع المؤسسة وفق منهجية DEPART الجديدة يقتضي احترام مجموعة من التوجيهات والضوابط المنهجية نوردتها في النقاط التالية:

الانتقال من وثيقة المشروع الكلاسيكية المبنية على الانشاء والاطناب في التأصيل النظري إلى وثيقة مشروع تقنية مضبوطة المراحل وتتضمن مؤشرات واضحة تضمن الانسجام والشمولية والنسقية.

التركيز على المرحلة الأولى والأخيرة في اعداد المشروع، بحيث أن عدد من مشاريع المؤسسات التعليمية يتم بناؤها من من دون تفعيل اجهزة التدبير والحكمة بالمؤسسة، أو تبني على معطيات تشخيصية غير متناسبة مع وضعية المؤسسة، مما يجعل مخرجات المشروع غير متناسقة ولا تدرس بشكل مرحلي انتقالي ضمنا لسيرورة تنفيذ المشروع مما يجعل المؤسسات تنتقل بعد 03 سنوات إلى مشروع آخر يختلف تماما عما تم الاشتغال عليه سابقا.

ان تحرص فرق القيادة على إعداد بطائق تقنية لمختلف أنشطة مشروع المؤسسة المندمج كملحق اضافي تتضمن مختلف معطيات تنزيلها وأجرائها بشكل يسمح بتتبع التنزيل لمختلف أنشطة المشروع.

1.2. مرحلة الانطلاق

أي: انطلاق مسار إعداد مشروع المؤسسة. تستهدف هذه المرحلة أجراً مختلف الآليات التديرية والحكمة بالمؤسسة، التي تتم عادة عند نهاية وبداية كل موسم دراسي؛ حيث تشكل المعطيات المحصلة انطلاقة لمشروع المؤسسة المندمج؛ تلك المعطيات يمكن عرضها في جداول إحصائية مفصلة، تتضمن: مجالس المؤسسة، ومختلف أجهزتها التديرية، وتواريخ تجديدها... وكل المعطيات التي يمكن أن تساهم في التحضير لإعداد المشروع. كما يجب أن تتضمن هذه المرحلة تحديد فريق قيادة المشروع، ومسؤوليات ومهام كل عضو من الفريق. ثم إن عملية تجديد الأعضاء يجب أن تتم بداية كل موسم دراسي في إطار المسؤولية والمحاسبة.


خطاطة تتضمن الأنشطة الأساسية لمرحلة انطلاق إعداد المشروع



1.3. مرحلة التشخيص

في هذه المرحلة، يتم التركيز على المعطيات التي تخدم الإشكالية التي ستم معالجتها في إطار مشروع المؤسسة المندمج. ويُستحسن عرض هذه المعطيات على شكل جداول ومبيانات تتضمن تقديم تشخيص حول الوضعية الراهنة للمؤسسة (تعريف المؤسسة- البنية التحتية- وضعية الموارد البشرية- البنية التربوية- مؤشرات التمدرس- النتائج الدراسية المحققة سابقاً...).

كما يجب أن تتضمن هذه المحطة مختلف الصعوبات والإكراهات التي تعترض تجويد التعلّيمات بالمؤسسة، وتحديد المتحكم فيه وغير المتحكم فيه، إلى جانب تحديد نقط القوة الداخلية والخارجية للمؤسسة وفق الخطاطة الآتية:

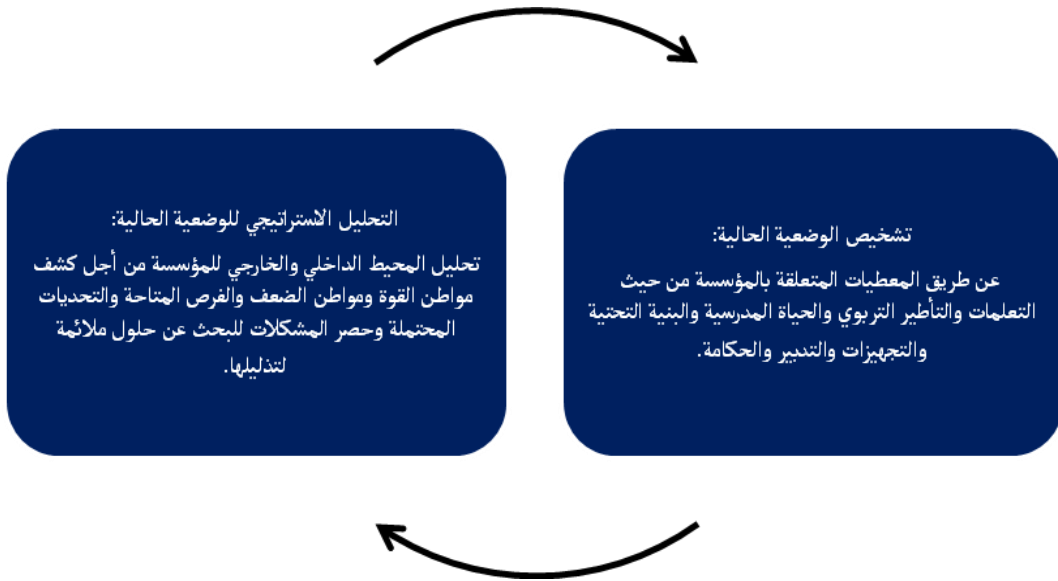

ويتم التحليل الاستراتيجي لواقع المؤسسة من خلال النموذج المتكون من الرباعية التالية، والمعروف بتقنية SWOT: نقاط القوة – نقاط الضعف – الفرص – المخاطر.

وترتكز مرحلة التشخيص على الرصد الدقيق للواقع الحالي للمؤسسة، الذي يشمل جميع المستويات والمعطيات الكمية والنوعية.

• التعريف بالمؤسسة:

اسم المؤسسة	سلك التعليم بالمؤسسة	
الجماعة	رمز المؤسسة	
المديرية الإقليمية	العنوان الإلكتروني	
الأكاديمية الجهوية	الهاتف	

• البنية المادية للمؤسسة.

البنية المادية للمؤسسة	الحجرات					المكتبات الإدارية	المرافق الصحية	الملاعب	الخزانة	قاعة الأساتذة
	التعليم العام	العلمية	المختصة	متعددة الوسائط	المجموع					
المتوفر	العدد									
	الحالة									
الحاجيات										

- البنية التربوية للمؤسسة: يسمح تبويبها وتحليلها بالتعرف إلى مستوى العرض المتوفر، وظروف الاشتغال والمردودية.

• الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة:

الفئة	هيئة التدريس			هيئة الإدارة		هيئة الخدمات	
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	ذكور	إناث
العدد							
المجموع							
ملاحظات							

العدد	المدير	ناظر	حارس عام للخارجية	ملحقون تربويون	مقتصد	كاتب	مساعد تقني

• الإحصاء العام لتلاميذ المؤسسة:

السلك		
ذكور	إناث	المجموع

• توزيع التلاميذ والأقسام:

سلك الابتدائي أو الإعدادي	الأقسام	عدد التلاميذ		التلاميذ الجدد		ذوو الإعاقة	
		المجموع	الإناث منهم	العدد	الإناث منهم	المجموع	الإناث منهم
المستوى الأول							
المستوى الثاني							
المستوى الثالث							
المستوى الرابع							
المستوى الخامس							
المستوى السادس							
المجموع							

ملحوظة: تحذف الأسطر الخاصة بالمستوى الرابع والخامس والسادس في الجدول أعلاه في حالة مؤسسة ثانوية إعدادية.

• التعليم الأولي في حالة وجوده بالمؤسسة:

ملاحظات	المستفيدون		الفضاءات والمرافق الخاصة	عدد القاعات المخصصة	عدد المربيّات	عدد الأقسام
	الإناث	المجموع				

• المتعلمون ذوو الاحتياجات الخاصة:

الإجراءات		عدددهم في الأقسام الخاصة	المدمجون في الأقسام	العدد	نوع الإعاقة
التربوية	التنظيمية				
					
					
					

• المردودية التربوية بالمؤسسة:

النسبة المئوية	غير الملتحقين	النسبة المئوية	المفصولون	النسبة المئوية	المكررون	النسبة المئوية	الناجحون	المستوى
								المستوى الأول
								المستوى الثاني
								المستوى الثالث
								المستوى الرابع
								المستوى الخامس
								المستوى السادس
								المجموع

• الدعم الاجتماعي:

الداخليون		الإطعام المدرسي		النقل المدرسي	
الطاقات الاستيعابية	المستفيدون	الإناث	المستفيدون	الإناث	المستفيدون
المجموع					
النسبة المئوية					
عدد الأطر العاملة			ملاحظات		
الإدارية	التربوية	الأعوان والخدمات			

• خصائص المحيط الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة:

المجال (حضري، قروي، شبه حضري)	الأنشطة الاقتصادية في محيط المؤسسة	توافر فضاءات التنشيط الثقافي والرياضي	توافر جمعيات نشيطة في محيط المؤسسة	الظواهر الاجتماعية البارزة والمؤثرة	موقع المؤسسة بالنسبة للسكان

• مجالس المؤسسة:

المجالس	مشكل	غير مشكل (الدواعي والأسباب)	مفعّل	غير مفعّل (الدواعي والأسباب)	ملاحظات
مجلس التدبير					
المجلس التربوي					
المجالس التعليمية					
مجالس الأقسام					

المستوى	المجال المعرفي	العوائق التعليمية	التدخلات والإجراءات التعليمية- التعليمية المقترحة
الأول			
الثاني			
الثالث			
الرابع			
الخامس			
السادس			

- مستوى الحياة المدرسية:

- شبكة العلاقات والتفاعلات داخل المؤسسة وحولها:

المجال	الفئة المعنية	عدد الحالات	الإجراءات أو القرارات المتخذة
التأخرات	(تلاميذ- مدرّسون- أطر إدارية)		
الغياب			
العنف			
إتلاف الممتلكات			
المجالس التأديبية			

- الدعم التربوي:

المستوى الدراسي	المادة المعنية	عدد المستفيدين	نوع الدعم وطبيعته	الأثر الحاصل	ملاحظات
.....					
.....					

• فضاءات التنشيط التربوي والأنشطة الموازية:

الأهداف	المنخرطون		المنسق	مجال التدخل	اسم النادي
	الإناث منهم	العدد			
					نادي البيئة
					نادي....
					نادي....
					

• الأندية التربوية المتوفرة:

اسم النادي	مشكّل ومفعّل	الإنجازات	الفريق المشرف	غير مفعّل (الأسباب)
نادي البيئة				
نادي الفنون				
نادي				
.....				
.....				

- مجال التواصل مع مختلف الأطراف، وفيما بينها (أساتذة- إدارة- مجالس- جمعية آباء وأمهات التلاميذ- شركاء): نوع التدخلات، عددها، الأطراف المتدخلة، الفئات المستهدفة.

نوع التدخل	الفئة المستهدفة	الجهة المتدخلة	الموضوع	الأثر الحاصل	ملاحظات
لقاءات تواصلية					
حملات تحسيسية					
اجتماعات					
مراسلات					
أبواب مفتوحة					

تعد المعطيات، التي تم الحصول عليها انطلاقاً في عملية التشخيص، أساس إحدى أهم مراحل بناء المشروع؛ بحيث إنها تمكّن من التعرف الدقيق إلى وضعية المؤسسة، وقياس الإنجازات المحققة بغاية تثمينها، والوقوف على نقاط القوة والضعف الحاصل قصد إدخال التعديلات الممكنة وتطويرها أو اقتراح بدائل أكثر فاعلية؛ من أجل الرفع من جودة التعلّات، وتحسين ظروف الحياة التربوية والمدرسية بالمؤسسة. ويتحقق ذلك عبر وضع مخطط استراتيجي، واضح المداخل والأهداف والمتدخلين، يتوخى بناء نظام جودة ملائم لطبيعة وخصوصية المؤسسة، ومعتمد على آليات، وأدوات منهجية، واضحة، ودقيقة.

1.4. مرحلة التوافق على الرؤية المحلية، وتحديد أولويات المؤسسة

في هذه المرحلة يتم تحديد العناصر الآتية:

- أ. تحديد رؤية تروم تجويد التعلّات، وتحسين مؤشرات التمدرس، والارتقاء بالحياة المدرسية؛
- ب. تحديد الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها خلال المواسم الدراسية الثلاثة المقبلة؛
- ت. تحديد التدابير التي سيتم اتخاذها لتنزيل الأولويات المحددة.

1.4.1. معايير اختيار الأولويات:

يجب أن تكون الأولويات:

- أ. منسجمة مع القانون الإطار، ومستجيبة للخصوصيات المحلية؛
- ب. قابلة للتنفيذ الفعلي؛
- ت. مثيرة للاهتمام، ومشجعة على الانخراط؛
- ث. مقبولة من لدن جميع المعنيين بالمشروع.

1.4.2. الارتفاعات الأربع لترتيب الأولويات:

- أ. الارتقاء بالتعلّات، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والتواصل؛
- ب. الارتقاء بالحياة المدرسية والنوع والإدماج الاجتماعي؛
- ت. البنية التحتية والتجهيزات؛
- ث. التدبير والشاركة.

2. مرحلة التخطيط النسقي لعمليات مشروع المؤسسة المندمج، وتنزيلها:

وتشمل المحطات الآتية:

- أ. تحديد الهدف العام للمشروع؛
- ب. تحديد الأهداف الإجرائية الدقيقة والقابلة للقياس؛

ت. وضع مخطط عمل تنفيذ المشروع؛

ث. تسطير جدول توزيع الميزانية التقديرية للمشروع حسب السنوات.

2.1. أهداف التخطيط النسقي للعمليات:

يتم تخطيط العمليات من أجل:

- أ. تدقيق الأولويات عن طريق ترجمتها إلى أهداف، يتم تخطيط العمليات على أساسها؛
- ب. توقع نتائج المشروع، وتحديد المؤشرات من خلال الأهداف أو النتائج المنتظرة؛
- ت. تحديد العمليات والأنشطة الملائمة لتحقيق الأهداف (النتائج) المشتقة من الأولويات؛
- ث. تدوين البيانات المتعلقة بالمشروع على منظومة "مسار".

2.2. التخطيط النسقي:

يتميز التخطيط بخاصية الترابط النسقي بين العمليات وفق الخطاطة الآتية:



3. مرحلة الضبط والتعديل والتقويم:

تعتبر هذه المرحلة بمثابة وقفات مهمة للتتبع والضبط على امتداد مراحل المشروع، وأثناء تخطيط عملياته وتنزيلها. فالتتبع والتقويم يلعبان دورا رئيسا في تأمين نجاح أي خطة؛ حيث يتم اقتراح مجموعة من آليات التتبع والضبط لتعديل وتصحيح مسار المشروع؛ ضمانا لتحقيق الأهداف المسطرة، وتحقيق امتدادات للمشروع في الواقع المدرسي. والجدول أسفله يوضح موضوع ونتائج التتبع والتقويم:

عمليات الضبط والتتبع والتقييم	الموضوع	النتيجة
تتبع مستمر لإنجاز خطة العمل السنوية خلال فترات منتظمة	- النتيجة المحققة في فترة محددة. - المعوقات التي اعترضت سبيل الإنجاز.	- تصويب العمليات وضبطها. - البحث عن حلول لتحسين الإنجاز.
تقويم مشروع المؤسسة المندمج	تقويم التصميم والإنجاز والنتائج في ضوء الأهداف المحددة للمشروع.	استثمار التقويم في اتخاذ قرار بإعداد مشروع مطوّر.

تصميم لوحة قيادة التتبع:

تشكل لوحة قيادة تتبع تنزيل مشروع المؤسسة المندمج من مصفوفة لها محوران:

- محور عمودي يتضمن الرافعات ومجالاتها؛
- محور أفقي يشتمل على العناصر التي سيتم إدخالها في لوحة القيادة.

4. مرحلة الانتقال من المشروع المنتهي إلى مشروع مطوّر:

تتم هذه المرحلة، بشكل أساس، تجميع المعطيات المحصّلة من تنفيذ المشروع، وذلك بقصد تحيين وضعية المؤسسة؛ فمختلف المؤشرات، التي سيتم الوقوف عليها، ستشكل لوحة قيادة يمكن استثمارها في تطوير خطة العمل للموسم الدراسي الموالي؛ من خلال تعديل خطة تنفيذ المشروع.

4.1. أسئلة مفيدة لإنجاز الانتقال:

أ. ما درجة انخراط الأطراف المعنية في المشروع حسب الخطة المعدّة؟

ب. ما هي الوسائل والموارد المتاحة لإنجاز عمليات المشروع؟

ت. ما الذي تحقّق جزئياً؟ وما الذي لم يتحقّق؟ ولماذا؟

ث. ما هي العمليات والتدابير التي يجب استثمارها لتحسين العمل مستقبلاً؟

4.2. وسائل الحصول على معلومات من أجل الانتقال:

أ. دراسة نتائج تقويم المشروع المنتهي؛

ب. استثمار التوصيات المستخلصة من نتائج تقويم المشروع المنتهي؛

ت. الاطلاع على المحاضر والتقارير المتعلقة بالمشروع المنتهي؛

ث. دراسة نتائج التعلّيمات المدرسية والخدمات المقدمة في نطاق الحياة المدرسية؛


ج. تقاسم الأعمال والإنجازات والدروس المستخلصة من المشروع المنتهي؛

ح. تقصي آراء المعنيين والمشاركين عبر استمارات ومقابلات.

أ- بناء البرنامج السنوي للأنشطة وتفعيله:

يمثل «البرنامج السنوي» برنامج العمل الخاص بكل سنة دراسية من مشروع المؤسسة المندمج الممتد على ثلاث سنوات. ومن خلال هذا البرنامج تصبح أهداف الأنشطة اليومية أكثر وضوحا ويصبح تحديد الموارد البشرية والاقتصادية والمادية الضرورية عملية ملموسة أكثر. كما أنه يتيح أجراً تتبع الأنشطة وتقويمها على نحو يتيح تحسين برنامج عمل السنة الموالية. إضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بوضع أهداف تهم تطور التلاميذ والتلميذات اعتماداً على برنامج أنشطة يسهل تتبع تدرجه.

يتم بناء البرنامج السنوي للأنشطة من خلال وضع الأهداف الشهرية للأنشطة وتحديد محتوياتها، وذلك على النحو التالي:

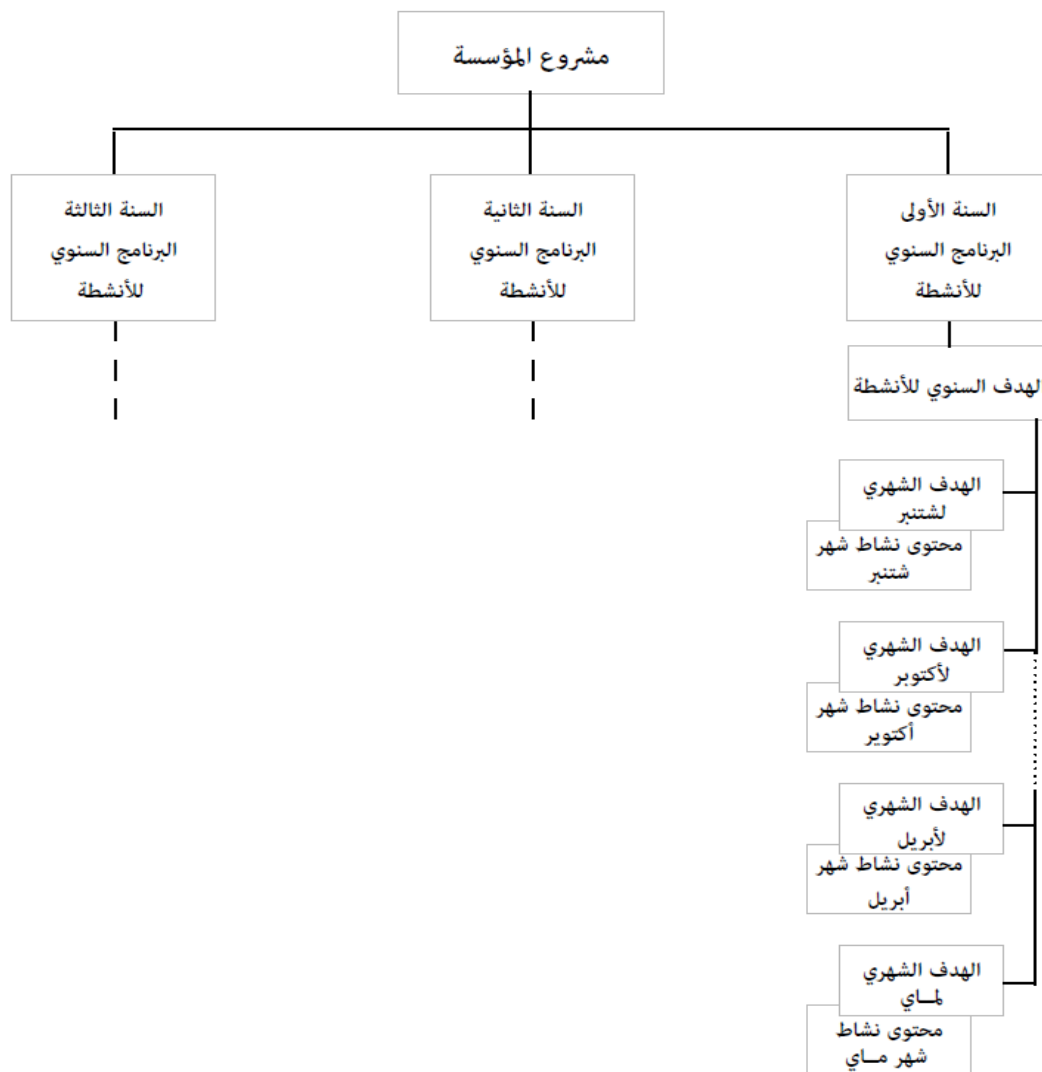

1- بناء البرنامج السنوي:

تتم صياغة البرنامج السنوي اعتمادا على مضامين مشروع المؤسسة المندمج كما تقدمها بطاقة مشروع المؤسسة، التي تبرز العلاقة بين "المنظور المحلي" و"الأولويات" و"النتائج المنتظرة" و"محتوى الأنشطة المقترحة":

في المرحلة الممتدة من 2017 إلى 2020 ستعمل مؤسستنا على تربية التلاميذ على الاعتزاز بالثقافة المحلية والقيم الإنسانية وعلى مساعدتهم على اكتساب المهارات الأساسية في الكتابة والقراءة والحساب من خلال إغناء كل من الأنشطة التربوية والتعليمية وأنشطة الدعم، اعتمادا على تحسين طرق التدريس؛ كما ستعمل على الانفتاح على المحيط الخارجي.	المنظور المحلي
هناك العديد من التلاميذ الذين لا يستطيعون مسايرة الحصص الدراسية نتيجة ضعف مهاراتهم الأساسية في القراءة والكتابة مما يؤدي إلى تكرارهم للسنة أو انقطاعهم عن الدراسة.	أولوية 1
هناك العديد من التلاميذ الذين لا يعيرون اهتماما للقيم الإنسانية والتقاليد والأعراف الخاصة بالمجتمع المحلي. مما يؤدي إلى تدني مستوى العلاقات بين الأفراد الشيء الذي يحول دون بناء مجتمع يسوده الأمن والأمان.	أولوية 2
تمكن التلاميذ من اكتساب المهارات الأساسية في الحساب والقراءة والكتابة الخاصة بالسنة الدراسية.	أولوية 1/نتيجة 1
التقليص من عدد التلاميذ المكررين نتيجة تدني مستوى تعلماتهم.	أولوية 1 /نتيجة 2
الرفع من عدد التلاميذ الذين يولون أهمية للتقاليد والأعراف الخاصة بالبلد أو المنطقة ويتعرفون تاريخهما.	أولوية 2/نتيجة 1
الرفع من عدد التلاميذ الذين رغم اختلاف رأيهم يميلون إلى احترام الرأي الآخر وتقبله.	أولوية 2/نتيجة 2
الأجراة اليومية لأنشطة التحكم الخاصة بمهارات الحساب الأساسية باستعمال بطاقات الأعداد.	أولوية 1/نتيجة 1/نشاط 1
أجراة الدعم الخاص بمادتي اللغة العربية والفرنسية، والحساب كل يوم سبت لفائدة التلاميذ ذوي النتائج المتدنية.	أولوية 1 نتيجة 2/نشاط 2
ينجز التلاميذ عرضا مرة كل أسدس حول ما تعرفوا عليه من ثقافة وتاريخ عن طريق الساكنة المحلية.	أولوية 2/نتيجة 1/نشاط 1
تربية التلاميذ على ملكة العمل الجماعي والاحترام المتبادل والعمل صوب تحقيق هدف مشترك أثناء مزاولة تداريب النادي الرياضي.	أولوية 2/نتيجة 2/نشاط 2

من خلال النتائج المنتظرة من مشروع المؤسسة المندمج الممتد على ثلاث سنوات تتم صياغة أهداف البرنامج السنوي على نحو ملموس في صيغة أفعال يقوم بها التلاميذ. وكل نشاط يوافق هدفا محددا يتم تحقيقه خلال السنة، كما يمكن أجراة الأنشطة خلال سنتين (السنة الأولى والسنة الثانية) حيث يتم تجزئ الهدف حسب كل سنة دراسية.

يبين الجدول التالي أجراة هدف في مشروع المؤسسة المندمج يخص نادي الرياضة:

السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	النتائج المنتظرة
الهدف	الهدف	الهدف	
تشجيع التلاميذ لبعضهم البعض والعمل كمجموعة واحدة اتجاه تحقيق هدف مشترك.	تعاون التلاميذ من أجل إعداد قائمة للتدريبات ثم أجرائها.	احترام قواعد اللعبة والاستمتاع بها.	أولوية 2/ نتيجة 2

• تحديد الأهداف الشهرية للأنشطة :

يتم إعداد الأهداف الشهرية على نحو متدرج وملحوس من خلال أجراً الهدف السنوي. وتتجلى أهمية تحديد أهداف شهرية في إمكانية الاشتغال المتدرج من أجل تحقيق الهدف السنوي. وليس من الضروري دائماً إعداد أهداف وأنشطة خاصة بكل شهر، بل يمكن الاستمرار في أجراً نفس النشاط على امتداد أشهر بغية تحقيق نفس الهدف.

الهدف: احترام قواعد اللعبة (كرة القدم) والاستمتاع بممارستها		
الشهر	الهدف الشهري	محتوى الأنشطة الشهرية
شتنبر	تحديد المشاركين في أنشطة النوادي	عرض محتوى أنشطة النوادي على التلاميذ والشروع في تسجيل التلاميذ.
أكتوبر	التأكد من قواعد اللعبة مع المشاركة في مباراة	• استعمال الأساتذة للعدة المناسبة في عرض قواعد اللعبة على التلاميذ. • تكوين مجموعة أولية وتنظيم مباراة للاستئناس
نونبر	التدريب على المهارات الأساسية للمشاركة في مباراة	يقوم الأساتذة بشرح طرق المرافعة، تمرير الكرة وغيرها من المهارات الأساسية.
.	.	.
أبريل	تكوين الفرق والتدريب قصد المشاركة في دوري كرة القدم	تكوين فرق متناسقة ومتجانسة
ماي	مشاركة الفرق في الدوري	تدبير وإدارة فعاليات دوري كرة القدم داخل المؤسسة.

بعد بلورة برنامج الأنشطة يتم البدء الفعلي في أجرائها. وخلال سيرورة الأجراً يتم عقد لقاءات دورية والتواصل اليومي بين المدير والأطر التربوية لمناقشة محتويات الأنشطة قصد توحيد الرؤية والتدخل كلما اقتضى الأمر لضبط العمليات. وأثناء تلك اللقاءات، يكون التلميذ محور الانتباه ويتم تتبع التغيرات التي تطرأ على سلوك التلاميذ ومدى تحسنه. ويعتبر تتبع كل تلميذ على حدة وسيلة أساسية لضمان تحقيق الأهداف.

مرحلة الضبط:

يقوم الضبط على آيتين هما التتبع والتقييم:

✓ التتبع وسيلة لمعرفة سير المشروع، ومدى تحقق أهدافه خلال مدة إنجازه، ويهم الإنجاز وسيرورة الإنجاز معا. ويهدف التتبع إلى رصد الاختلالات في الإنجاز من جهة وإلى التقييم المرحلي لمدى ملائمة المنجزات مع الأهداف، مما يتيح القيام بالتصويبات اللازمة. والتتبع يبدأ مع بداية إنجاز المشروع.

❖ التقييم تقدير منظم ونسقي للمشروع، وينصب على المنجزات من حيث تحقيقها ونتائجها وآثارها ووقعها. وهذا التقييم يمكن من تقدير الفعالية والنجاعة والاستدامة الناتجة عن المشروع.

ويستند الضبط إلى سؤالين موجهين أساسيين:

✓ هل تم إنجاز الأنشطة المبرمجة كما تمت برمجتها؟

✓ هل تحققت النتائج المرجوة والتغيير المنشود كما تم تصورهما؟

* ويكون التتبع والتقييم سنويين يهمن البرنامج السنوي وإجماليين يهمن مشروع المؤسسة المندمج في جملته:

• تتبع وتقييم البرنامج السنوي

يعتمد تتبع البرنامج السنوي وتقييمه على مؤشرات السيرورة والتقييم المرحلي، وهي تهم تحقيق العمليات المسطرة في حينها، كما تم تسطيرها، وتهم أيضا التحقيق المرحلي للأهداف المسطرة مثل نسبة معدلات النجاح، نسبة التكرار، نسبة الغياب، إلخ. ويمكن حصر هذه المؤشرات سنويا من وضع حصيلة مرحلية تسمح بالتدخل من أجل التصحيح؛

يمكن لمدير المؤسسة التحقق من بلوغ أهداف الأنشطة من خلال التقارير الشهرية التي يقدمها له الأستاذ المسؤول عن تدبير الأنشطة والتي تتضمن ملاحظاته والتغيرات السلوكية الحاصلة لدى التلاميذ. ومن المهم استطلاع آراء التلاميذ أيضا وعدم الاكتفاء بآراء الأساتذة الواردة في التقارير، مما يتيح الفرصة للتلاميذ للوقوف على تطورهم؛

انطلاقا من النتائج المسجلة والموثقة وبناء على التغيرات الحاصلة لدى التلاميذ، يستطيع مدير المؤسسة تقويم مدى تحقيق الهدف المرسوم، كما يظهر من خلال المثال التالي: «80 في المئة من التلاميذ باستطاعتهم فهم واحترام قواعد لعبة كرة القدم والاستمتاع بها ولكن 20 بالمئة من التلاميذ لم يستوعبوا قواعد اللعبة ولوحظ لديهم نوع من الأنانية». وبعد إنجاز تقويم سنوي للأنشطة يدلي مدير المؤسسة بالنتائج المسجلة لكل من مجلس تدبير المؤسسة والمديرية الإقليمية.

هذه المبادئ كلها ضمن إطار عام هو إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الثقافي، والاقتصادي، والبشري، والطبيعي.

وأهم ما أتى به نظام الشراكة هو العمل على تحقيق مدرسة منسجمة مع محيطها وتغيير الرؤية لعلاقة المدرسة مع كل من كان يعتبر شريكا لها من قبل.

ثانيا: صيغ الشراكة

للشراكة عدة صيغ نذكر منها:

- بناء علاقات بين أشخاص ينتمون إلى مؤسسات مختلفة، ويتبادلون خدمات شخصية؛
- الالتزام الشخصي بين شركاء لهم إمكانية تنفيذ هذا الالتزام داخل مؤسساتهم، دون انخراط فعلي للمؤسسات المنتمين إليها؛
- دعم مؤسساتي للمساعدة في تنفيذ بعض النصوص القانونية والتنظيمية؛
- التدخل الظرفي لمهنيين من الخارج (خبراء في مجال معين) لمساعدة بعض الفاعلين التربويين لإنجاح خطة عمل؛
- اللجوء إلى متخصصين في نشاط معين، أو مهنة معينة لبسط تجاربهم وتقديم الجانب العملي والواقعي منها؛
- التعاون بين شركاء خارجيين عن المؤسسة التعليمية لبناء وقيادة الفعل التربوي والمساهمة في إنجاز وإنجاح مشاريع عمل.

ولتجسيد الصيغ السالفة، يطرح ميريني C. MERINI، صنافاً للشراكة Typologie du partenariat من خلال ثلاث شبكات كبرى، أطلق عليها شبكات الانفتاح والتعاون Réseaux d'Ouverture et de Collaboration (ROC):

- الصنف الأول (ROC1): يتجلى من خلال تدخل لحظي لمهنيين داخل أو خارج المؤسسة (خبراء في مجال معين) لتقديم خدمة في مرحلة من مراحل برنامج العمل؛
 - الصنف الثاني (ROC2): اللجوء إلى متخصصين في نشاط معين، أو مهنة معينة لتقديم تجربتهم في الميدان، وتستمر هذه العملية لفترة محدودة نسبياً؛
 - الصنف الثالث (ROC3): يتم من خلالها توزيع المسؤوليات وتحديد المهام بين شركاء متعددين، مما يقود إلى بناء شراكة حقيقية تتجسد من خلال القيادة الجماعية وتنويع العلاقات وتستمر لفترة طويلة.
- وإذا كان الصنف الأول والثاني يتم اللجوء إليه قصد الحصول على بعض الخدمات الظرفية، فإن الصنف الثالث "يتطلب تفاوضاً حقيقياً لتحديد الأهداف والمهام والوسائل".

وتختلف طبيعة التعاقد بين الشركاء، حيث يمكن أن يكون ضمنيا في بعض الحالات التي تنحصر في تحديد تواريخ لإنجاز تدخلات معينة، أو مصرحا به من خلال سيرورة من التفاوض المستمر حول خطط عمل ومشاريع مشتركة يتم تجديدها وتطويرها انطلاقا من التقويم والتنظيم المرحلي.

ثالثا: شركاء المؤسسة التعليمية:

يمكن رصد أهم شركاء المؤسسة التعليمية من خلال ما يلي:

أ. الأسرة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ:

تتدخل الأسرة في الحياة المدرسية بصفتها معنية بتتبع المسار الدراسي لأولادها، ويتم ذلك بكيفية مباشرة وفي تكامل وانسجام مع المدرسة، ويكون هذا التتبع مفيدا في تشخيص التعثرات في حينها واتخاذ التدابير المناسبة لتجاوزها. ومن جهة أخرى، تساهم الأسرة في توضيح اختيارات التلميذ وتوجيهاته الدراسية والمساهمة في بلورتها انطلاقا من ميوله ومؤهلاته لإعداد مشروعه الشخصي.

أما جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، فتعتبر هيئة مساهمة في تنظيم وتنشيط الحياة المدرسية وطرفا مساهما في تدبيرها. كما أن دورها أساسي في ربط الأسرة بالمدرسة والمشاركة في أنشطتها ومشاريعها.

ب. الجماعة المحلية:

تعتبر الجماعة المحلية من الشركاء المعنيين بأمر المؤسسة التعليمية بحكم أنها تمثل السكان، وبحكم أن المؤسسة تقع ضمن نفوذها الترابي. وعلى هذا الأساس، فهي حاضرة في مجالس المؤسسة، وبالتالي مساهمة في خدمة هذه الأخيرة عن طريق دعم مشاريعها وأنشطتها المختلفة وتوفير الظروف المناسبة لإشعاعها.

ج. الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون:

يعتبر دور الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أساسيا في تحقيق التنمية الاجتماعية وربط المؤسسة التعليمية بمحيطها. لذا فإن المؤسسة التعليمية مدعوة لإقامة شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، في أفق توفير الشروط الداعمة لانفتاحها على محيطها، وتمكين المتعلم من التعرف على بيئته والاندماج فيها.

رابعا: فوائد المسعى التشاركي:

يسعى المسعى تشاركيا عندما يتم إشراك مجموع الفرقاء سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ليس فقط في برمجة وإعداد الأنشطة والخدمات، وإنما كذلك في سيرورة التنفيذ والضبط والتعديل لهذه الخدمات. ويكتسي المسعى التشاركي أربع فوائد أساسية:

ضمان اقتسام المعلومات وتحيين المعرفة بالحقائق وبانتظارات الشركاء وبحاجيات المستهدفين؛

الرفع من فعالية وجودة الخدمات وضمان تقوية انخراط الشركاء؛

إقامة دينامية جديدة مبنية على مقاومة الحدود التقليدية المقامة بين المؤسسات والمنظمات والأفراد؛

إرساء أطر هيكلية وسلوكية وأنشطة جديدة توفر الفوائد لكل الأطراف المتعاونة.

خامسا: القواعد الأساسية للشراكة

إذا كانت الشراكة من أهم المبادئ التي بني عليها "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، وتشكل في نفس الوقت تحديا وانشغالا لجميع الفرقاء لما لها من أهمية في تنظيم الحياة المدرسية، فإننا نعتقد أن الشراكة الناجحة تتطلب مجموعة من القواعد الأساسية والمواثيق الأخلاقية التي يجب أن تحكم كل تعاون وتشارك بين الهيئات والإطارات ذات الطبيعة التربوية والاجتماعية والاقتصادية. ويمكن حصر هذه القواعد فيما يلي:

إن تحقيق الأهداف التربوية يجب أن يكون حاضرا في مختلف مشاريع وبرامج الشراكة سواء بشكل ضمني أو بشكل صريح؛

أثناء الانفتاح على المحيط، لايجوز إعطاء الأولوية لطرف على حساب الآخر، فتنوع الشركاء وتعدددهم يجعل الجهود تتكامل والطاقات تتساند؛

يجب دعم التجارب الانفتاحية الناجحة، والبحث عن أخرى من خلال بناء علاقات مع شركاء خارجيين وتنظيم لقاءات للتفكير والتشاور والنقاش المفتوح حول هذه المسألة داخل المؤسسة التعليمية؛

تحديد المعايير المؤسسية من أجل تأطير أحسن لعمليات الانفتاح والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وتصويب العملية التشاركية للبحث عن حلول لبعض المشاكل التربوية والاجتماعية، خاصة المشاكل المتعلقة بالتعثر والدعم الدراسي بكل أشكالهما؛


لا يجوز أن تتم العملية التشاركية على حساب الوظيفة التعليمية، بل يجب أن تصبح مصدرا إضافيا للتعليم والتأهيل، وربحا حقيقيا للمجهودات المستثمرة والمبدولة؛

كل أشكال وأنماط التعاون يجب أن تحترم استقلالية المؤسسة التعليمية والهوية المهنية لمختلف الفاعلين بداخلها ولا "يجوز بأي حال من الأحوال أن يدخل هذا الانفتاح المؤسسة التعليمية في حركية سوسيوتربوية وثقافية زائدة تفقدها هويتها التربوية والاجتماعية..."

نخلص من خلال ما سبق، إلى اعتبار الشراكة آلية من آليات التدبير الحديثة للتبادل والتفاعل المنظم ليس فقط بين المؤسسات والمنظمات، ولكن أيضا بين الأفراد والجماعات، تقوم أساسا على التقاء إرادة أو إرادات في مجالات معينة قصد تنفيذ أنشطة أو خدمات.

المحور الخامس: مسار إنجاز مشروع المؤسسة المندمج وتتبعه وتقويمه

أولاً: مسار مشروع المؤسسة⁵³

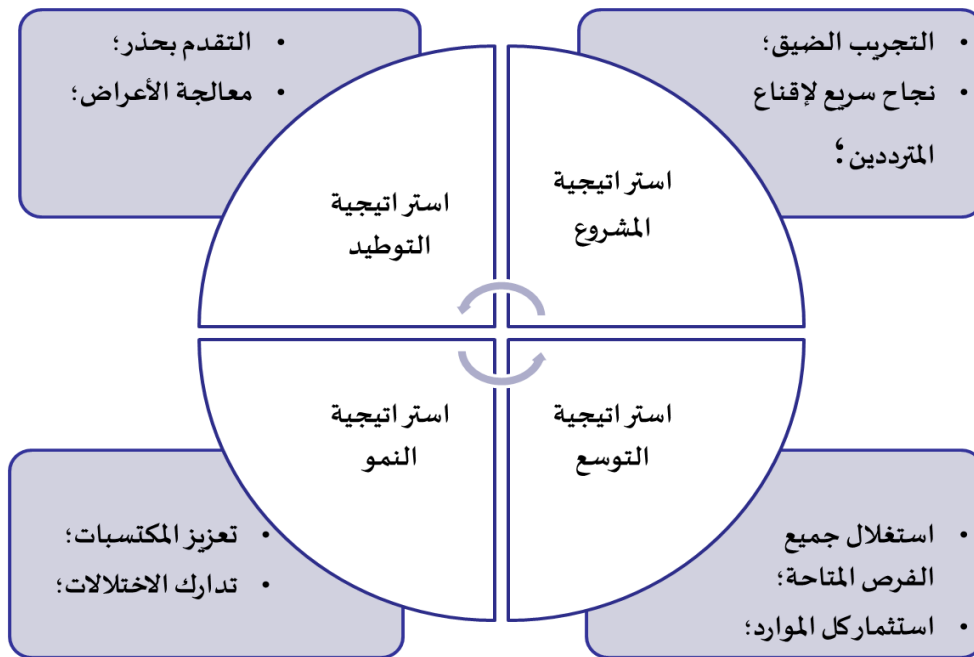

1. داخل المؤسسة:

- يختار مدير ومديرة المؤسسة أعضاء فريق القيادة؛
- يعمل مدير ومديرة المؤسسة التعليمية على:
 - أ - تعبئة المدرسين والمدرسات، ليأخذوا بعين الاعتبار أولويات "مشروع المؤسسة"؛
 - ب- إمكانية التشاور مع التلميذات والتلاميذ في كل مرحلة من مراحل المشروع؛
 - ج- إشراك شركاء المؤسسة التعليمية في كل المراحل
 - توثيق كل مرحلة من مراحل المشروع الأربعة؛
 - التشاور مع مجالس المؤسسة (المجلس التربوي والمجلس التعليمي) في برمجة الأولويات والأنشطة ؛

⁵³ - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، دليل قيادة مشروع المؤسسة، ص: 11-13.

- التأكد من أن المشروع يستجيب للمعايير المنهجية، ويمكن في هذا الإطار أن يتشاور مدير ومدير المؤسسة مع المواكب(ة)، وأن يحضر تقريراً مشتركاً في الموضوع.
- معايير المصادقة الأولية:
- ✓ هل تندرج رؤية المشروع أو المنظور المحلي، مع توجهات الوزارة؟، أي:
- منسجمة مع الأهداف الوطنية؛
- مع الاختيارات الاستراتيجية للأكاديمية؛
- تتوخى تجويد التعليمات.
- ✓ هل تم إعداد المشروع بمقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية؟
- ✓ هل تم القيام بتحليل جيد؟، أي:
- الاهتمام بالبيئة الداخلية للمؤسسة والبيئة المحيطة بها؛
- تفحص نقاط القوة والعقبات.
- ✓ هل تم تحديد الأولويات بشكل جيد؟، أي:
- عدد محدود من الأولويات (من الأجدر أن لا يتجاوز ثلاث أولويات) ؟
- نتائج منتظرة واقعية ومصاغة بوضوح ؟
- ✓ هل الإجراءات:
- محددة في خطة عمل واضحة وقابلة للإنجاز؟
- مدعمة بموارد بشرية ومالية متوفرة أو الممكن توفيرها؟
- ✓ هل الضبط (التتبع والتقييم)
- يرصد تتبع الأنشطة المبرمجة ومؤشرات تحقيق النتائج المنتظرة؟
- يعرض مدير ومدير المؤسسة المشروع على أنظار مجلس التدبير قصد المصادقة الأولية؟
- يستحضر مجلس التدبير المعايير المذكورة أعلاه، ويمكن أن يضيف إليها مجموعة ثانية من المعايير، التي سيتم تناولها من قبل النيابة:
- يصادق مجلس التدبير على مشروع المؤسسة، أو يطلب من المجلس التربوي أو المجلس التعليمي إدخال تغييرات معينة.

- ضرورة إرفاق وثيقة "مشروع المؤسسة" بمحضر المصادقة الأولية للمشروع والتقرير المشترك للمواكب(ة).

2. خارج المؤسسة:

- يقدم مدير ومديرة المؤسسة المشروع لدى النيابة، مرفقا بمحضر المصادقة الأولية لمجلس التدبير وتقرير المواكب(ة)؛

- إذا تمت المصادقة النهائية على المشروع، يخبر النائب والنائبة مدير(ة) المؤسسة في شأن المصادقة النهائية، ويدعوه للتعاقد مع النيابة؛

- بناء على قرار المصادقة النهائية، تبرمج النيابة الدعم المالي أو المادي أو البشري لإنجاز المشروع؛

- تقوم المؤسسة بتنفيذ الإجراءات والأنشطة المبرمجة في المشروع؛

✓ هل ينسجم المنظور المحلي لمشروع المؤسسة، مع توجهات الوزارة؟

- أي بشكل أوضح، هل التعلّمات المستهدفة مرتبطة بالتوجهات الوطنية؟

✓ كيف يمكن للإجراءات المبرمجة أن تأخذ في الاعتبار وضعية:

- التلميذات ؟

- التلاميذ في وضعية إعاقة وكل فئة في وضعية صعبة ومهددة بالهدر المدرسي أو التكرار؟

- يمكن أن تعيد النيابة مشاريع المؤسسات التي تفتقد لبعض المعايير، وذلك عبر رسالة تتضمن ملاحظات واقتراحات تعديلية للمشروع في أجل زمني محدود؛

- يقوم مدير ومديرة المؤسسة بعرض المشروع الذي تم رفضه على أنظار مجلس التدبير وفريق القيادة لمراجعته، وبعد إدخال التعديلات الضرورية، يتم وضع النسخة المعدلة لدى النيابة مرفقة بمحضر مصادقة مجلس التدبير؛

- عند مصادقة النيابة على عملية المراجعة، يتم إخبار مدير(ة) المؤسسة بذلك، وتقديم الدعم اللازم له؛

- خلال مرحلة أجراً المشروع، يقوم مدير المؤسسة بتسجيل المعطيات الضرورية في لوحة القيادة المعلوماتية، وذلك لتمكين النيابة والأكاديمية والمصالح المركزية من تتبع تطور إنجاز المشروع.

4. تقييم مشروع المؤسسة:

يعتمد التقييم الإجمالي لمشروع المؤسسة المندمج على مؤشرات الإنجاز، وهي تمكن من قياس الفرق بين الإنجاز وبين الأهداف، كما تمكن من تقييم الآثار والواقع في أفق تسطير مشروع مقبل. ويستند إلى الأولويات مدخلا لرصد تحقق العمليات المسطرة.

ثالثا: مؤشرات مرجعية لمشروع المؤسسة⁵⁵

يتم تتبع وتقييم مشاريع المؤسسات على كل مستويات المنظومة من خلال لوحة للقيادة، مدمجة في المنظومة المعلوماتية المركزية، تمكن من تتبع تطور المؤشرات إقليميا وجهويا ووطنيا. ولكي يتمكن كل مستوى من مستويات المنظومة من تتبع درجة تحقيق أهداف المشاريع، وتأثيرها على المسار التعليمي للتلاميذ والتلميذات، يتعين رصد مجموعة من المؤشرات، على ضوء بيانات منظومة مسار والإحصائيات الرسمية للوزارة، ونذكر من بينها:

- نتائج التحصيل وخاصة في اللغات والرياضيات على المستوى الابتدائي؛
- تطور معدلات النجاح في جميع المواد والمستويات؛
- نسبة الالتحاق بالسلك الإعدادي من الحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية؛
- نسبة الالتحاق بالسلك التأهيلي من الحاصلين على شهادة السلك الإعدادي؛
- نسب استكمال التمدريس في التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي؛
- نسب التكرار في كل مستوى من التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي؛
- نسب الانقطاع في كل مستوى من التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي؛

التأهيلي؛

- المساواة من خلال تناسب بين عدد الذكور وعدد الإناث؛
- نسبة توجه التلاميذ والتلميذات إلى الشعب والمسالك العلمية والتكنولوجية؛
- عدد الساعات السنوية لغياب التلاميذ والأساتذة والإداريين؛
- اشتغال الأندية التربوية ونسبة مشاركة التلميذات والتلاميذ فيها؛
- نسبة تمدريس التلاميذ والتلميذات في وضعية إعاقة، وعدد المرشحين والناجحين منهم في الامتحانات الإشهادية.

⁵⁵ - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المذكرة رقم 14/159 الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2014، في شأن أجراة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، ص 6-7.

ولضمان ملائمة وفعالية آلية تتبع وتقويم مشاريع المؤسسات، لا بد أن تعتمد المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات هذه المؤشرات وغيرها، كمؤشرات مرجعية، قبل إعداد مشاريع المؤسسات، وكمؤشرات مستهدفة أثناء إنجاز المشاريع، وذلك ليسهل قياس تطورها مع مرور السنوات الدراسية.

رابعاً: أغراض تقييم مشروع المؤسسة⁵⁶

توجد العديد من المبررات والضرورات والمكاسب وراء عملية التقييم للمشروعات والتي تقف وراء إجراء عملية التقييم، وتتمثل أساساً في غرضين رئيسيين يرمز لهما العصا والشعلة STICK AND TORCH بمعنى أن الغرض من التقييم يمكن أن يكون مقياساً حول تحسين المشروع، وشعلة بغرض تبرير المشروع.

1. القياس بغرض المساءلة: Accountability

أي أن الغرض الأول من إجراء عملية التقييم لأي مشروع هو القياس بغرض المساءلة، ومن هنا جاء المعنى المرادف لهذا الغرض حين يشار إليه بالعصا أو المقياس، أي عصا القياس والتي يمكن أن تستخدم لتبرير وجود المشروع منذ البداية، وتبرير عمله واستمراره. والمعنى الضمني وراء ذلك أن التقييم عملية فحص تفتيش وبغرض الحكم على المشروع، وأن الهدف هو تعظيم قيمة النقود ومعايير الجودة وأن المشروع واعد.

2. تحسين المشروع: Improvement

يمثل الغرض الثاني من التقييم تحسين المشروع، حيث يمكن النظر إليها على أنها عملية تطويرية، أي شعلة أو مشعل ضوء تساعد في حل المشاكل وتوضح الممارسات الجيدة. والمعنى الضمني وراء ذلك هو أن التقييم يستهدف تشخيص وتفسير للواقع، بغرض تراكم التعلم أو التعليم التراكمي، كما أنها عملية تقلل من احتمال تكرار الأخطاء، والاستفادة من الأخطاء عندما توجد حيث ينظر لها نظرة نقدية للتعلم منها.

والحقيقة أن التقييم يمكن أن يأخذ أحد هذين المنهجين، إما أن يكون منهجاً تطويرياً أي يجرى بغرض تحسين أداء المشروع، أو منهجاً تفتيشياً (فحصياً). وكلاهما له صلاحيته ومبرراته، اعتماداً على الإطار الذي تقوم فيه والغرض الذي يجرى التقييم من أجله.

ومع ذلك فقد أصبح المنهج التطويري أكثر شهرة من المنهج التفتيشي، خاصة وأن كثيراً من المديرين ليسوا سعداء بمنهج المساءلة أو المحاسبة (المنهج التفتيشي). لكن من الملاحظ أنه في بعض الأحيان يكون منهج المساءلة مطلوباً بالحاح خاصة في المشروعات التي تحقق مصلحة عامة يجب حمايتها. ورغم أهمية هذا المنهج في مثل هذه المشروعات لدورة كعملية فاعلة لتبرير النفقات، إلا أنه أقل فاعلية في التخطيط طويل الأجل للاستثمارات.

⁵⁶ - محمد البنا، محاضرات في تقييم المشروعات، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، ص 18-20.

أخيراً تجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان يصعب وضع حد فاصل بين هذين المنهجين، لأن أي منهما يتضمن عناصر من الآخر. فالتقييم الذي يجري على أساس عصا القياس أو تحديد المسؤولية والمحاسبة يمكن أن يستخدم في التخطيط للمستقبل وتطوير المشروع. كما أن التقييم الذي يتم وفقاً لمنهج المشغل أي كشف العيوب والأخطاء وإحداث التطوير يمكن أن يستخدم في المساءلة والمحاسبة.

لذلك فإن الاختلافات ليست هي المهمة، ولكن الاختلاف الأهم هو الروح التي تجري على أساسه عملية التقييم. فعندما نسأل عميلاً وعادة ما يكون المدير: لماذا ترغب في تقييم مشروعك؟ هل للمساءلة أم للتحسين؟ فإن الإجابة ربما ستكون الإثنان معاً. ورغم أن ذلك من الممكن نظرياً، إلا أنه صعب من الناحية العملية، ولذلك فالأمر يتطلب أن تجري عملية التقييم كجزء من عمليات المشروع بهدف معرفة الانحرافات عن الأهداف وأسبابها بقصد تحسين الأداء مستقبلاً.

الخلاصة: أن هناك غرضان لتقييم المشروعات، كلاهما يحقق غرضاً معيناً، لكن معظم مناهج التقييم تتم بغرض تحسين المشروع أي التقييم كفرصة للتعلم، ولا تقف عند مجرد الكشف عن الانحرافات.

خامساً: معايير المتابعة والتقييم⁵⁷

1. معايير المتابعة:

- وتحتوي بشكل أساسي على التالي:

1- المدخلات: INPUTS -

وتشمل جميع مستلزمات الإنتاج التي تدخل في العمليات سواء كانت بشرية أو مادية والتي تؤدي إلى إنتاج الخدمة أو السلعة حيث يتعين على المنظمة على سلامة استخدام هذه المدخلات بشكل رشيد مقارنة بالمرجات، وتقاس حسب المعيار التالي:

معيار التكلفة = التكاليف الفعلية / التكاليف المخططة
معيار سلامة الصرف = القواعد الفعلية للصرف / القواعد النافذة للصرف

2- العمليات: OPERATIONS -

ويراد بها إن الإنتاج يتم وفق السباقات والإرشادات والمواصفات الفنية الموضوعية وحسب مستوى الجودة المخطط وكما يلي:

معيار العمليات = مدى الالتزام الفعلي بالإرشادات والتعليمات / مدى الالتزام المخطط بالإرشادات والتعليمات.

⁵⁷ - مجيد الكرخي، أساليب متابعة وتقييم البرامج في منظمات الأعمال والخدمات، بتصرف، ص 131-132.

أما معيار الجودة فهو:

معيار الجودة = مواصفات الإنتاج الفعلية / مواصفات الإنتاج المخططة

3- المخرجات OUTPUTS INDICATORS

ويختص بتقييم مستوى التقدم الذي بلغته المنظمة باتجاه تحقيق الأهداف الفرعية (OBJECTIVES). وتتعدد هذه المخرجات باختلاف الأنشطة والبرامج، ففي برنامج للرعاية الأسرية قد تكون المخرجات: عدد الأسر التي شملتها الرعاية، وعدد الزيارات التي أجرتها المنظمة للأسر المحتاجة، وكمية المساعدات النقدية والعينية المقدمة للأسر المشمولة، ومدى نجاح الموظفين في التعامل مع الأسر، وسرعة وصول المساعدات إلى العوائل في الحالات الطارئة وغير ذلك

إن تحديد التقدم في عمل هذه العناصر التي تشكل حزمة (مخرجات برنامج معين) تستطيع المنظمة الوقوف على اتجاهات أداء هذه العناصر كما هو مخطط وفيما إذا كان هناك قصور فيها أو في أحدها يؤثر سلباً على بلوغ الأهداف عند السير في تنفيذ البرنامج حتى اكتماله في نهاية الفترة.

وتقاس كما يأتي:

معيار المخرجات = المخرجات الفعلية / المخرجات المخططة.

قبل البدء بتحديد المعايير اللازمة للمتابعة لا بد من الانتباه إلى عدم الإكثار من المعايير والحرص على أن تكون مجموعة المعايير المختارة واضحة قابلة للقياس وتوفير معلومات كافية لها، وتيسير عمليات جمعها ومعالجتها بسهولة ودقة.

4- الزمن TIMING:

ويستخدم هذا المعيار للتأكد من أن الإنتاج يتم وفق التوقيتات الزمنية الواردة في الجداول الزمنية للتنفيذ وحسب الصيغة التالية:

معيار التوقيت الزمني = الزمن الفعلي للإنجاز / الزمن المخطط للإنجاز.

2. معايير التقييم⁵⁸:

إن المعايير الرئيسية للتقييم يمكن تلخيصها بالآتي:

1. مؤشرات النتائج: OUTCOMES INDICATORS وتختص بتقييم المستوى الذي بلغته المنظمة في تحقيق الأهداف الفرعية OBJECTIVES والاستراتيجية GOALS.
- معيار تحقق النتائج = النتائج الفعلية / النتائج المستهدفة.

⁵⁸ - مجيد الكرخي، أساليب متابعة وتقييم البرامج في منظمات الأعمال والخدمات، ص 211-213.

2. الكفاءة: EFFICIENCY ويراد بها فيما إذا كان المشروع قد استخدم الموارد بطريقة اقتصادية مثلى لإنجاز الهدف.

ويأخذ المعيار الصيغة التالية: الكفاءة = المخرجات / المدخلات.

3. الفعالية EFFECTIVENESS: ويقصد بها فيما إذا كان النشاط قد حقق النتائج المرضية مقارنة بالهدف الموضوع.

وتقاس كما يلي: الفعالية = الأهداف الفعلية / الأهداف المخططة.

4. الأثر: IMPACT وتعني النتائج المتحققة من التدخل في تغيير الحالة سواء كانت المقصودة أو غير المقصودة، إيجابية أو سلبية وتضم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الفرد والمجتمع. معيار الأثر = الأثر الفعلي / الأثر المخطط.

5. الإستمرارية: SUSTAINABILITY ويراد بها فيما إذا كانت الأنشطة وآثارها ستستمر بتوقف الدعم الخارجي مما يستدعي في حالة حصوله إجراء تغييرات جوهرية على أنشطة البرنامج، أو إيقاف البرنامج كاملة. ويظهر المعيار كما في الصيغة التالية:

معيار الاستمرارية = البرامج المنفذة حسب الموارد الفعلية / البرامج المخطط تنفيذها حسب الموارد المخططة.

6. الملاءمة: RELEVANCE ويقصد بهذا المعيار مدى تماشي مخرجات البرنامج وأهدافه مع الأولويات الاجتماعية المطروحة والتوقيت المناسب لتنفيذه. وفيما إذا كانت التغييرات الاجتماعية خلال فترة تنفيذ البرنامج تبرر القناعات التي بني عليها. فالملائمة RELEVANCE هي مقياس مدى انتفاع المجتمع من البرنامج ومدى تلاؤمه مع أولويات وحاجات المجتمع المطروحة؛

معيار الملاءمة = المستوى الفعلي لملاءمة البرنامج مع حاجات المجتمع والفئة المستهدفة / المستوى المخطط لملاءمة البرنامج مع حاجات المجتمع والفئة المستهدفة.

7. معيار الجودة: QUALITY ويهتم هذا المعيار في قياس فيما إذا كانت الخدمة أو السلعة المنتجة والمقدمة تتلاءم مع المواصفات الفنية التي تعتمدها المنظمة وتؤخذ عادة المواصفات الدولية وعلى رأسها... ISO9 في هذا المجال. ويظهر هذا المعيار بالصيغة التالية:

معيار الجودة = المواصفات الفعلية / المواصفات المعتمدة.

اشتقاق أسئلة جديدة. وقد تكون مقننة: أي تكون الأسئلة محددة مسبقاً، ومتسلسلة منطقياً وأغلب المقابلات تتم وجهاً لوجه، وبعضها عن بعد وغالباً ما تكون المقابلات فردية، كما إن أهم ما في المقابلة هي المعلومات التي يتم الحصول عليها. تتمتع المقابلة بمزايا أهمها أنها توفر فرصة للحصول على إجابات لفظية، ومؤشرات غير لفظية تعزز الإجابات وتفصح عن مشاعر الشخص، وتسمح بإعادة صياغة السؤال أو إضافة أسئلة، وتحتاج عملية إتقان المقابلة إلى اختيار المفردات وتوقيت طرح الأسئلة والقدرة على الإصغاء وأسلوب الاحتفاظ بالردود وتسجيلها ومهارة في كسب ثقة المقابل واختيار الوقت المناسب للمقابلة. يمكن استخدام المقابلة في دراسة الحالة وتوجيه السلوك ومعالجة الحالات النفسية غير العادية.

مجموعات التركيز: وتعتبر واحدة من الأدوات المستخدمة في جمع المعلومات اللازمة لعملية التقييم من مجموعة من الأفراد، أو المجموعات المتشابهة في الظروف والأوضاع مثل: مجموعة من الموظفين، مجموعة من المحتجين على مشكلة معينة، أو مثلاً مجموعة النساء الأرامل وهكذا، وعادة ما يكون لكل مجموعة تركيز أهداف معينة يتم ترجمتها من خلال عدة محاور، ويكون هناك ميسر لكل مجموعة يقوم بترتيب الحديث والنقاش بين المشاركين وتوجيهه ما أمكن لتحقيق أهداف هذه المجموعة.

❖ مفهوم المؤشر:

المؤشر هو "العلاقة الدالة على تحقيق الأهداف أو الأنشطة"، وللنشاط أو الهدف الواحد العديد من المؤشرات، حيث أن المؤشرات تساعد على التعرف على مدى التقدم وقياس التغير الذي حدث. وتتكون المؤشرات من مقاييس ويعبر عنها بالأرقام مثل:

1- النسبة: وتنقسم إلى نوعين :

• النسبة المقصود بها العلاقة بين جزء من شيء ما والعدد الكلي لنفس الشيء (هي جزء من الكل) ، كأن نقول أن 50 % من طلاب المدرسة حصلوا على تدريب.

• النسبة المقصود بها العلاقة بين شيئين مختلفين توجد بينهما علاقة أو صلة مشتركة معينة مثل: عدد المدرسين بالنسبة لعدد التلاميذ في المدارس الابتدائية في منطقة محددة (مثل: أن تقول يوجد مدرس لكل عشرين تلميذاً).

2- المعدل :

مثل: معدل وفيات الأطفال، ويقصد به عدد الأطفال أقل من سنة واحدة الذين يموتون في سنة ما وذلك بالنسبة لكل ألف مولود في نفس السنة.

3. لوحة القيادة

Le tableau de bord

. Les objectifs

Le vocable « tableau de bord » est apparu vers 1790. Le Petit Robert en donne la définition suivante : "... présentation des principaux renseignements représentatifs de la marche d'une entreprise, de la situation économique d'une nation"

Cette définition souligne le caractère stratégique de ce document de synthèse qui permet de comprendre la globalité d'une situation. Le tableau de bord est défini par le lexique de gestion Dalloz comme une représentation synthétique chiffrée des principales informations nécessaires aux dirigeants (entrepreneurs, gouvernements) pour le contrôle de l'exécution d'un programme d'action et d'orientation en cas d'écarts par rapport aux projets ou projections

Cette autre définition, en introduisant les notions de chiffre d'écart par rapport à une référence et de tendance, caractérise ce document comme un outil de management permettant :

- De piloter des activités et des projets :
- De contrôler des dépenses ;
- De respecter des budgets :
- D'analyser des tendances :
- De mesurer des écarts :
- D'exploiter des résultats :
- D'évaluer les risques :
- De consulter un bilan d'activités ;
- De prendre connaissance, à travers de nombreux états, du fonctionnement d'une direction :
- De lancer diverses actions (réunions, audit...).

Cet ensemble d'informations, cohérentes et précises, de nature différente, couvrant l'ensemble du périmètre d'activités et regroupées dans un même document, permet ainsi de prendre les décisions les plus adaptées au contexte de l'entreprise. Le tableau de bord doit retenir l'information juste et utile, car l'entreprise n'échappe pas à la « surinformation dans un monde

chyperrelationnel, où l'information est intense » et véhiculée par l'e-information. Le tableau de bord projet rendra compte de la vie du projet et de ses contraintes internes et externes.

• Les indicateurs de gestion Le tableau de bord donnera au dirigeant tous les moyens de contrôler son activité en lui offrant la possibilité d'exploiter des indicateurs de gestion qui lui fourniront des éléments de contrôle mesurables et le renseigneront sur le comportement des différents paramètres de l'entreprise. Ces indicateurs informeront le manager sur :

L'état de la situation (le constat de situation):

La tendance (la direction prise, qu'elle soit bonne ou mauvaise):

L'objectif à atteindre (la bonne direction). Ces indicateurs de gestion sont référencés par rapport à trois types d'objectifs :

Un objectif à ne pas dépasser : le plafond autorisé : un objectif à atteindre : la cible :

Un objectif de niveau : le seuil. Les indicateurs de gestion sont spécifiques aux domaines d'activités concernés. Un indicateur de gestion ne sera mis en œuvre que s'il représente une aide à la prise de décision. La mise en place d'un indicateur de gestion s'apparente à la conception d'un instrument de mesure. Il faut le réaliser en s'assurant qu'il répond bien à un réel besoin. On peut citer des grandes familles d'indicateurs généralement rencontrées pour réaliser un tableau de bord, et qui répondront au contrôle d'une activité :

Indicateurs de résultats : indicateurs de moyens:

Les fondamentaux de la gestion de projet

Indicateurs de fonctionnement ; indicateurs de performance : indicateurs de pilotage : indicateurs économiques : indicateurs financiers ; indicateurs de coûts : indicateur de productivité : indicateur d'activité : indicateurs de délai ; indicateurs du développement durable : indicateurs environnementaux : indicateur de qualité : indicateurs qualitatifs : indicateurs quantitatifs :

Indicateurs de suivi de procédures Le tableau de bord doit :

Présenter le fait objectif : donner des informations pertinentes : présenter des indicateurs de gestion ayant des objectifs atteignables et préalablement négociés et acceptés : présenter des courbes ou des tableaux commentés ; privilégier le message, le fond plutôt que la forme.

5 Le tableau de bord



♦ Les objectifs

Le vocable « tableau de bord » est apparu vers 1790. *Le Petit Robert* en donne la définition suivante : « [...] présentation des principaux renseignements représentatifs de la marche d'une entreprise, de la situation économique d'une nation ».

Cette définition souligne le caractère stratégique de ce document de synthèse qui permet de comprendre la globalité d'une situation.

Le tableau de bord est défini par le lexique de gestion Dalloz comme une « représentation synthétique chiffrée des principales informations nécessaires aux dirigeants (entrepreneurs, gouvernements) pour le contrôle de l'exécution d'un programme d'action et d'orientation en cas d'écarts par rapport aux projets ou projections ».

Cette autre définition, en introduisant les notions de chiffre, d'écart par rapport à une référence et de tendance, caractérise ce document comme un outil de management permettant :

- ▶ de piloter des activités et des projets ;
- ▶ de contrôler des dépenses ;
- ▶ de respecter des budgets ;
- ▶ d'analyser des tendances ;
- ▶ de mesurer des écarts ;
- ▶ d'exploiter des résultats ;
- ▶ d'évaluer les risques ;
- ▶ de consulter un bilan d'activités ;
- ▶ de prendre connaissance, à travers de nombreux états, du fonctionnement d'une direction ;
- ▶ de lancer diverses actions (réunions, audit...).

Cet ensemble d'informations, cohérentes et précises, de nature différente, couvrant l'ensemble du périmètre d'activités et regroupées dans un même document, permet ainsi de prendre les décisions les plus adaptées au contexte de l'entreprise.

Le tableau de bord doit retenir l'information juste et utile, car l'entreprise n'échappe pas à la « surinformation » dans un monde « hyperrelationnel », où l'information est « intense » et véhiculée par l'e-information.

Le tableau de bord projet rendra compte de la vie du projet et de ses contraintes internes et externes.

◆ Les indicateurs de gestion

Le tableau de bord donnera au dirigeant tous les moyens de contrôler son activité en lui offrant la possibilité d'exploiter des indicateurs de gestion qui lui fourniront des éléments de contrôle mesurables et le renseigneront sur le comportement des différents paramètres de l'entreprise.

Ces indicateurs informeront le manager sur :

- ▶ l'état de la situation (le constat de situation) ;
- ▶ la tendance (la direction prise, qu'elle soit bonne ou mauvaise) ;
- ▶ l'objectif à atteindre (la bonne direction).

Ces indicateurs de gestion sont référencés par rapport à trois types d'objectifs :

- ▶ un objectif à ne pas dépasser : le plafond autorisé ;
- ▶ un objectif à atteindre : la cible ;
- ▶ un objectif de niveau : le seuil.

Les indicateurs de gestion sont spécifiques aux domaines d'activités concernés. Un indicateur de gestion ne sera mis en œuvre que s'il représente une aide à la prise de décision. La mise en place d'un indicateur de gestion s'apparente à la conception d'un instrument de mesure. Il faut le réaliser en s'assurant qu'il répond bien à un réel besoin.

On peut citer des grandes familles d'indicateurs généralement rencontrées pour réaliser un tableau de bord, et qui répondront au contrôle d'une activité :

- ▶ indicateurs de résultats ;
- ▶ indicateurs de moyens ;

Acc
Acc

leslesles fonda

Les fondamentaux de la gestion de projet

- ▶ indicateurs de fonctionnement ;
- ▶ indicateurs de performance ;
- ▶ indicateurs de pilotage ;
- ▶ indicateurs économiques ;
- ▶ indicateurs financiers ;
- ▶ indicateurs de coûts ;
- ▶ indicateur de productivité ;
- ▶ indicateur d'activité ;
- ▶ indicateurs de délai ;
- ▶ indicateurs du développement durable ;
- ▶ indicateurs environnementaux ;
- ▶ indicateur de qualité ;
- ▶ indicateurs qualitatifs ;
- ▶ indicateurs quantitatifs ;
- ▶ indicateurs de suivi de procédures.

Le tableau de bord doit :

- ▶ présenter le fait objectif ;
- ▶ donner des informations pertinentes ;
- ▶ présenter des indicateurs de gestion ayant des objectifs atteignables et préalablement négociés et acceptés ;
- ▶ présenter des courbes ou des tableaux commentés ;
- ▶ privilégier le message, le fond plutôt que la forme.

Les fondamentaux de la gestion de projet, roger aim, afnor 2011, p 38-40 .

أساليب قيادة المشروع

ما ينبغي أن يفعله المدير (ة) وما ينبغي أن يتجنبه من أجل قيادة فعالة لمشروع المؤسسة

ما ينبغي تجنبه (أساليب، مبادئ، قواعد، طرائق، تقنيات، مواقف، سلوك)	ما ينبغي فعله (أساليب، مبادئ، قواعد، طرائق، تقنيات، مواقف، سلوك)
تدبير التغيير والإصلاح الذي يرومه المشروع	
..... ❖ ❖ ❖	 ❖ ❖ ❖
استعمال المقاربة التشاركية في تدبير المشروع	
..... ❖ ❖ ❖	 ❖ ❖ ❖
تعزيز انخراط الفريق وتشجيع المبادرات الهادفة	
..... ❖ ❖ ❖	 ❖ ❖ ❖
التواصل حول المشروع وتنشيط أعماله	
..... ❖ ❖ ❖	 ❖ ❖ ❖
إعطاء القدوة للعاملين معه في الاقتناع بجدوى المشروع والمساهمة في إنجازه	
..... ❖ ❖ ❖	 ❖ ❖ ❖

..... ❖	 ❖
----------------	----------------

المحور السادس: مستلزمات نجاح مشروع المؤسسة

التوفر على موارد بشرية مؤهلة ومنخرطة فعليا في عملية إرساء مشروع المؤسسة؛

القدرة على العمل بسرعة وفعالية وبلورة مشاريع المؤسسات في 100 يوم؛

تكوين قيادات تربوية متمكنة من الأدوات التقنية وآليات التواصل والإقناع؛

توفير جميع الموارد المادية الضرورية لإرساء مشروع المؤسسة؛

وضع آليات فعالة للتنسيق بين مختلف المستويات من أجل المواكبة وتوفير الموارد؛

تطبيق آلية التعاقد حول مشروع المؤسسة بين المؤسسة والمديرية الإقليمية؛

أولاً: التكوين وقيادة التغيير⁶⁰

يتطلب التكوين في مجال مشروع المؤسسة المندمج تمكين المديرين والمديرات من الكفايات اللازمة لحسن تدبير المشروع، وهي كفايات مشتقة من مستلزمات التدبير بالمشاريع، وتوجهات إصلاح نظام التربية والتكوين، ونتائج تحليل حاجات المديرين والمديرات في مجال تدبير مشروع المؤسسة.

وتبعا لذلك تسعى ورشات التكوين إلى إنماء كفاية المدير(ة) في التدبير الفعال لمشروع المؤسسة، وهي كفاية جامعة، جعلناها شاملة للكفايات الفرعية الآتية:

أولاً: التمكن من أسس مشروع المؤسسة المندمج ومبادئه

ثانياً: القيادة الفعالة لمشروع المؤسسة

ثالثاً: تدبير عمليات تحضير المشروع

رابعاً: تدبير عمليات بناء مشروع المؤسسة

خامساً: تدبير إنجاز المشروع

سادساً: تدبير عمليات التتبع والتقويم

⁶⁰ - وزارة التربية الوطنية - مشروع المؤسسة - مصوغة تكوينية لفائدة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، 2009.

تنبني كل كفاية على مجموعة من الأهداف المترابطة في تشكيل الخبرة اللازمة لدعم إنماء الكفاية المقصودة، وهي أهداف تشمل معارف وقدرات وقيما ومهارات ينبغي تمكين المديرين والمديرات منها لدعم إنماء كفاياتهم في مجال تدبير مشروع المؤسسة.

وتعد الأهداف الداخلة في إنماء كل كفاية ذات أهمية كبرى من وجهة نظر المديرين والمديرات وفق نتائج الاستشارة القبليّة؛ فقد حصلت الأهداف المعتمدة على معدل يفوق 4 من 5 لدى المديرين والمديرات، ومعدل يفوق 3.6 لدى أطر النيابة، والأكاديمية والتكوين والتفتيش. وقد تمت إضافة بعض الأهداف التي اقترحها المشاركون في الاستشارة، كما تم إدماج بعض الأهداف المتداخلة. وسنقدم، لاحقا، الأهداف المتفاعلة في إنماء كل كفاية ضمن وحدات التكوين المبوبة حسب الكفايات المطلوب إنمائها لدى المدير(ة) لدعم تمكنه من تدبير مشروع المؤسسة.

ثانيا: المقاربة التشاركية⁶¹

مشروع المؤسسة المندمج بناء جماعي يساهم فيه كل فاعل حسب موقعه، ويسهر رئيس المؤسسة وطاقمه وفريق المشروع على أن يحس كل العاملين بأنهم أعضاء فاعلون في المشروع. ويساعد التدبير التشاركي في خلق جو الثقة والتفاعل الإيجابي اللازمين لبلورة المشروع. فما المقصود بالمقاربة التشاركية؟

تخلق المقاربة التشاركية نوعا من العلاقات الخاصة داخل المؤسسة تؤدي بالفرد إلى إنماء قدراته وتفتح شخصيته، إذ يشعر بأن زملاء المهنة ينصتون إليه ويقدرونه. غير أن هذه العلاقات لا تنمو بكيفية تلقائية، لأن الأفراد لا يميلون بطبعهم إلى قبول الآخر كما هو؛ بل يرونه كما يريدونه أن يكون. لذلك يغيب التفاهم والاتفاق ومن ثم يختفي الحوار الذي هو ضرورة أساسية في المشروع.

والمقاربة التشاركية تعتمد على وسائل الحوار والاهتمام المتبادل واحترام رأي الآخر، الشيء الذي يجعلها تسمح بأجراً فعالة لمشروع المؤسسة. فكل فاعل يحاول أن يحاور الآخرين ويهتم برأيهم ويأخذ أعمالهم بعين الاعتبار في التغيير الذي يريد إدخاله في عمله. وتطرح هذه المتطلبات نفسها بحدة أكبر لدى رئيس المؤسسة نظرا لموقعه الخاص.

أساليب تدبير الموارد البشرية والمقاربة التشاركية

هناك عدة أساليب لتدبير الموارد البشرية، منها:

- التدبير السلطوي الاستغلالي: يؤكد هذا الأسلوب المستوحى من نظرية "التقسيم العلمي للعمل" لتايلور على التفريق بين المهام، وضرورة إعطاء تعليمات حازمة واضحة وغير قابلة للنقاش. وهو يعتبر المنظمة مجالا قارا تتوزع فيه المهام بشكل دقيق وبدون تداخل فيما بينها: المدرس يدرس، والحارس يحرس، والمنظف ينظف.

⁶¹ - Obin, J.P. et F. Gros (1993). Le projet d'établissement. Paris : Hachette- Éducation, pp. 83-88 (extrait traduit)

وينتج عن هذا المنظور في التدبير أن مشروع المؤسسة المندمج يكون عبارة عن تراكم من الأنشطة المنعزلة، لا يعلم أصحابها ما يجري في المؤسسة ككل. ذلك أن التعليمات والمعلومات تأتي كلها من الأعلى، كل عامل يعرف ما عليه أن يقوم به، لكن ليس هناك تقاسم للسلطة أو المبادرة. وهذا الأسلوب هو السائد في تدبير المؤسسات إلى حدود السنوات الأخيرة.

- التدبير السلطوي الأبوي: يعطي هذا الأسلوب الأهمية للعوامل النفسية الاجتماعية. تريد الإدارة أن يشعر العاملون بالراحة ويتمتعون بمعنوية جيدة، يوزع المدير المهام بشكل منعزل كما في النموذج السابق. لكن هذا التوزيع يتم بأسلوب يراعي مشاعر الأشخاص. ويهتم المدير بالنزاعات ويعمل على حلها، كما يهتم بمعاونة العاملين فيهدئ من مفعولها حتى يتم إنجاز العمل في أحسن الظروف. يكون المدير بمثابة أب للأسرة: يحافظ على معنوية طاقمه ليبقى منسجما، مستعملا في ذلك قدرا من الابتزاز: "أنتم ترون كم أنا مهتم بكم؛ إذن افعلوا هذا من أجلي".

- التدبير التشاركي الاستشاري: لقد لوحظ أن الاهتمام بالعلاقات الإنسانية وحدها غير كاف لنجاعة العمل، فهناك أشخاص غير راضين عن وضعهم يعطون أكثر من آخرين راضين عنه. ولوحظ أيضا أن إشراك الآخرين في القرار له مفعول إيجابي واضح على دينامية العمل ومردوده. ويقوم الإعلام والتواصل والتفويض بدور أساس في التدبير التشاركي. وعوض أن يبقى المدير في مكتبه يملي الأوامر ويستقبل الشكاوى، عليه أن يذهب إلى العاملين ليقاسمهم انشغالاته ويستشيرهم ويطلب مساعدتهم في تدبير الأمور.

- التدبير التشاركي الجماعي: إنه التدبير الذي يهمننا في مشروع المؤسسة. فتحديد أهداف العمل لا يكفي؛ بل ينبغي تبني هذه الأهداف من طرف العاملين بالمؤسسة. فانسجام أعمال المشروع يوازيه انسجام الفاعلين المساهمين فيه. إن الأفراد يعرفون ويحترمون ويختارون ويتحاورون بخصوص العلاقات بين مرمى المشروع وأهدافه وأعماله، وذلك بشكل يومي. إن التضامن والانسجام ضروريان في عمل المشروع، ويستلزمان التخلي عن الأساليب السلطوية والعمل بمبدأ التشارك في كافة عمليات التدبير.

وتقتضي المقاربة التشاركية الجماعية احترام القواعد الآتية:

1. إعداد القرار من طرف المدعويين لتطبيقه
2. تطبيق القرار الجماعي حتى ولو لم تكن متفقين معه
3. تحديد نظام للتقويم مقبول من طرف الجماعة
4. استغلال كل الطاقات المتواجدة بالمؤسسة
5. إرساء شبكة فعالة للإعلام والتواصل
6. إتاحة التبادل بين الفرق والمجموعات العاملة في المشروع
7. احترام الفرد كيفما كان شأنه من طرف الجماعة
8. تفويض المهام والسلطة

9. احترام قواعد المشاركة: الاستشارة، المناقشة، الإعلام والتوضيح قصد الإشراك، إبداء الرأي، إعطاء الاقتراحات والمعلومات الضرورية للقرار.

ثالثاً: أهمية التواصل ووسائطه في المشروع

أ. مفهوم التواصل (الاتصال)

- عملية تبادل المعلومات والأفكار والتوجهات من شخص لآخر أو من مجموعة لأخرى، وهي عملية تحدث التفاعل بين الأفراد والمجموعات داخل المدرسة وبين المدرسة وشركائها.
- وسيلة لتنسيق الأنشطة التي يقوم بها مختلف مجالس المؤسسة والعاملين بها، لذا يلزم أن يتوفر كل واحد منهم على حد أدنى من الكفايات التواصلية.
- عملية حيوية في الإعلام والتأثير والإقناع والاقتناع واتخاذ القرار الذي يتطلب توافر كافة المعلومات الممكنة عن الاحتمالات المختلفة وأثارها ليكون قراراً رشيداً.
- دعامة لمختلف مراحل وعمليات المشروع، وركيزة لعمليات التدبير من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة وتنشيط وتقويم وتتبع.

1. أهمية التواصل في المشروع

- التفاعل والتعاون بين مختلف مجالس المؤسسة؛
- التفاهم بين كافة المساهمين في المشروع والمعنيين به؛
- التفاعل مع شركاء المدرسة من آباء وأمهات، وسلطات، وجماعات محلية، وجمعيات المجتمع المدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين؛

2. وسائط التواصل في المشروع

- مجالس المؤسسة: لها دور هام في التنسيق وإتاحة فرص المشاركة في عملية اتخاذ القرارات التربوية.
- لجان العمل التي يكلفها المدير أو المجالس بعمل معين.
- تقارير المجالس واللجان، ولها دور هام في تبادل المعلومات والقرارات بين المجالس واللجان وإلى شركاء المدرسة والنيابات والأكاديمية، وهي تتراوح بين المحاضر والتقارير المجملية حسب الغرض.
- الاجتماعات الدورية للمجالس، وهي وسيلة أساسية للإشراف الإداري والتفكير التعاوني البناء وتبادل الأفكار والآراء ووضع الخطط والبرامج والاطلاع على سير عمل المؤسسة والمشروع.
- المقابلات مع الرؤساء والتلاميذ والآباء والأمهات والعاملين، وتتطلب مراعاة شروط المقابلة.
- الإعلانات والمطبوعات والملصقات ومجلة المدرسة ونشرة الاتصال إن وجدت.

- لقاءات يوم عيد المدرسة وأيام الأبواب المفتوحة ومعارض إنجازات المتعلمين في المشروع.
- الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تحتضنها المدرسة لفائدة المتعلمين والشركاء.

رابعاً: خطوط رئيسية ينبغي اتباعها في إحداث التغيير⁶² (مشروع المؤسسة)

1. التوفر على مبرر جيد لإحداث التغيير (موضوع المشروع): التغيير عملية صعبة ومعقدة، وخاصة حينما يتعلق الأمر بمجال ثقافة المؤسسة. لذا ينبغي أخذ التغيير والإصلاح بكامل الجدية، فلا بد أن تكون متيقنا من أهداف التغيير المنشود وضرورته.
2. إشراك العاملين في عملية التغيير: يقلل إشراك العاملين من حظوظ مقاومتهم للتغيير، لأن مشاركتهم في تخطيط التغيير وإعداد مرحلته الانتقالية يمنحهم إحساساً بالتمكن من الوضع؛ اطلب منهم رأيهم في كيفية إنجاز التغيير، وفكر في القيام بدراسات تمهيدية، وفي تشكيل لجن للتفكير واللجوء أحيانا إلى التصويت لاتخاذ القرارات.
3. تكليف شخص ذي مصداقية بمهمة قيادة التغيير: كل تغيير يحتاج إلى قائد؛ اختر شخصا تقدره الجماعة ليقود عملية التغيير.
4. تكوين فرق لتدبير الفترة الانتقالية: يحتاج تدبير الفترة الانتقالية إلى أنماط متنوعة من الأشخاص المؤهلين للقيام بالتخطيط والتوزيع والتنظيم والتنسيق وتركيز الجهود من أجل الإصلاح والتغيير.
5. تمكين العاملين من التكوين على القيم والسلوكات الجديدة: يحتاج الناس إلى التوجيه بخصوص طبيعة وغايات الطريقة الجديدة في العمل. والتكوين وسيلة لإنماء كفايات العمل، وتعزيز تماسك الجماعة عن طريق التعبير عن معاناتها.
6. تدخل مساعدة خارجية: قد تكون مقترحات فاعل خارجي، لأسباب عدة، أكثر تأثيراً من تدخل فاعل داخلي؛ استعمل هذه القوة لدعم التوجه الذي تريد إثباته.
7. إرساء رموز التغيير: شجع تداول النشرات الداخلية والشعارات الدالة والاحتفال بالأحداث المرتبطة بالتغيير.
8. الاعتراف باستحقاق الفاعلين ومجازاتهم: خذ الوقت أثناء عملية التغيير للاعتراف والتذكير بمنجزات الأشخاص الذين ساهموا في التغيير، واعترف بالجهود والتضحيات التي يبذلها الفاعلون في سبيل التغيير.

⁶² - Scott et Jaffe, 1992, p17

خامساً: جودة تدير اجتماعات تتبع سير الإنجاز⁶³

الاجتماعات غير المنظمة مملة، وهذه بعض النصائح لجعل الاجتماعات أكثر جاذبية:

- تنظيم اجتماعات شهرية لتتبع تقدم أعمال إنجاز المشروع، وتوثيق المكتسبات، واستخلاص الدروس، وتخطيط أعمال جديدة وبرمجتها؛
- تسيير الاجتماعات بحزم دون سلطوية مفرطة، والتزام جدول الأعمال للتطرق إلى جميع النقاط وفق مدة زمنية محددة لكل نقطة؛
- توزيع دوران الكلمة ليعبر كل فرد عن رأيه بنظام وانتظام؛
- تجنب فتح المجال للأحاديث الثنائية أو في مجموعات فرعية؛
- عدم ترك الثرائين يستحوذون على النقاش؛
- عند نهاية مناقشة كل نقطة: يتم تحديد الأعمال والأنشطة التي ينبغي القيام بها، وكذا الأشخاص الذين سيقومون بها، وتاريخ الإنجاز أيضاً؛
- تجنب الرئيس(ة) الاستحواذ على الاجتماع وفرض آرائه؛
- دعوة الحاضرين إلى التعبير عن آرائهم مع تشجيع الخجولين.
- تجنب أساليب التفريق والمحابة والسلطة، فالمعارضة ينبغي أن تعبر عن نفسها، وعلى الرئيس(ة) أن ينصت إلى كل ما يقال.
- عند اتخاذ قرار ينبغي توضيح منطق ومبرراته وتأكيد فوائده وحشد الدعم له؛
- تجنب استعمال أسلوب التصويت في اتخاذ القرار اللهم إلا عند الضرورة القصوى.
- وينبغي بخصوص إعداد جدول أعمال الاجتماع:
- تجنب الجداول المقتضبة والمهمة؛
- تحديد موضوع الاجتماع وحدوده؛
- وضع نقط الاجتماع في شكل أهداف؛
- إضافة تدقيق إلى كل نقطة: «لإعلام» «للمناقشة» «للقرار»؛
- التذكير بمبرر أو مبررات إدراج النقطة في الجدول بإيجاز؛
- تحديد المدة الزمنية المخصصة لكل نقطة؛
- إبراز نقط خاصة لجلب الاهتمام إليها إن اقتضى الحال؛
- ترتيب نقط جدول الأعمال حسب درجة أهميتها؛
- الخروج بقرارات واضحة والحرص على تطبيقها.

⁶³ - Coleman, R. et G. Barrie (1998). 525 conseils pour devenir un meilleur manager. Paris : Éditions de Vecchi

وتشكل جمعية دعم مدرسة النجاح المحدثه بالمذكرة 73 (2009)، إطاراً مؤسسياً ومالياً لدعم العمل بالمشروع، ومدخلاً للتدبير الذاتي للمؤسسة، وتحدد المذكرة أهداف الجمعية فيما يأتي:

- الارتقاء بجودة الحياة المدرسية؛

- تحسين جودة التعليمات؛

- تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية بالمؤسسة؛

- رفع جودة الحكامة؛ تطوير أداء مجالس المؤسسة؛

- عقد شراكات مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى المحلي والجهوي والوطني؛

- المساهمة في توفير الإمكانيات المادية والمالية لدعم مدرسة النجاح.

وتبعاً لذلك فإن "جمعية دعم مدرسة النجاح"، تعد مدخلاً أساسياً لدعم التدبير الذاتي للمؤسسة التي تتولى تدبير مواردها المالية المشكّلة من دعم الوزارة/الأكاديمية، وانخرائط الأعضاء، ومنح القطاعات الداعمة، والهبات والتبرعات، والمساعدات المحصل عليها في إطار اتفاقيات الشراكة، ومدخيل الأنشطة التربوية المدرة للربح طبقاً لأهداف الجمعية وفق المذكرة، والنصوص المنظمة للتدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية.

سادساً: نماذج ناجحة لمشاريع المؤسسة

لنجاح كل عمل/مشروع لا بد من الاطلاع على نماذج سابقة، ولا يمكن لنا أن نزعم أننا سنقوم بإحصاء مشاريع المؤسسة الناجحة عبر التراب الوطني، ولذا وجب على الطلبة المتدربين، خلال زيارتهم الميدانية رصد هذه المشاريع وإعداد ملفات عنها للاقتداء والاستئناس، وفيما بعض النماذج:

○ دليل الممارسات الجيدة لمحاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة⁶⁵.

○ استراتيجية تدبير المؤسسة من أجل تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمستوى التعليمي، الثانوية

التأهيلية الحاج محمد بن احساين الحضري، نيابة شفشاون، أكاديمية جهة طنجة تطوان، (2011)

⁶⁵ - وزارة التربية الوطنية بشراكة مع اليونسيف، مكتب الرباط، دجنبر 2013. ص

قائمة بأهم المصطلحات

1. مشروع (projet) : مجموعة من العمليات التي ترمي إلى تحقيق هدف ما في وضعية معينة وخلال فترة زمنية محددة. (le petit Robert)
2. مشروع المؤسسة (Projet d'établissement) : مقارنة دينامية لتدبير المؤسسة التي تحدد بموجب هذه المقاربة أهدافا خاصة بها، وخطة عمل ملائمة لتحقيق هذه الأهداف، وتعمل على تنفيذ الخطة ومراجعتها بين الحين والآخر عند الاقتضاء. ويتم ذلك كله بمشاركة التلاميذ وأولياءهم والعاملين بالمدرسة وشركائها في المشروع.
- (Dictionnaire actuel de l'éducation 1993 p 1041)
3. خطة عمل (Plan d'action) : مجموعة من الأنشطة المترابطة والممتدة عبر فترة زمنية طويلة نسبيا تتخللها (أولا تتخللها) وقفات للتقويم تتيح إمكانات للتطوير والمراجعة. (Ibid. p. 973)
4. برنامج عمل (Programme de travail) : نظام نسقي من الأنشطة:
 1. يتطلب تحقيقها موارد بشرية ومادية ومالية.
 2. تهدف إلى إسداء خدمات معينة لجماعة محددة قصد تغيير وضعيتها. (Ibid. p. 1092)
1. عملية (Action) : - ما يقوم به الفرد أو المؤسسة ويمكنها من تحقيق المقاصد أو الرغبات - مجموعة من الأنشطة المترابطة التي ترمي إلى تحقيق هدف أو أهداف محددة.
- نشاط (Activité) : تنفيذ منسجم لمهام ملموسة قابلة للقياس وتصب في اتجاه تحقيق هدف محدد. (Ibid. p. 12)
2. مؤشر (Indicateur) : سلوك أو عنصر من عناصر الإنجاز أو العملية يدل على التقدم الحاصل أو مدى تحقق التعليمات (أو الأهداف). ويوضح المؤشر العلاقة بين المعطيات النوعية والكمية التي تسمح بالحكم على برنامج أو نشاط أو مشروع من حيث الملاءمة والفعالية والمردودية. (Ibid. p. 707)
5. تتبع (Suivi) : - عملية ملاحظة ومراقبة خلال فترة زمنية طويلة نسبيا قصد التحقق والتثبت من حسن سير الأعمال. - الإجراءات المتخذة انطلاقا من نتائج التقويم والمراقبة. (Ibid. p. 1205)
6. دفتر التحملات (Cahier de charges) : وثيقة تحدد آليات التنفيذ والمواصفات التقنية التي ينبغي أن يخضع لها منتج معين. (le petit Robert)
3. منظور (Vision) : تصور متناسق العناصر لغايات المؤسسة التعليمية وأهدافها ووظائفها.

قائمة المصادر والمراجع

* المراجع العربية

- ❖ الدريج محمد. (1999). مشروع المؤسسة المندمج والشراسة التربوية.
- ❖ سامي محمد، وبنعلي جوزيت، وفنيش تاتيانا (1995). مشروع المؤسسة: مقتضيات منهجية. ترجمة السلاوي إدريس. مجلة أكاديمية وزارة التربية الوطنية بالرباط: الانفتاح التربوي.
- ❖ الفارابي عبد اللطيف، وغريب محمد، وأيت موحى محمد، والغضراف عبد العزيز. (1996). تدير النشاط التربوي. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- ❖ الطاهري نور الدين. (1997). مشروع المؤسسة. البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- ❖ وزارة التربية الوطنية. (2003). تحديد مؤشرات الإنجاز. مشروع تربية الفتيات بالمغرب (MEG/USAID).
- ❖ وزارة التربية الوطنية. (2002). ورشة تدير المدرسة في أفق الشراكة التربوية. مشروع تربية الفتيات بالمغرب (MEG/USAID).
- ❖ وزارة التربية الوطنية (1999). حلقات التكوين المستمر في إطار برنامج الأولويات الاجتماعية. مصوغات خاصة بالمديرين. إعداد هيئة التأطير التربوي بناية إقليم قلعة السراغنة.
- ❖ وزارة التربية الوطنية (1997). تكوين المديرين: كراسة التكوين الذاتي.
- ❖ وزارة التربية الوطنية. (1997). مشروع SN/BAJ لدعم التعليم بالوسط القروي.
- ❖ وزارة التربية الوطنية (1996). المشروع التربوي. بلانت مارسيل. ترجمة محمد بنعياد.
- ❖ وزارة التربية الوطنية. (1996). ملف مشروع المؤسسة المندمج أداة للتجديد التربوي ووسيلة لتلبية حاجات مجموع الفاعلين التربويين. منشورات مركز التوثيق التربوي. العدد 3.
- ❖ اليونيسيف. (2003). شبكة الجودة لتقييم المدرسة. برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف.
- ❖ وزارة التربية الوطنية، الوحدة المركزية لتكوين الأطر (2012)، مجزوءات دعم تكوين هيئة الإدارة التربوية، التدير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة من أجل الجودة.

* الوثائق الرسمية

- ❖ اللجنة الخاصة للتربية والتكوين (1999). مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
- ❖ مرسوم رقم 376.02.2 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- ❖ وزارة التربية الوطنية. (2001). مراجعة المناهج التربية – الكتاب الأبيض
- ❖ وزارة التربية الوطنية (1996). مذكرة رقم 133 (11 أكتوبر 1996). التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية.
- ❖ وزارة التربية الوطنية (1995). مذكرة رقم 27 (24 فبراير 1995). التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية.
- ❖ وزارة التربية الوطنية (1994). مذكرة رقم 73 (12 أبريل 1994). دعم التجديد التربوي في المؤسسات التعليمية.
- ❖ ...

- ❖ Coleman, R. et G. Barrie (1998). *525 conseils pour devenir un meilleur manager*. Paris : Éditions de Vecchi.
- ❖ Etienne, R. et M. Amiel. (1995). *Communication dans l'établissement scolaire*. Paris : Hachette- Éducation
- ❖ Giles, C. (1997) *School development planning* Exeter: Northcote House.
- ❖ JICA Study Team (2003) The Basic Education Improvement Program for Rural Areas in the Kingdom of Morocco: The school Quality Improvement Cycle. Rabat (polycopié).
- ❖ Lewis, J. R. (1989). *L'école prix d'excellence*. Bruxelles : Debout Université.
- ❖ Ministère de l'Éducation Nationale et UNICEF. (2003) Grille école de qualité. Rabat (polycopié).
- ❖ Ministère de l'Éducation Nationale (1997) *Le projet d'établissement*. Projet SN/BAJ-97.
- ❖ Obin, J.P. et F. Gros (1993). *Le projet d'établissement*. Paris : Hachette- Éducation.
- ❖ Ministère de l'Éducation Nationale (1996). *Le projet éducatif*. Plante, M. Casablanca: Najah El Jadida
- ❖ Tilman, F. et N. Ouali (2001). *Piloter un établissement scolaire*. Bruxelles : Deboeck Université.
- ❖ Toumi, J. et N. Aarab (2002-2003). *Management, projet d'établissement et communication*. Oujda : CPR.
- ❖ Ellen Daniëls, Annie Hondaghema, Filip Dochyb, a Public Governance Institute (KU Leuven), Parkstraat 45 Bus 3609, 3000, Leuven, Belgium
- ❖ b Professional Learning & Development, Corporate Training and Lifelong Learning (KU Leuven), Dekenstraat 2 Bus 3772, 3000, Leuven, Belgium
- ❖ Trevor Male & Ioanna Palaologou (2016): *Pedagogical leadership in action: two case studies in English schools*, International Journal of Leadership in Education,
- ❖ *Pedagogical leadership in action: two case studies in English schools*
- ❖ *School effectiveness in Sweden: psychometric properties of an instrument to measure pedagogical and social climate (PESOC) focusing on pedagogical leadership*
- ❖ Lisa Hellström & Curt Hagquist (2019): *School effectiveness in Sweden: psychometric properties of an instrument to measure pedagogical and social climate (PESOC)*
- ❖ James P. Spillane, Richard R. Halverson, John Diamond, *focusing on pedagogical leadership*, International Journal of Leadership in Education,
- ❖ *Théorisation du leadership en éducation : une analyse en termes de cognition située*, e Boeck Supérieur | « Éducation et sociétés » 2008/1 n° 21 | pages 121 à 149 ISSN 1373-847X, ISBN 9782804157975
- ❖ Cauvin, Pierre, *La cohésion des équipes*, « Pratique du team building »,
